

SENESCYT - Secretaría Nacional De Educación Superior, Ciencia, Tecnología E Innovación
Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía

PROYECTO: K001 SENESCYT- Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador.

Líder del Proyecto:	Reinoso Hidalgo, Juan Fernando (jreinoso@senescyt.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Araujo, Lorena	Programas Relacionados:	Provincia - Azuay, Provincia - Bolívar, Provincia - Carchi, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Napo, Provincia - Orellana, Provincia - Pastaza, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Sucumbíos, Provincia - Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe, Proyectos Emblemáticos, RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR
Titular:	Nina Rada, Galo Antonio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	091590000.0000.375416	TIR:	22.96 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	270,019,609.54
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	28,981,656.44
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	10/01/2013 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	22/02/2016	Fecha de Fin Base:	31/12/2017
Modificado por:	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	Fecha del siguiente Hito:	26/02/2016

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto de reconversión de la formación técnica y tecnológica superior pública contribuye en el cumplimiento del objetivo 2 del Plan Nacional para el Buen Vivir referente al desarrollo de capacidades y potencialidades ciudadanas; y está relacionado específicamente con la política 2.5 que determina la necesidad de fortalecer la educación superior con visión científica y humanista, articulada a los objetivos para el Buen Vivir.

Esta conformado por 3 componentes:

- Reconvertir los institutos superiores técnicos y tecnológicos públicos en instituciones que respondan académicamente a las demandas de los sectores estratégicos, prioritarios y de servicios públicos esenciales.
- Dotar de equipamiento para talleres y laboratorios que tengan correspondencia con la oferta académica y realizar adecuaciones para la instalación de los equipos

DATOS GENERALES

Descripción

- Construir edificaciones modulares para el funcionamiento de los institutos reconvertidos

PRODUCTO/SERVICIO:

40 Institutos Reconvertidos equipados con talleres y laboratorios
Creación y diseño curricular de 42 carreras de nivel técnico y tecnológico con modalidad dual

LÍNEA BASE:

En el Ecuador, la matrícula en el nivel de formación técnica y tecnológica superior en el año 2010 era del 12% en relación al total de la matrícula en el 3er nivel de educación superior. Este porcentaje está muy por debajo de las cifras presentadas por países desarrollados como Bélgica, Francia, Corea, EEUU y Reino Unidos, según la clasificación CINE 5A (3er nivel) y 5B (técnico y tecnológico).

La oferta académica de los ISTTP en el Ecuador se encuentra totalmente desarticulada a la demanda de los sectores estratégicos y a las necesidades de cada una de las zonas de planificación; así por ejemplo, de un total de 796 carreras registradas en el sistema académico, 247 pertenecen al área de ciencias sociales, educación comercial y derecho, mientras que en el área de salud y servicios sociales tan solo se ofertan 13 carreras. Esta distribución se puede observar en el siguiente gráfico.

Según lo determina el régimen académico vigente en lo que respecta a la organización de las carreras en el nivel técnico, deben las mismas cumplir con un mínimo de 105 créditos en el plazo de 2 años y de 158 créditos en el lapso de 3 años. Sin embargo, no se ha determinado que un porcentaje importante de créditos se debe obtener por práctica de la profesión, lo cual es fundamental para el desarrollo de destrezas y habilidades exigidas a los profesionales de nivel técnico y tecnológico superior.

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Fortalecer el sistema de educación superior no universitaria, transformando física y académicamente a los institutos superiores técnicos y tecnológicos públicos (ISTTP), alineado a las necesidades del país, y al Plan Nacional para el Buen Vivir.

OBJETIVO GENERAL:

Reconvertir la formación técnica y tecnológica superior del país, dotando de infraestructura física, equipamiento e implementación de la modalidad dual en las carreras ligadas a los sectores estratégicos, prioritarios y de servicios públicos esenciales, con el fin de aportar al cambio de la matriz productiva del Ecuador.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Reconvertir los institutos tecnológicos superiores en instituciones que respondan académicamente a las demandas de los sectores estratégicos, prioritarios y de servicios públicos esenciales.
- Dotar de equipamiento para talleres y laboratorios que tengan correspondencia con la oferta académica y realizar adecuaciones para la instalación de los equipos.
- Construir edificaciones para el funcionamiento de los institutos reconvertidos.

Beneficios Cualitativos

- Incremento del capital social ya que permitirá que los bachilleres de todo el país puedan optar por una propuesta diferente y renovada de formación práctica, que les permitirá desde los primeros años de estudios vincularse de manera real con el mundo laboral, aprendiendo el manejo de equipamiento, maquinaria y otros aspectos que se requieren en los diferentes sectores productivos y de servicios.
- Promueve la equidad social al dotar de una profesión intermedia o de corto tiempo a aquellos estudiantes que requieren integrarse al mercado laboral de manera inmediata, con el fin de cubrir sus necesidades económicas y las de sus familias. Este tipo de formación les da una posibilidad de adquirir un título de educación superior como certificación de su saber hacer dentro de un sector estratégico, de producción o de servicios que el país requiere, lo que determina su pertinencia como profesionales en el medio productivo.
- El sector productivo podrá encontrar en los estudiantes de estos institutos, personal de nivel técnico y tecnológico capacitado para atender sus diferentes requerimientos en los procesos de producción.
- Los estudiantes graduados de los institutos reconvertidos podrán emprender nuevos negocios o empresas ya que sus conocimientos y experiencia en las empresas e industrias les darán un sustento importante para que puedan enfrentar este tipo de retos.

Tipo de Beneficiario

Los principales beneficiarios serán los bachilleres a nivel nacional, que en igualdad de oportunidades y la meritocráticamente recibirán cupos en estas instituciones de educación superior y en un periodo corto de tiempo insertarse en el mundo laboral, con el fin de percibir ingresos para poder atender sus necesidades personales y las de sus familias. Así también, dentro de esta población se encuentran aquellas personas que tienen clara su preferencia por realizar una carrera profesional cuya metodología de aprendizaje se centra en la

Tipo de Beneficiario

práctica o en la ejecución inmediata de los elementos teóricos aprendidos, en una acción productiva concreta, aspecto característico a implementarse como modalidad esencial de aprendizaje en estos institutos reconvertidos.

Restricciones

COSTO: \$ 308.483.239,35

TIEMPO: 48 meses

ALCANCE:

- Reconversión de Institutos a nivel nacional
- Se firmarán convenios de apoyo a los procesos de reconversión con los gobiernos autónomos descentralizados, acuerdos de alianza entre las universidades y escuelas politécnicas y los Institutos; participación de expertos internacionales que trabajarán en las propuestas de creación de las carreras, en su diseño curricular e implementación de la modalidad dual en los institutos reconvertidos.
- Diseño y construcción de la infraestructura de tipo modular y estándar que se requiere para cada instituto.
- Dotación de equipamiento para los talleres y laboratorios, que deberán responder a los requerimientos técnicos y funcionales establecidos en el diseño curricular de las carreras a ofertarse.


RECURSOS:

Contratación de un equipo multidisciplinario que trabaje de forma permanente en el desarrollo del presente proyecto en la gestión y seguimiento de las actividades planificadas.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 44.95 %
 Fecha de Inicio: 10/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

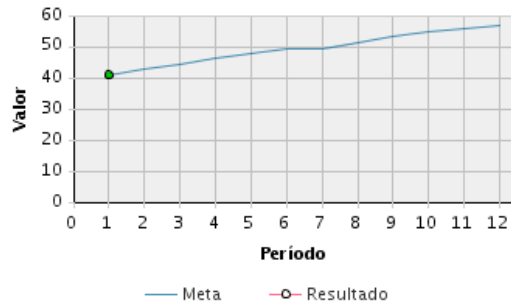

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	41 %	43 %	44 %	46 %	48 %	49 %	49 %	51 %	53 %	55 %	56 %	57 %
	Avance real acumulado											
	41 %											
Estado												
	●											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Enero 2016 1. Se realizaron visitas técnicas para verificar el estado de las construcciones. Debido a la falta de pago de planillas por parte de Finanzas y la imposibilidad de suscribir contratos complementarios	Reinoso Hidalgo, Juan Fernando	05/02/2016 - 07:21 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>para dar operatividad a los institutos, se aprobaron las suspensiones de obra en Urcuquí, Santo Domingo, Quito. Hasta enero se registran los siguientes porcentajes de avance: Santo Domingo 77,10% (obra suspendida); Latacunga 98%; Cotacachi 50,2%; Urcuquí 91,14% (obra suspendida); Quito 79% (obra suspendida).</p> <p>2.Se mantuvo una reunión con miembros del GAD de Riobamba para dar trámite al proceso de fraccionamiento del terreno gestionado para la construcción de un instituto de educación técnico y tecnológico superior.</p> <p>3.Se realizó una reunión con la Brigada Patria para la revisión de estudios para la captación de agua para el instituto en Latacunga desde la toma de la Brigada.</p> <p>4.Se inició el proceso de actualización de los diseños del Estándar arquitectónico.</p> <p>5.Se recibieron tres misiones de representantes del Banco Mundial y Banco Europeo de Inversiones para avanzar en la preparación de crédito y arreglos institucionales.</p> <p>6.Se realizaron reuniones de Buenas Prácticas en la construcción junto con especialistas de infraestructura del Banco Mundial, constructores y fiscalizadores de las obras en curso.</p> <p>7.Se realizó el seguimiento al trámite de fraccionamiento predio de Machala para la construcción de un instituto superior.</p> <p>8.Se realizó el seguimiento al trámite de la resolución de adjudicación del MAGAP referente al predio de Colta para la construcción de un instituto superior.</p> <p>9.Se elaboró la minuta del predio de Sucumbíos para la suscripción del Ministerio de Educación y esta Secretaría.</p> <p>10.Se presentaron los documentos para el juicio de Expropiación No. 10332-2015-00854 y se inscribió la demanda en el Registro de la Propiedad del predio de Cotacachi.</p> <p>11.Se dio respuesta a la supervisión realizada por la Gobernación de las Provincias de Morona Santiago y de Bolívar.</p> <p>12.Se dio cumplimiento al hito 63 EJECUCIÓN: Construcción del instituto territorial Cotopaxi Latacunga, concluida, Asociación hito 63</p> <p>13.Se dio cumplimiento al hito 64 EJECUCIÓN: Planificación operativa anual de acuerdo al PAI aprobado 2016, Asociación hito 64</p> <p>14.No se realizaron transferencias en el mes de enero de 2016.</p>		
<p>DICIEMBRE 2015</p> <p>1.Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las construcciones. Hasta diciembre se registran los siguientes porcentajes de avance: Santo Domingo 77,10%; Latacunga 93%; Cotacachi 42,41%; Urcuquí 91,14% Quito 79%. Debido a la falta de pago de planillas por parte de Finanzas y la imposibilidad de suscribir contratos complementarios para dar operatividad a los institutos, se aprobaron las suspensiones de obra en Urcuquí, Santo Domingo, Quito. En Latacunga se aprobó la suspensión y posteriormente fue levantada por pedido del contratista.</p> <p>2.Se mantuvo una reunión con delegados de SENAGUA y el Fuerte Patria sobre la captación y dotación de agua para el instituto en Latacunga.</p> <p>3.Se realizó un recorrido técnico por las localidades donde se edificarán los institutos superiores tecnológicos en las ciudades de Esmeraldas, Jaramijó, Daule, Portoviejo, Machala, Guayaquil, Durán, Santo Domingo, con delegados del Banco Mundial.</p> <p>4.Se realizó el seguimiento a los procesos de fraccionamiento de los predios gestionados en las ciudades de Riobamba y Machala.</p> <p>5.Se suscribió el Convenio No 20150095CI, del inmueble donado por Ecuador Estratégico E.P. a la Secretaría en Lago Agrio, para el funcionamiento de un instituto superior tecnológico.</p> <p>6.Se suscribió el Convenio No. 20150099CI, del bien inmueble donado por el GAD de Esmeraldas a la Secretaría, para la construcción de un instituto superior tecnológico.</p> <p>7.Se presentó la demanda de expropiación de un predio de Cotacachi, para el funcionamiento de un instituto superior tecnológico.</p> <p>8.Se dio respuesta a la supervisión realizada por el Gobernador Provincial de Galápagos, respecto a la intervención del proyecto en su provincia.</p> <p>9.Se dio cumplimiento al Hito 62.- EJECUCIÓN: Comisiones Nacionales de Carrera CNCs para carreras con inicio de clases en periodo académico Marzo/Abril 2015, conformadas (Asociación hito 62).</p> <p>10.Se dio cumplimiento al Hito 68.- EJECUCIÓN: Informe de avance de construcciones de Institutos, elaborado (Asociación hito 68).</p> <p>11.Se dio cumplimiento al Hito 69.- EJECUCIÓN: Informe de validación de implantaciones en planes masa, elaborado (Asociación hito 69).</p> <p>12.Se canceló el Hito 70.- EJECUCIÓN: Vinculación de 10 Prometeos/Ateneos para Institutos Superiores Tecnológicos, cancelado (Asociación hito 70), en razón del presupuesto limitado con el que cuenta el Proyecto Prometeo para vincular prometeos.</p> <p>13.No se realizaron transferencias en el mes de diciembre de 2015.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>08/01/2016 - 11:53 AM</p>
<p>Noviembre 2015</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>04/12/2015 - 06:01 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las construcciones. Hasta octubre se registran los siguientes porcentajes de avance: Santo Domingo 77,30%; Latacunga 77,99%; Cotacachi 39,92%; Urcuquí 90,89%; Quito 75%. 2. Se reportó hasta el mes de noviembre el estado de las obras en proceso: <ol style="list-style-type: none"> a. Obra en Santo Domingo continúa en ejecución. b. Obra en Latacunga se encuentra paralizada por falta de pago de planillas al contratista y falta de certificación presupuestaria para realizar el contrato complementario de obra. c. Obra en Quito se encuentra suspendida por falta de certificación presupuestaria para realizar el contrato complementario de obra. d. Obra en Cotacachi continúa en ejecución. e. Obra en Urcuquí se encuentra suspendida por falta de certificación presupuestaria para realizar el contrato complementario de obra. 3. Se realizó la inspección a infraestructuras de tres campamentos de Coca Codo Sinclair, en el cantón el Chaco, provincia de Napo, para definir si es factible reusar las instalaciones para la implantación de un instituto superior tecnológico. 4. Se realizó la inspección a cuatro terrenos ubicados en el Cantón Montufar, provincia de Carchi, para la construcción de un instituto superior tecnológico. 5. Se mantuvo una reunión en el Municipio de Riobamba en conjunto con SENAGUA para levantar el proceso de legalización del predio donado. 6. Se realizó un recorrido por los terrenos donde se han planificado la construcción de los institutos superiores tecnológicos, con el Experto Ambiental y Social delegado del Banco Mundial, para detectar posibles impactos ambientales y sociales que causaría la implementación del instituto en las localidades. 7. Se realizó el seguimiento de los trámites de fraccionamiento de predios en los GADs de Machala, Riobamba, y Montufar. 8. Se realizó la inscripción en el Registro de la Propiedad del predio de Santo Domingo. 9. Se realizó la suscripción del Acuerdo de Donación No 0011-15 de fecha 28 de octubre de 2015, del predio ubicado en Chimbo. 10. Se realizó la adenda al Convenio Específico de Cooperación No.20140092CI entre "YACHAY E.P." y la Secretaría. 11. Se solicitó a Ecuador Estratégico E.P. el permiso para uso del predio en Lago Agrio. 12. Se elaboró el convenio de donación del predio ubicado en Esmeraldas, Atacames. 13. Se dio cumplimiento al Hito 67.- EJECUCIÓN: EJECUCIÓN: Ferias de socialización y sensibilización para incremento de la matrícula en formación técnica y tecnológica, realizadas (Asociación hito 67). 14. No se realizaron transferencias en el mes de noviembre. 		
<p>OCTUBRE 2015</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las construcciones. Hasta octubre se registran los siguientes porcentajes de avance: Santo Domingo, 76,90%; Latacunga, 77,99%; Cotacachi, 31,50%; Urcuquí, 90,89%; Quito 75%. 2. Se realizó la visita de inspección al terreno ubicado en la ciudad de Puyo para verificar si es factible la construcción de un instituto. 3. Se realizó la inspección a las instalaciones del SECAP en Quito para verificar si es factible su utilización para el funcionamiento de un instituto. 4. Se realizó la visita de prevalidación a un terreno ubicado en Loja para la construcción de un instituto. 5. Se realizaron gestiones para avanzar en los trámites de fraccionamiento con los GAD de Machala, Riobamba, Montufar, de los predios para la construcción de IST. 6. Se gestionó el archivo de un proceso administrativo que pesaba sobre el Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio de Quito. 7. Se gestionó la protocolización de la adjudicación del predio ubicado en Limoncocha, provincia de Sucumbios a favor de la Secretaría, para realizar la inscripción del mismo en el Registro de la Propiedad. 8. Se realizó la modificación del convenio de los bienes muebles del Museo de la Energía a ser donados por Ecuador Estratégico a favor de la Secretaría. 9. Se inscribió en el Registro de la Propiedad el predio de Vilcabamba. 10. Se remitió al Ministerio de Educación el Acuerdo de Donación del predio de Chimbo. 11. Se dio cumplimiento al Hito 58.- EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el Instituto Tecnológico de Cuenca, adjudicada (Asociación Hito 58). 12. Se dio cumplimiento al Hito 64.- EJECUCIÓN: Convenios con entidades receptoras para la formación dual de carreras que inician actividad académica en periodo Sept./Oct. 2015, firmados (Asociación hito 64). 13. Se reprogramó el Hito 62.- EJECUCIÓN: Comisiones Nacionales de Carrera CNCs para carreras con inicio de clases en periodo académico Marzo/Abril 2015, conformadas (Asociación 	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>04/11/2015 - 04:19 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>hito 62), debido a la demora en la aprobación de los modelos de gestión, requisito para la instauración de los Consejos Consultivos. 14. Se reprogramó el hito 65 EJECUCIÓN: Doce nuevas carreras revisadas por el CES a ser implementadas en los institutos de educación superior, aprobadas (ASOCIACIÓN HITO 65), debido a los nuevos requisitos del CES para la aprobación de los proyectos de carrera. 15. Se reprogramó el hito 66 EJECUCIÓN: Readecuación del Instituto Superior Tecnológico en Azogues, iniciada (ASOCIACIÓN HITO 66), debido a problemas presentados para en el Sistema USHAY en el portal de contratación pública. No se realizaron transferencias en el mes de octubre.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2015</p> <p>1. Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las construcciones. Hasta septiembre se registran los siguientes porcentajes de avance: Santo Domingo, 75,65%; Latacunga, 75,35%; Cotacachi, 24,73%; Urcuquí, 89,42%; Quito 75,98%. 2. Se realizó la visita técnica de inspección a predios ubicados en la parroquia Fátima, cantón Puyo, para verificar su factibilidad para la construcción de un IST. 3. Se suscribió el acta entrega recepción provisional de la rehabilitación y adaptación del Ex Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas, INIGER, ubicado en Vilcabamba, para el funcionamiento de un IST. Adicionalmente se obtuvo los documentos habilitantes para la inscripción en el Registro de la Propiedad del predio a favor de Secretaría. 4. Se realizaron gestiones para avanzar en los trámites de fraccionamiento con los GAD de Machala, Riobamba, Montúfar, de los predios para la construcción de IST. 5. Se realizó la protocolización contrato modificatorio al préstamo de uso suscrito con la Universidad Técnica de Ciencias Ambientales José Peralta, para la readecuación del inmueble donde funcionará un IST en Azogues. 6. Se elaboró el acuerdo de donación de bienes muebles del Museo de la Energía a favor de la Secretaría, para ser destinados al IST que funcionará en dicho inmueble. 7. Se suscribió el acuerdo de donación entre Mineduc y Senescyt del predio en Ambato. 8. Se reprogramó el hito 58 EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el Instituto Tecnológico de Cuenca, adjudicada (ASOCIACIÓN HITO 58), debido a que el proceso se declaró desierto en el portal de compras públicas. 9. Se reprogramó el hito 59 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Ambato, firmadas (ASOCIACIÓN HITO 59), debido a que está en proceso la condonación de una deuda por parte del GAD de Ambato sobre el predio que el MUNEDUC donará a favor de la Secretaría. 10. Se dio respuesta a la Supervisión Ejecutiva del proyecto por parte de la Gobernación de la provincia de Santa Elena. 11. Se dio respuesta a la Supervisión Ejecutiva del proyecto por parte de la Gobernación de la provincia de Morona Santiago. 12. Se reprogramó el hito 60 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Esmeraldas, firmadas (ASOCIACIÓN HITO 60), debido a la demora en la validación del predio. 13. Se reprogramó el hito 61 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Riobamba, firmadas (ASOCIACIÓN HITO 61), debido a la demora en el proceso de fraccionamiento del predio. 14. Se recibió a las misiones del Banco Europeo de Inversiones y del Banco Mundial, con quienes se realizó un recorrido a los proyectos en construcción como parte de la agenda de trabajo planificada para la obtención de un crédito externo para el financiamiento de institutos previstos en el Proyecto de Reconversión. 15. No se realizaron transferencias en el mes de septiembre.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>03/10/2015 - 12:37 PM</p>
<p>AGOSTO 2015</p> <p>1. Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las construcciones. Hasta agosto se registran los siguientes porcentajes de avance de obra: Santo Domingo 70,95%; Latacunga 68,83%, Cotacachi 20,46%, Urcuquí 87,62%; Quito 75,98%. 2. Se realizó una visita de inspección técnica a las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico en Latacunga en conjunto con el Presidente de la República para constatar el avance de la obra. 3. Se realizó una visita de inspección técnica a las instalaciones de Museo de la Energía en Lago Agrio, donde funcionará un instituto superior, en cumplimiento de un Compromiso Presidencial. 4. Se obtuvo la viabilidad técnica de un predio adicional en la ciudad de Machala de propiedad del Autoridad Portuaria Puerto Bolívar, para iniciar el proceso de donación. 5. Se realizó una nueva visita en conjunto a los terrenos disponibles en El Pangui, con el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano y la Comisión de Viabilidad Técnica, con la finalidad de ubicar otro predio, debido al informe emitido por el Cuerpo de Bomberos, en el que negaron la ubicación de la implantación del instituto superior por ser zona de riesgo. 6. Se realizó visita a las instalaciones del Instituto de Vilcabamba, Loja con el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, con la finalidad de constatar la culminación de obras y evaluar la funcionalidad de la infraestructura.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>04/09/2015 - 06:20 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>7. Se suscribió el acuerdo de donación Nro. 20150066 CI, de fecha 03 de agosto de 2015, mediante el cual el GAD de Montúfar dona 4 hectáreas de terreno en la provincia del Carchi, para la construcción de un instituto superior.</p> <p>8. Se suscribió el acuerdo de donación Nro. 2015-001, mediante el cual SENAGUA dona 2.7 hectáreas de terreno en la provincia de Chimborazo para la construcción de un instituto superior.</p> <p>9. Se suscribió el Acuerdo de donación No. 0008-15 con fecha 24 de agosto de 2015, mediante el cual el MINEDUC dona el predio de la Unidad Educativa Intercultural Martha Bucarán de Roldós, en Sucumbios, para la construcción de un instituto superior.</p> <p>10. Se inició el proceso de petición a Ecuador Estratégico E.P., para la donación del bien inmueble donde se implantó el Museo de la Energía así como de la transferencia de sus bienes muebles y equipamiento a favor de la Secretaría para la implementación de un instituto superior.</p> <p>11. Se modificó el comodato entre la Secretaría y la Universidad Técnica Particular José Peralta a fin de efectuar la readecuación de la universidad para el funcionamiento de un instituto superior, en la ciudad de Azogues.</p> <p>12. Se reprogramó el hito 54: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Montúfar, firmadas. (ASOCIACIÓN HITO 54), debido a la demora en el fraccionamiento del predio.</p> <p>13. Se reprogramó el hito 55: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Machala, firmadas. (ASOCIACIÓN HITO 55), debido a la demora en el fraccionamiento del predio.</p> <p>14. No se realizaron transferencias en el mes de agosto.</p>		
<p>JULIO 2015</p> <p>1. Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las construcciones. Hasta julio se registran los siguientes porcentajes de avance de obra: Santo Domingo 66,43%; Latacunga 60,04%, Cotacachi 8,45%, Urcuquí 83,99%; Quito 75,70%,</p> <p>2. Se efectuó una revisión de los rubros previstos para el contrato complementario en el IST de Santo Domingo de las áreas arquitectónicas, estructural, eléctrico, electrónica e hidrosanitaria, en conjunto con el contratista de obra, fiscalización y administración de contrato.</p> <p>3. Se realizó una visita de inspección técnica al terreno e instalaciones del ISPEDIB de Limoncocha a fin de evaluar sus condiciones y estimar tiempos y costos de intervención para repotenciación.</p> <p>4. Se realizó una visita de inspección técnica a las instalaciones de Museo de las Energías en Lago Agrio, donde funcionará un IST, en cumplimiento de un Compromiso Presidencial.</p> <p>5. Se suscribió el Acuerdo Interministerial de Donación No.0006-15 del predio en Quilloac, entre el Mineduc y la Secretaría.</p> <p>6. Se remitieron al Registro de la Propiedad de Loja para su inscripción las escrituras del inmueble ubicado en Vilcabamba donado por el MIES a la Secretaría.</p> <p>7. Se realizó la protocolización de las escrituras del predio en Guamote y se inscribieron en el Registro de la Propiedad.</p> <p>8. Se suscribieron las escrituras del predio expropiado en Cuenca y se remitieron para inscripción en el Registro de la Propiedad.</p> <p>9. Se obtuvo la viabilidad técnica de un predio en la ciudad de Chimbo de propiedad del MINEDUC, para iniciar el proceso de donación.</p> <p>10. Se reprogramó el hito 54: EJECUCIÓN: Concursos de méritos y oposición para Rectores de Institutos Superiores Tecnológicos Públicos, iniciados, iniciadas (ASOCIACIÓN HITO 54), debido a que es necesario que los institutos de educación superior previamente estén conformadas como Entidades Operativas Desconcentradas, EODs.</p> <p>11. Se reprogramó el hito 55: EJECUCIÓN: Pliegos de equipamiento correspondiente para las carreras priorizadas en el año 2015, Realizado (ASOCIACIÓN HITO 55), debido a que el Ministerio de Finanzas al momento no ha emitido los avales presupuestarios requeridos para el desarrollo de los procesos de contratación pública.</p> <p>12. Se dio respuesta a la Supervisión Ejecutiva del proyecto por parte del Gobernador del Azuay.</p> <p>13. Se realizó una transferencia por \$11.868.620.86 en el mes de julio al Servicio de Contratación de Obras, SECOB con la finalidad de realizar el pago de planillas de avance de obras de los Institutos Superiores Tecnológicos de Santo Domingo y Latacunga y para el pago del anticipo para la construcción del Instituto de Cotacachi.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>04/08/2015 - 11:41 AM</p>
<p>JUNIO 2015</p> <p>1. Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las construcciones. Hasta junio se registran los siguientes porcentajes de avance de obra: Santo Domingo 50,45%; Latacunga 53,18%, Cotacachi 4,29%, Urcuquí 78,65%; Quito 75,65%.</p> <p>2. Continúa la elaboración de la Norma Técnica para los Institutos Tecnológicos.</p> <p>3. Se revisó y aprobó los acabados del Modelo Estándar del proyecto arquitectónico de IST con SECOB, para aplicar en todos los Institutos Tecnológicos.</p> <p>4. Se coordinó la visita de los técnicos de INMOBILIAR a los proyectos de Latacunga, Vilcabamba, Santo Domingo, Urcuquí y Azogues para establecer la ubicación de Marca País.</p> <p>5. Se suscribió el Acuerdo de Donación del predio de Quilloac, con el Ministerio de Educación.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>03/07/2015 - 03:12 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>6. Se notificó la Resolución de Declaratoria de Utilidad Pública 001-2015 del predio de Cotacachi y se suscribió la tercera escritura del predio donado por el GAD de Cotacachi a favor de la Secretaría.</p> <p>7. Se suscribió la escritura del predio expropiado a la empresa CADECEM en la ciudad de Cuenca.</p> <p>8. Se obtuvo el permiso de ocupación e ingreso del predio e Instituto en construcción dentro de la Ciudad del Conocimiento Yachay.</p> <p>9. Se suscribió el acuerdo de donación de bienes muebles con el INSPI, para el Campus del Instituto Territorial en Vilcabamba.</p> <p>10. Se suscribió el acuerdo de donación del predio en Colta, con el MINEDUC.</p> <p>11. Se dio cumplimiento al hito 51: EJECUCIÓN: Convenios firmados con empresas interesadas en acoger estudiantes en la carrera de Guianza Turística, firmados (ASOCIACIÓN HITO 51).</p> <p>12. Se dio cumplimiento al hito 52: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Cotacachi, firmadas. (ASOCIACIÓN HITO 52).</p> <p>13. Se dio cumplimiento al hito 53: EJECUCIÓN: Clases de nivelación de nueva oferta académica período 1/2015, iniciadas (ASOCIACIÓN HITO 53).</p> <p>14. Se dio respuesta a la Supervisión Ejecutiva del proyecto por parte del Gobernador del Carchi, respecto de la construcción de un instituto de educación superior.</p> <p>15. No se realizaron transferencias en el mes de junio.</p>		
<p>MAYO 2015:</p> <p>1. Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las construcciones. Al 31 de mayo se registran los siguientes porcentajes de avance: Santo Domingo 46,27%; Latacunga 43,80%, Cotacachi 2,70% (Obra Suspendida por SECOB), Urququí 71,59%; Quito 74,10%; Vilcabamba 100%.</p> <p>2. Se obtuvo la pre-validación por parte de la Comisión de Viabilidad Técnica de los predios de Tonsupa-Esmeraldas, ESPOL-Guayaquil, y extensión del terreno en Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar-Machala, para la construcción de los institutos de educación superior.</p> <p>3. Concluyó la obra de rehabilitación del EX INIGER en Vilcabamba, donde funcionará un Campus Territorial.</p> <p>4. Se realizó la revisión técnica y de operatividad de las aulas del Instituto Técnico Superior Aloasí en Quito, para dar inicio al ciclo académico.</p> <p>5. Se realizó el perfeccionamiento de la Resolución de Declaratoria de Utilidad Pública No. 2015-001, respecto del tercer predio para el instituto superior en Cotacachi, provincia de Imbabura.</p> <p>6. Se suscribió el acuerdo de donación de un predio en Colta, provincia de Chimborazo, con el Ministerio de Educación.</p> <p>7. Se gestionó la autorización de donación del predio La Matilde, en Riobamba, provincia de Chimborazo por parte de la SENAGUA.</p> <p>8. Se solicitó la renovación del convenio No. 20130313 suscrito con el MCCTH, para la implementación de los institutos de educación superior en la Amazonía.</p> <p>9. Se dio cumplimiento al hito 50: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Guamote, firmadas (ASOCIACIÓN HITO 50).</p> <p>10. Se solicitó autorización al MCCTH para reprogramar hitos y fechas comprometidas y estimadas en el GPR debido a las últimas resoluciones adoptadas en el Gabinete de Talento Humano realizado el 16 de abril de 2015.</p> <p>11. No se realizaron transferencias en el mes de mayo.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>05/06/2015 - 09:08 AM</p>
<p>ABRIL 2015:</p> <p>1. Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las construcciones: Santo Domingo 43,84%; Latacunga 38,96%, Cotacachi 2,70% (Obra Suspendida), Urququí 64,94%, Vilcabamba 63,91%%, Quito 73%.</p> <p>2. Se realizó la visita técnica a un nuevo terreno planteado por el GAD de Atacames para la implementación de un IST. Se establecieron coordenadas del terreno, compromisos de dotación de servicios y mejoramiento del terreno.</p> <p>3. Se realizaron visitas con la Comisión de Validación Técnica a los terrenos en Machala - APPB (Extensión de terreno), Guayaquil-ESPOL (Verificación de nuevo terreno), Tonchigue-Comunidad OCAME (Verificación de propuesta de terreno para donación), Tonsupa -GAD Municipal Atacames (Verificación de nuevo terreno) para la construcción de institutos.</p> <p>4. Se elaboraron y revisaron términos de referencia para la contratación de consultorías de implantación del proyecto arquitectónico estándar para los IST de Cuenca y Ambato.</p> <p>5. Se mantuvo una reunión de trabajo con SECOB para revisar los procesos de construcción de institutos en ejecución, utilización de los recursos transferidos y análisis técnico de cada obra.</p> <p>6. Se emitió la declaratoria de utilidad pública con fines de expropiación urgente por razones de interés social y nacional de un predio en Cotacachi, para la construcción del IST Territorial (predio faltante).</p> <p>7. Se adelantaron gestiones con MAGAP y Mienduc para la donación del predio ubicado en Sucumbíos, Limoncocha donde funciona el ISPEDIB Martha Bucarám de Roldós.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>05/05/2015 - 01:07 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>8. Se realizaron gestiones con Senagua y el GAD Municipal de Riobamba para concretar la donación del predio denominado La Matilde a favor de la Secretaría.</p> <p>9. Se gestionó ante Inmobiliar la donación de un predio dentro del Plan Masa en la Hacienda Carigan en Loja para la implementación de un IST.</p> <p>10. Se suscribió el acuerdo de donación del predio en Machala, El Oro donado por Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar a favor de la Secretaría.</p> <p>11. Se solicitó autorización al MCCTH para reprogramar hitos y fechas comprometidas y estimadas en el GPR debido a las últimas resoluciones adoptadas en el Gabinete de Talento Humano realizado el 16 de abril de 2015.</p> <p>12. No se realizaron transferencias en el mes de abril.</p>		
<p>MARZO 2015:</p> <p>1. Se realizaron visitas técnicas a los comités de obra, para verificar el avance en las construcciones de los institutos en: Santo Domingo 37.88%, Latacunga 31.12%, Cotacachi 2.80%, Urcuquí 62%, Vilcabamba 24.17%, Quito 67%.</p> <p>2. Se realizó una visita técnica a un terreno en la ciudad de Atacames con el GAD Municipal de la zona, para analizar su donación.</p> <p>3. Se mantuvo una reunión de trabajo con el Alcalde de Santo Domingo, para tratar sobre los límites del terreno donde se construye un instituto, por afectación del tramo vial.</p> <p>4. Se suscribió el contrato de fiscalización de la obra: rehabilitación del Ex INIGER en Vilcabamba, donde funcionará un instituto.</p> <p>5. Se obtuvo un avance del 96% en los estudios previos para contratación de la rehabilitación de la Ex Universidad José Peralta, donde funcionará un instituto en Azogues.</p> <p>6. Se dio cumplimiento al hito 56: EJECUCIÓN: Readecuación del Instituto Superior Tecnológico en Vilcabamba, iniciada (ASOCIACIÓN HITO 56).</p> <p>7. Se reprogramó el hito 28: EJECUCIÓN: Implantaciones del proyecto arquitectónico del Instituto de Guayaquil, subidas al portal de compras públicas, Realizado; debido a que SECOB e Inmobiliar se encuentran aún en el proceso de revisión de los términos de referencia para la contratación del estudio (ASOCIACIÓN HITO 28).</p> <p>8. Se reprogramó el hito 40: EJECUCIÓN: Implantaciones del proyecto arquitectónico estandarizado para los Institutos que serán construidos en el 2015, subidas al portal de compras públicas, Realizado; debido al recorte presupuestario que afectó la planificación de contratación de estudios, así como la gestión de terrenos (ASOCIACIÓN HITO 40).</p> <p>9. Se reprogramó el hito 52: EJECUCIÓN: Convenios firmados con empresas interesadas en acoger estudiantes en la carrera de Guianza Turística, firmados; debido a que las empresas se encuentran revisando los documentos habilitantes para la suscripción de los convenios (ASOCIACIÓN HITO 52).</p> <p>10. Se reprogramó el hito 57: EJECUCIÓN: Consultorías de implantación para los Institutos Tecnológicos de Cuenca, Esmeraldas, Ambato, San Gabriel y Gualaceo, adjudicadas; debido al retraso en la gestión de terrenos en los lugares previstos para la implantación del proyecto arquitectónico, por aspectos técnicos, restricciones por parte del Ministerio de Finanzas sobre la partida 84 y trámites de perfeccionamiento para la expropiación de terrenos que están en proceso (ASOCIACIÓN HITO 57).</p> <p>11. Se reprogramó el hito 58: EJECUCIÓN: Ferias de socialización y sensibilización para incremento de la matrícula en formación técnica y tecnológica, realizadas; debido a la necesidad de ejecutar las ferias en las fechas previstas para la postulación de los estudiantes que han pasado la prueba del ENES (ASOCIACIÓN HITO 58).</p> <p>12. Se reprogramó el hito 59: EJECUCIÓN: Vinculación de 10 Prometeos/Ateneos para Institutos Superiores Tecnológicos; debido a la redefinición de políticas del Proyecto Prometeo (ASOCIACIÓN HITO 59).</p> <p>13. Se reprogramó el hito 60: EJECUCIÓN: Construcciones de los Institutos Superiores Tecnológicos en Daule, Quevedo, Jaramijó y Machala, iniciadas; debido a la falta de ejecución presupuestaria por parte del SECOB y recorte al presupuesto del proyecto que afectó la planificación de construcciones de los en la Región Costa (ASOCIACIÓN HITO 60).</p> <p>14. Se reprogramó el hito 61: EJECUCIÓN: Escrituras de los terrenos de Cuenca, Riobamba, Chimbo y Gualaceo, firmadas; debido a que están en trámite las expropiaciones de predios, así como la gestión de nuevos terrenos (ASOCIACIÓN HITO 61).</p> <p>15. Se reprogramó el hito 62: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Colta, firmadas; debido a que está pendiente ingresar al Registro de la Propiedad el acuerdo de donación del predio (ASOCIACIÓN HITO 62).</p> <p>16. No se realizaron transferencias en el mes de marzo.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>03/04/2015 - 01:23 PM</p>
<p>FEBRERO 2015:</p> <p>1. Se realizó el seguimiento y monitoreo de las construcciones de Institutos a través de la participación en los comités semanales de obra, registrándose los siguientes avances: Santo Domingo (27,48%), Latacunga (13,70%), Quito (61%), Cotacachi (2,73%) y Urcuquí (36,19%).</p> <p>2. Se suscribió con fecha 23 de febrero de 2015, el contrato 20150020, para la rehabilitación y adaptación del Ex Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas, INIGER, ubicado</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>05/03/2015 - 11:28 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>en la ciudad de Vilcabamba provincia de Loja, para el funcionamiento de un Instituto Superior Tecnológico.</p> <p>3. Se elaboraron los planos y estudios para la rehabilitación de la edificación de la Ex Universidad José Peralta para el funcionamiento de un Instituto en Azogues; paralelamente se avanzó en la extinción del comodato vigente, delegación para suscripción y nuevo comodato entre la Universidad Técnica Particular de Ciencias Ambientales José Peralta e Instituto Luis Rogeiro González.</p> <p>4. Se realizó una visita técnica a los Institutos Superiores Tecnológicos en Cuenca, Guayaquil, Latacunga, Ambato, Sucúa, Puyo para evaluar el estado de la infraestructura actual.</p> <p>5. Se realizó la visita técnica para la definición de los linderos del terreno a donar en Autoridad Portuaria Puerto Bolívar en Machala para la construcción de un IST Tipo B y se elaboró el acuerdo de donación y minuta de predio.</p> <p>6. Se elaboró la declaratoria de utilidad pública para el predio de Cotacachi (cuarto predio)</p> <p>7. Se elaboró el borrador de convenio de préstamo de uso entre la Secretaría e INIAP para la entrega del terreno en Quevedo para la construcción de un IST Tipo A.</p> <p>8. Se realizó la visita técnica y validación de un nuevo terreno sugerido por ESPOL para la implantación de un Instituto Tipo B en Guayaquil.</p> <p>9. Se dio cumplimiento al hito 53: EJECUCIÓN: Consecución de cartas de intención para la formación dual de carreras en proceso de aprobación en el CES (ASOCIACIÓN HITO 53).</p> <p>10. Se reprogramó el hito "54 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Machala, firmadas", debido a que está pendiente la firma del convenio de donación con Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, así como el fraccionamiento del predio (ASOCIACIÓN AL HITO 54).</p> <p>11. Se reprogramó el hito "55 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Santo Domingo (Calazacón), firmadas", debido que está pendiente levantar la georeferenciación del predio (ASOCIACIÓN AL HITO 55).</p> <p>12. Se realizó la transferencia de \$6.000.000 al SECOB para cubrir parte de las planillas de construcción de los institutos de Latacunga y Cotacachi</p>		
<p>ENERO 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se suscribió las escrituras de traspaso de un terreno en Guamote con el GAD Municipal. -Se obtuvo la aprobación de donación de 5.9433 has de terreno por parte de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar (Ministerio de Transporte y Obras Públicas) en Machala, El Oro, para la implementación de un IST. -Se firmó el Acuerdo Interministerial de Donación Nro. 000062, del predio ubicado en Vilcabamba, Loja (2.2 has de terreno 3.500 m2 de construcción). -Continúa el avance de construcciones de los IST a cargo de Secob, Yachay EP y Ministerio de Cultura y Patrimonio, con los siguientes porcentajes de ejecución: Santo Domingo, 15,24%; Cotacachi, 4,00 %; Latacunga, 8,36%; Urcuquí, 23,95%; Quito, 59,30%. -Continúan los trabajos de desarrollo de Ingenierías de detalle para la rehabilitación de la Infraestructura de la Ex Universidad José Peralta en Azogues, donde funcionará un IST. -Se dio cumplimiento al hito 49: EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Cotacachi, iniciada (ASOCIACIÓN HITO 49). -Se dio cumplimiento al hito 50: EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Latacunga, iniciada (ASOCIACIÓN HITO 50). -Se dio cumplimiento al hito 51: EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Urcuquí, iniciada. (ASOCIACIÓN HITO 51). -No se realizaron transferencias en el mes de enero. 	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>05/02/2015 - 04:32 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se suscribió entre MINEDUC y la Secretaría, las escrituras de dos predios en Cotacachi. 2. Se rectificó la información técnica de las coordenadas y extensión adicional para revisión de INIAP, sobre el terreno en Quevedo. 3. Se realizaron los informes técnicos para la donación de la extensión adicional del predio en Machala. 4. Se elaboró la minuta del predio en Guamote, misma que se remitió al GAD Municipal para su revisión y suscripción. 5. Se realizó la inclusión mediante minuta modificatoria del comodato del Instituto Luis Rogeiro González (Azogues), para la ampliación del objeto: préstamo de oficinas de la universidad al Ministerio de Movilidad y SECAP para la firma del liquidador temporal. 6. Se obtuvo el informe legal favorable del Procurador Síndico del GAD de Cotacachi, respecto del convenio de donación del predio a favor de la Secretaría (continúa trámite). 7. Se realizó la minuta del predio en Colta, misma que se remitió al MINEDUC para su revisión y suscripción. 8. Se firmaron acuerdos interinstitucionales para la reconversión de los ISPEDIBS de Colta y Quilloac. 9. Se realizó una visita técnica al predio gestionado en Chimbo, para verificar el área a ser donada y la reubicación del área de producción para animales, a fin de levantar un nuevo convenio de donación. 	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>05/01/2015 - 05:48 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>10. Empezó la obra civil en Cotacachi (SECOB), Latacunga (SECOB) y Urcuquí (YACHAY); se iniciaron las reuniones semanales con el Comité de Obra.</p> <p>11. Se verificó el reporte de avance de obra del instituto en Santo Domingo, en promedio según información del contratista y del administrador del contrato el avance es del 12% a la fecha.</p> <p>12. Se suscribieron las actas de entrega-recepción definitivas de los contratos 20140041/20140042/20140047/20140043, respecto de los estudios diseños de implantación urbana e ingenierías de implantación de un instituto en las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro respectivamente.</p> <p>13. Se suscribió el acta de entrega-recepción definitiva del contrato 20131006 para la ampliación de la oferta académica a implementarse en los institutos y conservatorios superiores públicos del Ecuador; mismo que contemplaba la propuesta de equipamiento para cada una de las carreras.</p> <p>14. Se suscribieron varios convenios con entidades receptoras para la implementación del sistema de formación dual.</p> <p>15. Se suscribió el acta entrega provisional del contrato de obra para la rehabilitación del inmueble para el Instituto Superior de Turismo y Patrimonio.</p> <p>16. Se suscribió el acta entrega-recepción parcial del contrato 20140195 para la adquisición e instalación de mobiliario y divisiones modulares para el Instituto Superior de Turismo y Patrimonio.</p> <p>17. Se reprogramó el hito "28 EJECUCIÓN: Implantaciones del proyecto arquitectónico del Instituto de Guayaquil, subidas al portal de compras públicas, Realizado", en razón de que el SECOB, debe iniciar el proceso de contratación de los estudios respectivos sobre el proyecto de Plan Masa para los terrenos de Autoridad Portuaria de Guayaquil que incluyen un instituto de educación superior. (ASOCIACIÓN AL HITO 28).</p> <p>18. Se reprogramó el hito "40 EJECUCIÓN: Implantaciones del proyecto arquitectónico estandarizado para los Institutos que serán construidos en el 2015, subidas al portal de compras públicas, Realizado", en razón de que la gestión de terrenos en algunas localidades aún no ha concluido (ASOCIACIÓN AL HITO 40).</p> <p>19. Se reprogramó el hito "42 EJECUCIÓN: Equipamiento para institutos, adquirido en el exterior para fines pedagógicos, Adquirido", en razón de la depuración técnica de las especificaciones técnicas del equipamiento a importar (ASOCIACIÓN AL HITO 42).</p> <p>20. Se reprogramó el hito 35 "EJECUCIÓN: Pliegos de equipamiento correspondiente para las carreras priorizadas en el año 2014, Realizado", en razón de la depuración técnica de las especificaciones técnicas del equipamiento a adquirir localmente (ASOCIACIÓN AL HITO 35).</p> <p>21. No se realizaron transferencias en el mes de diciembre</p>		
<p>NOVIEMBRE 2014</p> <p>1. Seguimiento de donaciones de predios en Chimborazo, Quevedo, Cotacachi, Machala, El Eno, El Pangui, Ikiam, La Troncal, Puyo, Ambato, Tena, Zamora, Ambato, Esmeraldas, Canelos, Chimbo, Vilcabamba, Calazacón, Guamote, Cuenca.</p> <p>2. Revisión y modificación de minuta predio en Guamote, Instituto Carlos Cisneros.</p> <p>3. Revisión y modificación de minuta de contrato de comodato del Instituto Luis Rogiero González</p> <p>4. Seguimiento de escrituras y convenio con GAD Cotacachi</p> <p>5. Elaboración y revisión de minuta de Colta</p> <p>6. Modificación comodato INIAP - SENESCYT</p> <p>7. Revisión definitiva minuta acuerdo modificatorio José Peralta</p> <p>8. Reunión INMOBILIAR predios para institutos dentro de Plan Masa.</p> <p>9. Se recibieron los productos finales de las 3 consultorías de implantación.</p> <p>10. Se recibieron los productos finales de las 3 consultorías de implantación (ASOCIACIÓN HITO 30).</p> <p>11. Se realizó el informe de construcción de ITS (ASOCIACIÓN HITO 37).</p> <p>12. Se adquirió el equipamiento para el ITS construido por el el Ministerio de Cultura y Patrimonio (ASOCIACIÓN HITO 44).</p> <p>13. Se iniciaron las clases de nivelación de las carreras aprobadas por el Consejo de Educación Superior (ASOCIACIÓN HITO 41).</p> <p>14. El Instituto tecnológico de Turismo y Patrimonio se encuentra en un avance del 42% de la obra. Se encuentran finalizado la primera fase de la rehabilitación de la ex cárcel para que puedan ser utilizadas. Se ha solicitado realizar la entrega recepción provisional.</p> <p>15. Se ha adjudicado la contratación del instituto Cotacachi y se ha firmado el contrato</p> <p>16. Se firma el contrato el 7 de noviembre de la construcción del Instituto Superior Tecnológico en Latacunga los mismos que se iniciaron obras.</p> <p>17. Se ha monitoreado con SECOB las consultorías de Chimbo y Riobamba. Chimbo se ha solicitado reubicar el proyecto en una zona de menor pendiente del mismo terreno. Riobamba se solicitó suspender la consultoría hasta legalizar documentos.</p> <p>18. Se ha monitoreado el proceso constructivo de Santo Domingo, se realiza la cimentación de con un rediseño estructural elaborado por SECOB.</p> <p>19. Se han pre-valorado dos terrenos con la comisión técnica del MIDUVI, en Esmeraldas (Universidad Luis Vargas Torres) y San Gabriel de la provincia del Cañar.</p>	<p>Gordillo Salinas, Mario Andrés</p>	<p>05/12/2014 - 11:15 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>20. Se ha realizado la visita de los terrenos en la provincia de Tungurahua para ubicar terrenos en la ciudad de Ambato y en la parroquia de Cunchibamba.</p> <p>21. MIDUVI solicitado buscar otro predio en el campus de la ESPOL debido a que el terreno no cumplió con los parámetros de la comisión, por lo que se dio de baja.</p> <p>22. Se realiza la visita de obra al Instituto Superior Tecnológico localizado en el Campus 17 de Julio Yachay, localizado en Urququi, Imbabura. Se realizan trabajos de movimiento de tierras y conformación de plataformas, contempla un avance del 5%.</p> <p>23. Se realizan propuesta de utilización de espacios de la Ex Fábrica Imbabura en Atuntaqui para el funcionamiento de talleres del Instituto Superior Tecnológico.</p> <p>24. Se realizó la transferencia de \$ 16.676.497,52 a SECOB por el 50% del valor de construcción y fiscalización para los ITS de; Daeule-Jaramijó-Quevedo-Machala</p>		
<p>OCTUBRE 2014</p> <p>1. CANELOS: Se realizó acercamiento con Registro de la Propiedad y GAD Municipal del Puyo para recabar información del propietario del predio. Se informa que se trabaja en levantamiento de catastro de terrenos con fecha estimada de notificación para la respuesta el 30 de octubre. Se espera información definitiva para efectuar gestiones para la donación del terreno.</p> <p>2. QUILLOAC: Acuerdo de donación en revisión de áreas jurídicas de SENESCYT y MINEDUC para posterior firma de Ministros.</p> <p>3. CHIMBORAZO: Terreno fue transferido de MAGAP a SENAGUA en cumplimiento de disposiciones legales; se mantuvo reuniones con MAGAP y se está gestionando reunión con Secretario de SENAGUA para gestionar donación del terreno a la SENESCYT, ratificando la vigencia de los acuerdos alcanzados con MAGAP previo al traspaso de la propiedad.</p> <p>4. COTACACHI: En proceso de revisión previo a la firma de convenio con GAD Municipal de Cotacachi, para avanzar en donación de predio según la planificación original.</p> <p>5. COLTA: Acuerdo de donación en revisión de áreas jurídicas de SENESCYT y MINEDUC para posterior firma de Ministros.</p> <p>6. Se revisó las consultorías de implantación de 4 institutos para la Costa, mismas que cuentan con aval técnico de SECOB. Actas de recepción definitiva en proceso de elaboración.</p> <p>7. IST de Turismo y Patrimonio tiene un avance del 48% de la obra. La Primera Etapa se encuentra en fase final, la misma que será recibida previa acta de entrega recepción aprobada por fiscalización.</p> <p>8. Seguimiento a proceso de adjudicación de obras de los institutos de Cotacachi y Latacunga con SECOB</p> <p>9. En corrección de problemas técnicos del terreno de Riobamba + gestión de terrenos colindantes.</p> <p>10. Monitoreo de consultoría de Chimbo; se está solicitando terreno adicional para una mejor distribución de las edificaciones.</p> <p>11. Seguimiento a la construcción de IST en Santo Domingo. Obra suspendida por modificaciones en diseño estructural original; pendiente que SECOB asuma costos de movimientos de tierras no justificados.</p> <p>12. En el mes de Octubre no se realizaron Transferencias; no obstante se solicitó a Planificación la gestión de transferencias de recursos hacia SECOB.</p> <p>13. Se llegó a la conclusión de que no se pueden eliminar problemas, por cuanto cada problema creado se encuentra asociado a un Hito distinto</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>05/11/2014 - 08:49 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>Alcance al resumen ejecutivo con fecha 05/10/2014: . (Se informa que el mes de Septiembre de 2014 no se han realizado Transferencias de Recursos)</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>06/10/2014 - 09:59 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>1. Se ha realizado las revisiones de las consultorías de los institutos para la costa, el cual presenta un avance del 80%. Se están realizando ajustes finales para la recepción definitiva.</p> <p>2. El Instituto tecnológico de Turismo y Patrimonio se encuentra en un avance del 40% de la obra. Se encuentran terminados cuatro espacios para que puedan ser utilizados.</p> <p>3. Se ha dado seguimiento al proceso de contratación de obras de los institutos de Cotacachi y Latacunga con el Servicio de Contratación de Obras.</p> <p>4. Se han subsanados los problemas técnicos del terreno de Riobamba y se cuenta con la resolución del consejo municipal para implementar el Instituto.</p> <p>5. Se ha monitoreado con Servicio de Contratación de Obras las consultorías de Chimbo y Riobamba. Chimbo presenta problemas técnicos que no son subsanables. Riobamba se avanza con el producto final.</p> <p>6. Se ha monitoreado el proceso constructivo de Santo Domingo, al momento se encuentra suspendido por falta de firma de contrato.</p> <p>7. Se han pre-valorado dos terrenos con la comisión técnica del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en Cuenca (Ex Cear) y Gualaceo de la provincia del Azuay.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>05/10/2014 - 07:10 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>8. Se ha realizado visitas en los terrenos en Esmeraldas en los predios de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, y en zona 4x4 de la ciudad del Tena, para implementar un Instituto Tecnológico.</p> <p>9. Se ha solicitado a la Escuela Politécnica del Litoral la ubicación de un nuevo terreno en los predios de su campus, debido que el terreno indicado anteriormente no cumple con los requerimientos de Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación.</p> <p>10. Pichincha: Instituto Técnico Superior Aloasi trámite completado con escrituras inscritas en el Registro de la Propiedad.</p> <p>11. Loja: INIGER se están esperando informe y respuesta para el INSPI del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se deja un expediente con la información y copias de los documentos recabados.</p> <p>12. Imbabura: Se hizo gestión Ministerio de Educación hablar con de la Coordinación Zonal del Ministerio de Educación el Dr. Ramiro Palacios, se enviaron habilitantes para la firma de escritura</p> <p>13. Chimborazo: Se obtuvo la Ordenanza del Cambio del Eje Vial, se está gestionando para saber respuesta de Ministerio de Agricultura para la donación del bien</p> <p>14. Guayas: Se obtuvieron escrituras Inscritas en el Registro de la Propiedad.</p>		
<p>AGOSTO 2014</p> <p>1. Se transfirieron US\$10'202.871,50 a SECOB para la construcción y fiscalización de dos (2) Institutos Superiores Tecnológicos, Tipo A, en Latacunga, provincia de Cotopaxi y Cotacachi, Provincia de Imbabura.</p> <p>2. Se recibieron las correcciones finales a las consultorías de implantación de cuatro Institutos: Daule, Quevedo, Jaramijó, Machala. Al momento se encuentran en proceso de validación por parte de Secob para el inicio de los procesos precontractuales. Se espera iniciar la construcción el 10 de octubre.</p> <p>3. Se dio inicio a la construcción del IST de Santo Domingo por parte del Consorcio EPCO Tsáchila; se recibió la visita del Presidente de la República quien verificó el inicio de trabajos de movimiento de tierras.</p> <p>4. Junto con la comisión interinstitucional MIDUVI-Inmobiliar-Secob se procedió a la validación de un terreno en la comunidad de Bullcay, cantón Gualaceo, provincia de Azuay, para la implementación de un IST.</p> <p>5. Continúa el avance de obra en la ex cárcel 2 para la implementación del Instituto de Turismo y Patrimonio. Se espera la entrega de la primera fase para finales de septiembre.</p> <p>6. Los TDR para la rehabilitación de las instalaciones en Azogues y Vilcabamba fueron aprobados por las direcciones administrativa y contratación pública. El proceso se elevará al portal en la semana del 8 de septiembre. Se espera el desarrollo de las obras de rehabilitación en el mes de octubre.</p> <p>7. Se efectuaron observaciones a los productos entregados por parte de las consultoras para para la definición de equipamiento para cada una de las carreras priorizadas a implementarse en el año 2014; al momento se encuentran en proceso de revisión y validación.</p>	Reinoso Hidalgo, Juan Fernando	04/09/2014 - 05:11 PM
<p>JULIO 2014</p> <p>.28 de julio: se recibieron los productos subsanados con todas las correcciones solicitadas a las consultorías de implantación de los IST de Daule, Quevedo y Jaramijó para la revisión final y elaboración de informe de satisfacción. Los estudios se remitieron el 29 de julio a SECOB para el inicio de la etapa precontractual de la construcción.</p> <p>.Levantamiento de los términos de referencia para la contratación de los servicios de rehabilitación, adaptación y acondicionamiento de los inmuebles de la Ex Universidad Técnica de Ciencias Ambientales José Peralta ubicada en el cantón Azogues, Cañar y del Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas, INIGER, ubicado en la ciudad de Vilcabamba, Loja, para que funcionen como institutos tecnológicos de educación superior.</p> <p>.Se levantó y recibió el inventario de bienes muebles existentes en el INIGER a ser donados a esta Secretaría.</p> <p>.23 de julio: entró a consideración del Consejo Municipal de Riobamba la resolución de aprobación para el fraccionamiento del terreno a donarse por parte del MAGAP, sin que exista afectación en la trama vial proyectada.</p> <p>.Elaboración de convenio y minuta de donación de la hacienda "Totorilla", en Guamote.</p> <p>.Solicitud oficial de donación de terreno a la Comunidad de Bullcay-EI Carmen (Gualaceo).</p> <p>.Visitas semanales para verificar el avance de obra de la Rehabilitación del Inmueble para el Instituto Superior de Turismo y Patrimonio (Yavirak); a julio se registra un avance del 16% en planillas y 17% de obra.</p> <p>.Se definieron los listados de bienes para la adquisición del equipamiento a importarse de las carreras de: Desarrollo Integral Infantil, Guianza Turística y Atención Primaria en Salud.</p> <p>Visitas técnicas a terrenos:</p> <p>.04 de julio: Terreno de propiedad del MAGAP en Tambillo, Pichincha; no favorable.</p> <p>.07 de julio: ISPEDIB Canelos-Puyo, Pastaza; no existen escrituras del predio, está en revisión la gestión de donación.</p>	Reinoso Hidalgo, Juan Fernando	01/08/2014 - 10:22 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>.09 de julio: Terreno en Alangasí, Pichincha, con la Comisión Interinstitucional de Viabilidad Técnica. Terreno es prevalidado. .10 de julio: Cinco terrenos en Cuenca; se descartan cuatro por inviabilidad técnica. La única viable requiere de análisis y aprobación del Secretario por el monto requerido para su expropiación. .22 de julio: Terreno en Babahoyo de propiedad de la UTB, conjuntamente con la Comisión Interinstitucional de Viabilidad Técnica. Predio no validado por el volumen de relleno requerido y su costo. .23 de julio: Terreno en San Gabriel, Carchi. Predio con validación preliminar, se solicitará inspección de la Comisión de Viabilidad Técnica. Transferencias: .Se transfirieron US\$4'972.949,95 a Yachay EP para la implementación de un IST en la Ciudad del Conocimiento</p>		
<p>JUNIO 2014 Visitas técnicas: a.9 de junio: Cariamanga y Vilcabamba, para levantamiento del estado de los inmuebles, propuesta de rehabilitación y presupuesto de obra para la rehabilitación de la ESPEC (Cariamanga) y el INIGER (Vilcabamba), donde funcionarán los campus de un IST. b.11 de junio: visita a Guamote, para socializar al Alcalde posesionado el proyecto de reconversión, para agilizar los procesos de donación del terreno de la hacienda "Totorilla", para la construcción de un IST. c.11 de junio: visita a Colta, al Instituto Superior Pedagógico Bilingüe, Jaime Roldós Aguilera que será donado por el Mineduc a la Secretaría para definir la división del terreno tanto para la construcción de un IST, como de una unidad del milenio a cargo del MINEDUC. d.12 de junio: visita a Gualaceo y Quilloac para gestionar posibles terrenos para la construcción de un IST. e.18 de junio: visita a Tonchigüe, Esmeraldas y Piquiucho, Imbabura, para gestionar posibles terrenos para la construcción de IST. f.23 de junio: visita a Riobamba para gestionar la extensión del terreno donde funcionará un IST, así como la regulación del trámite legal para la donación del predio gestionado en dicho lugar. g.23 de junio: visita a San Gabriel, Carchi, para gestionar posibles terrenos para la construcción de un IST. 2)Trámites legales para el perfeccionamiento en la donación de bienes inmuebles: a.Se entregó al departamento jurídico del MIES, la minuta de donación del inmueble del INIGER. b.Se ingresó al Municipio de Riobamba, mediante oficio los justificativos legales y técnicos para la construcción de un IST, a fin de que se suspenda el proyecto de trama vial previsto por el GAD para el predio en mención. c.Se gestionó el pago del impuesto a la donación en el SRI de los institutos de Sucúa y Quito (Instituto de Patrimonio y Cultura). 3)Se remitieron observaciones a los productos de las consultorías de implantación de Jaramijó, Quevedo, Daule y Machala; se entregarán corregidas hasta el 11 de julio. 4)Con fecha 10 de junio, SECOB entregó el Oficio Nro. SECOB-DG-2014-0809-O, con el detalle de presupuestos referenciales con los costos por bloque, de los modelos estándar tipo A, B e IST Santo Domingo. 5)Se reprogramó el hito 28 en razón de la reunión con Inmobiliar en la que se presentó el Plan Masa para los predios de Autoridad Portuaria de Guayaquil, donde se incorporará un IST. Se definieron las coordenadas de los terrenos y se presentó el proyecto integral; Inmobiliar gestionará los permisos de construcción respectivos con la Municipalidad de Guayaquil y contratará una consultoría completa para el diseño del Plan Masa. 6)Se reprogramó el hito 31, en razón del nuevo ajuste de presupuesto para la construcción de los institutos por parte del SECOB. 7)Se reprogramaron los hitos 32, 34 y 35, en razón de que los productos de consultoría que establecen la definición de las especificaciones técnicas del equipamiento para cada una de las carreras, se encuentra en revisión y ajuste por parte de los consultores. 8)Se reprogramó el hito 33 en razón de que el oficio de SECOB con el nuevo presupuesto previsto para la construcción de los institutos de tipo A y B, llegó en el mes de junio. 9)No se realizaron transferencias en el mes de junio.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>04/07/2014 - 06:54 PM</p>
<p>MAYO 2014: 1)02 de mayo, se inscribió las escrituras en el Registro de la Propiedad del predio donado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para la construcción del Instituto Superior de Turismo y Patrimonio, a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio. 2)08 de mayo, se inscribió las escrituras en el Registro de la Propiedad del predio donado por el Consejo Provincial de Cotopaxi, para la construcción de un instituto superior en Latacunga. 3)05 de mayo de 2014, se realizó una visita técnica a las instalaciones de la ex Universidad José Peralta en Azogues, para evaluar el estado del inmueble que será entregado por parte del CES a la Secretaría para la implementación de un instituto. Se efectuó el levantamiento del estado de</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>04/06/2014 - 07:02 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>la infraestructura mediante planos de arquitectura e ingenierías, para determinar los trabajos de remodelación y presupuesto requerido para la contratación de la obra.</p> <p>4)15 de mayo de 2014, se mantuvo una reunión de trabajo entre delegados del MIDUVI, MAGAP y de la Secretaría, para avanzar con los procesos de traspaso de dominio de los predios del ex Instituto Nacional de Riego-INAR, ubicado en Riobamba, y en el que se recomienda subdividir el predio con el fin del que el MAGAP proceda a solicitar la modificación de los ejes viales existentes en la zona. La aprobación está pendiente por parte de las autoridades de las instituciones involucradas.</p> <p>5)16 de mayo de 2014, la Secretaría suscribió con el MINEDUC los acuerdos interinstitucionales para la donación de terrenos en Cotacachi, Santo Domingo y Chimbo.</p> <p>6)19 de mayo de 2014, el MCP adjudicó la consultoría para la fiscalización de la obra de rehabilitación del inmueble para el Instituto Superior de Turismo y Patrimonio.</p> <p>7)21 de mayo de 2014, el equipo técnico del proyecto, suscribió con la Empresa Pública de importaciones-EPI, el acta de reunión que contiene la programación de actividades a ejecutar por parte de las dos instituciones para importar el equipamiento para las carreras a implementarse en 3 institutos priorizados.</p> <p>8)27 de mayo de 2014, la Secretaría adjudicó mediante consultoría el servicio de evaluación y definición de las características técnicas de equipos, máquinas, herramientas, mobiliario y demás componentes en aulas, talleres y laboratorios a ser implementados en los institutos técnicos y tecnológicos, de 12 carreras.</p> <p>9)21 de mayo y 30 de mayo de 2014, las máximas autoridades de la Secretaría, MCCTH, y el SECOB mantuvieron reuniones de trabajo, en las cuales se oficializó el cronograma de construcciones para 9 institutos.</p> <p>10)La Secretaría definió con Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, la extensión de área del terreno donado en Machala para la construcción de un instituto superior, ampliando su extensión hasta 3.77 hectáreas.</p> <p>11)El 09 de mayo la Secretaría recibió los informes de las consultorías de implantación de Daule y Quevedo, mismos que se encuentran en etapa de corrección ante las observaciones emitidas. Debido a problemas con la definición del terreno, se prorrogó el plazo del contrato de la consultoría de implantación de Machala hasta el 14 de junio de 2014, mientras que está aún en ejecución la consultoría de implantación de Jaramijó.</p> <p>12)Reprogramación Hito 29: Los consultores para las implantaciones de Guayas y Los Ríos entregaron los productos en las fechas previstas, sin embargo, los mismos fueron observados y se encuentran en su fase de corrección.</p> <p>13)Reprogramación del Hito 31 y 33: Es necesario reprogramar el hito pues los productos presentados por la consultora, se encuentra en proceso de corrección a fin de que cumplan los parámetros técnicos para la adquisición local e importación.</p> <p>14)Reprogramación del Hito 32: El SECOB no ha entregado presupuestos definitivos del estándar, lo cual impide contratar la construcción de los institutos planificados, por ende ejecutar las transferencias del caso.</p> <p>15)No se realizaron transferencias en el mes de mayo.</p>		
<p>ABRIL 2014:</p> <p>1)SECOB suscribió los siguientes contratos de consultorías directas para la implantación del Proyecto de Reconversión de Institutos Superiores Tecnológicos en: 1) Cotacachi-Imbabura, 09 de abril de 2014, 2) Riobamba-Chimborazo, 04 de abril de 2014, 3) Latacunga-Cotopaxi, 09 de abril de 2014. Finalmente se adjudicará hoy, 05 de mayo la consultoría para el estudio en Chimbo-Bolívar.</p> <p>2)La Secretaría suscribió los siguientes contratos de consultorías directas para los estudios, diseños de implantación urbana e ingenierías de implantación de un instituto superior tecnológico ubicado en la ciudad de Jaramijó, provincia de Manabí el 03 de abril de 2014.</p> <p>3)El equipo técnico del proyecto ha mantenido reuniones de trabajo semanales, para verificar los avances en los estudios, con los consultores contratados para las consultorías de implantación de: Jaramijó, Daule, Machala y Quevedo.</p> <p>4)El Ministerio de Cultura y Patrimonio ha suscrito un contrato con fecha 24 de abril de 2014, para la rehabilitación del inmueble para el Instituto Superior de Turismo y Patrimonio, iniciando de esta manera la construcción de uno de los institutos reconvertidos.</p> <p>5) El equipo técnico del proyecto ha revisado el equipamiento definido para 30 nuevas carreras, mismas que están en proceso de reajuste.</p> <p>6)El equipo técnico ha realizado visitas técnicas a diferentes provincias del país, para la verificación y definición de terrenos donde se construirán los institutos tecnológicos de educación superior, siendo los visitados en el mes de abril los siguientes: 1) Machala, se solicitó a la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, la extensión de área para el proyecto; 2) Riobamba, definición de límites de terrenos y proceso de levantamiento de ordenanzas municipales en relación a la trama vial del terreno; 3) La Troncal, se solicitó al Municipio de la troncal, la geo-referenciarían del terreno.</p> <p>7)El equipo técnico del proyecto ha mantenido reuniones con la Empresa Pública de Importación EPI-EP, en función del convenio marco suscrito el 16 de abril de 2014, entre la Secretaría y la</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>05/05/2014 - 05:07 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>EPI, con el objeto de que asesore a la Secretaría en la determinación de aquellos bienes que no son producidos a nivel nacional y que forman parte del equipamiento de los Institutos Superiores públicos a reconvertirse y gestione los procesos de importación, para aquellos bienes requeridos por la Secretaría con dicha finalidad.</p> <p>8)En el mes de abril se ha gestionado la firma de las siguientes escrituras de donación de terrenos para los institutos técnicos y tecnológicos: 1) Jaramijó, 10 de abril 2014 y 2) Sucúa, 22 de abril de 2014.</p> <p>9)Retraso Hito 27: Existe una redefinición de los predios asignados a cada institución, por lo cual el 06 de mayo se programa la reunión de presentación del Plan Masa en los Terrenos del Sector Sur de Guayaquil con la inclusión del Planetario y redefinición de la ampliación del Centro de Atención Logístico de Transporte. Dicho esto, el hito 27 nuevamente se somete a una reprogramación.</p> <p>10)Cumplimiento Hito 28, mediante informe de asociación se verifica que se dio cumplimiento a la presentación del informe de presentación de 13 carreras al Consejo de Educación Superior.</p> <p>11)Reprogramación hito 30: Es necesario reprogramar la fecha estimada de este hito, en razón de que el SECOB no ha establecido el presupuesto de construcción de los institutos, ni ha iniciado el proceso precontractual para la construcción del instituto de Santo Domingo, pese a contar ya con el presupuesto transferido para el efecto.</p> <p>12)Reprogramación hito 31: Es necesario reprogramar la fecha estimada de este hito, en razón de que el equipamiento de al menos 30 carreras está en un proceso de revisión y ajuste a sus especificaciones técnicas.</p> <p>13)No se realizaron transferencias en el mes de abril</p>		
<p>MARZO 2014: 1) El 20 de marzo, la Secretaría y el GAD Municipal de Daule, suscribieron la escritura pública de donación de un predio de aproximadamente 3 hectáreas donde se construirá un Instituto Tecnológico Superior Territorial. De igual forma, el 26 de marzo, la Secretaría y SETEMAR suscribieron la escritura pública de donación de un predio de 30 hectáreas en el sector de Jaramijó, en el que se construirá un Instituto Tecnológico Superior Sectorial de Mar y Pesca.</p> <p>2) El 28 de marzo, la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito informó que el Concejo autorizó la donación de los predios para la edificación del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio.</p> <p>3) La Secretaría adjudicó y firmó los contratos para la realización de las consultorías de implantación para los terrenos de Jaramijó, Daule, Machala y Quevedo. La firma de contratos se efectuó de acuerdo al siguiente detalle: Quevedo: firmado 25 de marzo, Daule: firmado 25 de marzo, Machala: firmado 25 de marzo, Jaramijó: por firmarse 3 de abril.</p> <p>4) SECOB adjudicó los contratos de consultorías de implantación para los terrenos de Riobamba, Latacunga, Cotacachi. Riobamba: adjudicado 19 de marzo. Fecha tentativa de firma de contrato: 3 de abril; Latacunga: adjudicado 19 de marzo. Fecha tentativa de firma de contrato: 3 de abril; Cotacachi: adjudicado 19 de marzo. Fecha tentativa de firma de contrato: 3 de abril; Chimbo: sin adjudicarse. No existe confirmación de fecha de adjudicación, firma de contrato y entrega de consultoría.</p> <p>5) El Ministerio de Cultura y Patrimonio realizó el 18 de marzo la apertura de sobres para la licitación de la construcción del Instituto de Turismo y Patrimonio. La fecha tentativa para la adjudicación del contrato es el 4 de abril. Se espera así arrancar las obras que tendrán una duración de 420 días.</p> <p>6) Se presentaron 7 carreras para la aprobación del Consejo de Educación Superior-CES (hito relacionado 26)</p> <p>7) Retraso Hito 27: El 26 de febrero del 2014, Inmobiliar presentó el denominado plan masa para la distribución de terrenos del predio de Autoridad Portuaria de Guayaquil; en la reunión se plantea la necesidad de realizar un ajuste a los terrenos asignados a MINEDUC y a la Secretaría por lo que el plan masa no fue aprobado.</p> <p>El 19 de marzo del 2014, INMOBILIAR informa a la Secretaría la ubicación del predio a ser entregado para la implantación de un instituto superior tecnológico, para proceder a la presentación final del PLAN MASA por parte del Director de INMOBILIAR al señor Presidente de la República en el Gobierno Zonal el martes 25 de marzo del presente año.</p> <p>Aún está pendiente que APG transfiera el dominio del MACROLOTE a INMOBILIAR, una vez que el Presidente de la República aprobó el Plan. Una vez que finalice la transferencia del dominio, INMOBILIAR procederá a declarar el terreno bajo el régimen de propiedad horizontal.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>07/04/2014 - 06:27 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Hasta no contar con el pronunciamiento definitivo de Inmobiliar respecto a la determinación del predio a ser entregado a la Secretaría no se puede contratar la consultoría de implantación. Se espera que la notificación oficial se produzca en el transcurso de abril.</p> <p>*No se han realizado transferencias en el mes de marzo.</p>		
<p>FEBRERO 2014: La Secretaría subió al portal de compras públicas los procesos de contratación de las consultorías de implantación e ingenierías de detalle del diseño arquitectónico modular estándar para la construcción de los institutos superiores tecnológicos a ser reconvertidos en las ciudades de Machala, Durán y Quevedo; de igual forma el SECOB subió similares procesos para las ciudades de Chimbo, Riobamba, Latacunga y Cotacachi. Mediante oficio No. MIDUVI-DESP-2014-0081-0, de 08 de febrero del 2014, el Presidente de la Comisión de Viabilidad Técnica, ratificó la viabilidad técnica de los predios de Jaramijó y Santo Domingo.</p> <p>Transferencias realizadas: -SECOB: Instituto de Santo Domingo: \$7'222,858.79 USD Modulares de Talleres para Instituto Santo Domingo: \$55,011.94 USD</p> <p>-MINISTERIO DE CULTURA: Instituto Yavirak: \$7'000,000.00 USD</p>	Almeida Luna, Nelson Fernando	05/03/2014 - 03:46 PM
<p>ENERO 2014: Se firmó las escrituras de traspaso de dominio de un predio de 3 has donado a la Secretaría por parte del GAD Provincial en Santo Domingo de los Colorados donde se construirá la infraestructura para el Instituto Superior Tecnológico. Se ha definido el equipamiento para las doce mallas curriculares aprobadas por el Consejo de Educación Superior cuya adquisición mediante el portal de compras públicas se ajustará de acuerdo al cronograma de ejecución de la construcción de los institutos superiores tecnológicos a ser reconvertidos.</p>	Nina Rada, Galo Antonio	04/02/2014 - 10:47 AM
<p>DICIEMBRE 2013: Se firmó dos convenios específicos con el SECOB para los estudios y construcción del ITS de Santo Domingo, un convenio específico para la readecuación de la ex Cárcel Dos para el funcionamiento del ITS de Turismo y Patrimonio por parte del Ministerio de Cultura; y, un convenio marco con el GAD Municipal de Sucúa para la donación de un predio que se donará a favor de SENESCYT para la construcción de ITS. Se recibió para revisión los estudios de ingenierías de detalle por parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio y SECOB para la remodelación de la ex Cárcel Dos e ITS en Santo Domingo respectivamente, así como sendos cronogramas de ejecución de obra que se tomará en cuenta para la adquisición del equipamiento respectivo.</p>	Sánchez Cobo, Francisco Fernando	06/01/2014 - 09:43 AM
<p>NOVIEMBRE 2013: Se emitió el informe respectivo sobre planos e ingenierías del IST de Patrimonio para el cual ya se cuenta con el borrador del convenio con el Ministerio de Cultura para la construcción del mismo. Además, se dispone del informe de viabilidad de la Comisión (MIDUVI e INMOBILIAR) sobre 21 terrenos donde se construirán los institutos. Se cuenta con una estrategia acordada con SECOB para la inscripción de 11 terrenos adicionales en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). En relación al equipamiento de aulas, laboratorios y talleres de 11 carreras, se está depurando la lista de 650 items.</p> <p>Retraso Hitos 18 y 20: La SECOB comunicó a la Subsecretaría General de Educación Superior la imposibilidad de iniciar la construcción de los 12 institutos y propuso que se lo inicie en marzo del 2014; por tanto el convenio específico para la construcción de los Institutos y el inicio de obra se postergarán para el próximo año.</p>	Sánchez Cobo, Francisco Fernando	03/01/2014 - 04:28 PM
<p>NOVIEMBRE 2013: Se emitió el informe respectivo sobre planos e ingenierías del IST de Patrimonio para el cual ya se cuenta con el borrador del convenio con el Ministerio de Cultura para la construcción del mismo. Además, se dispone del informe de viabilidad de la Comisión (MIDUVI e INMOBILIAR) sobre 21 terrenos donde se construirán los institutos. Se cuenta con una estrategia acordada con SECOB para la inscripción de 11 terrenos adicionales en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). En relación al equipamiento de aulas, laboratorios y talleres de 11 carreras, se está depurando la lista de 650 items.</p> <p>Retraso Hitos 18 y 20: La SECOB comunicó a la Subsecretaría General de Educación Superior la imposibilidad de iniciar la construcción de los 12 institutos y propuso que se lo inicie en marzo del 2014; por tanto el convenio específico para la construcción de los Institutos y el inicio de obra se postergarán para el próximo año.</p>	Nina Rada, Galo Antonio	03/01/2014 - 04:27 PM
<p>OCTUBRE 2013: Se desarrolló el II Taller de Validación de Equipamiento de cinco carreras, y se está iniciando el proceso de elaboración de los términos de referencia para la adquisición de equipamiento de mobiliario de aulas y laboratorios, y equipamiento para talleres de once carreras. Se ha revisado y aprobado el proyecto arquitectónico de Yavirac con el Ministerio de Cultura y el Instituto Metropolitano de Patrimonio del Municipio de Quito que ya ha iniciado la elaboración de la desagregación tecnológica. Adicionalmente, se ha terminado de realizar las ingenierías de</p>	Nina Rada, Galo Antonio	06/11/2013 - 08:40 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
implantación en el terreno de Latacunga y se remitió las propuestas de convenio para iniciar la construcción con SECOB y con el Ministerio de Cultura.		
SEPTIEMBRE 2013: Se cuenta con el anteproyecto arquitectónico estándar en dos tamaños A, para ciudades de menos de 150.000 habitantes con capacidad para 1.920 cupos y B, para ciudades de más de 150.000 habitantes, con capacidad para 3.840 cupos. Adicionalmente, se dispone del informe de viabilidad de la Comisión (MIDUVI, INMOBILIAR y SECOB) sobre 15 terrenos donde se construirán los institutos, los mismos que están siendo ingresados al SUIA para obtener la licencia ambiental. Se estima que con la aprobación de la plurianualidad solicitada al MCCTH y a SENPLADES, se proceda a la firma del convenio con SECOB para la construcción de 12 institutos que serán localizados en las siguientes ciudades y tamaños.	Sánchez Cobo, Francisco Fernando	04/10/2013 - 09:34 AM
AGOSTO 2013: se avanzó en la obtención de informes favorables de viabilidad de la Comisión de MIDUVI-INMOBILAR, de 12 terrenos en los que se construirán los institutos a partir de noviembre. Además, se realizaron talleres, con la participación de la empresa privada, universidades, gremios y organizaciones sociales para validar la propuesta de equipamiento para aulas, talleres y laboratorios de seis carreras ya aprobadas por el CES. Se cuenta con la última versión del anteproyecto arquitectónico de los institutos.	Sánchez Cobo, Francisco Fernando	03/09/2013 - 02:40 PM
JULIO 2013: Se ha visitado a empresas, universidades técnicas escuelas formadoras e institutos y revisado las mallas curriculares de las seis carreras aprobadas por el CES: Guianza Turística, Logística de Almacenamiento y distribución, Mecánica Automotriz, Técnico de Atención Primaria de Salud (TAPS), Desarrollo de Software y Minería Subterránea. Se cuenta con las especificaciones técnicas del equipamiento y mobiliario para talleres, laboratorios y aulas para los institutos donde se dictarán las carreras arriba indicadas. Con esto se procedió a identificar el equipamiento y mobiliario para cada carrera. Además se remitió al ICO estos productos, pues se requieren para elaborar los planos constructivos de laboratorios y talleres a partir de las dimensiones del equipamiento y mobiliario necesario.	Sánchez Cobo, Francisco Fernando	02/08/2013 - 10:16 AM
JUNIO 2013: Se ha realizado la visita técnica con MIDUVI, INMOBILIAR E ICO a ocho terrenos, de las cuales se han validado 3 terrenos localizados en: Portovelo, Santo Domingo y Cotacachi y continuar con el proceso legal de donación a favor de la SENESCYT. El ICO ha entregado un informe técnico en cuanto al prototipo arquitectónico de institutos a implementarse en Céntrica y su réplica a nivel nacional; entre las observaciones recalcan de que el modelo no se puede estandarizar y su costo es elevado, por lo que se está solicitando una cita con el Alcalde para explicarle la inviabilidad de construir en el parque lineal y pedirle alternativas de donación de un nuevo terreno.	Sánchez Cobo, Francisco Fernando	01/07/2013 - 03:04 PM
MAYO 2013: Se ha propuesto la incorporación de un cuarto componente con su respectivo presupuesto para que las autoridades analicen y aprueben la incorporación en el nuevo documento que deberá presentarse a SENPLADES y al Ministerio de Finanzas. Se entregó el primer producto de la consultoría que es el plan de trabajo para coordinar con las áreas respectivas y controlar los tiempos que garanticen el cumplimiento del objeto del contrato, enlistar o detallar técnicamente los equipos, máquinas o herramientas para dar funcionalidad a las aulas, talleres o laboratorios en los ISTT.	Nina Rada, Galo Antonio	03/06/2013 - 05:46 PM
ABRIL 2013: Se mantuvieron reuniones entre ICO-SENESCYT para conocer el anteproyecto arquitectónico modular y se elaboró un informe técnico para cambios y consecuente aprobación de SENESCYT. El 25 de abril, se mantuvo una reunión de Directivos para definir convenios, hoja de ruta, mecanismos de coordinación y periodos de desembolsos. Adicionalmente se mantuvieron 2 reuniones con el Rector de la Escuela Politécnica Nacional y el Asesor del Decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador para posible convenio de cooperación que permita elaborar las especificaciones técnicas para adquisición de equipamiento y mobiliario de talleres, laboratorios y aulas.	Nina Rada, Galo Antonio	31/05/2013 - 10:40 AM
MARZO 2013: Con Oficio SENPLADES SGPBV-2013-0178-OF del 14 de Febrero 2013, SENPLADES priorizó el proyecto "Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador" por un monto total de USD \$308.483.239,35. Se realizaron 4 talleres para la construcción de carreras de tecnología en: plásticos, mar y pesca, industria textil y químico farmacéutico en las ciudades de Guayaquil, Manta y Quito. Adicionalmente, se firmó el Convenio con el Municipio de Quito para la construcción del Instituto Sectorial de Turismo.	Zabala Celi, Jhony Leandro	25/03/2013 - 03:22 PM
FEBRERO 2013: Se firmó el convenio para la donación del terreno en la Ciudad de Ibarra para la construcción del Instituto Territorial de Imbabura; adicionalmente se firmaron 2 convenios para donación de terrenos en la ciudad de El Oro para un Instituto Sectorial y un Instituto Territorial.	Zabala Celi, Jhony Leandro	25/03/2013 - 03:08 PM
ENERO 2013: Se envió a la SENPLADES el proyecto de inversión "Reconversión Técnica y Tecnológica Superior del Ecuador", para su aprobación y priorización; sin embargo como parte del proceso de reconversión de la formación tecnológica se culminaron cuatro proyectos de carrera que serán ofertados en los Institutos Superiores: Paratecnólogo en minería subterránea, desarrollo de software, Logística y transporte y Mecánica automotriz.	Zabala Celi, Jhony Leandro	25/03/2013 - 03:04 PM

Problemas cerrados: 41, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. Económico. Demora Avaes por parte del Ministerio de Finanzas	03/02/2016	Juan Fernando Reinoso Hidalgo	10 %	10	1	0/0

Riesgos cerrados: 8, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Carchi > Toda la Provincia del Carchi
2	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas
3	Zona 1 - Norte > Imbabura > Toda la Provincia de Imbabura
4	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios
5	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Toda la Provincia de Napo
6	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha
7	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo
8	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Toda la Provincia de Cotopaxi
9	Zona 3 - Centro > Pastaza > Toda la Provincia de Pastaza
10	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Toda la Provincia de Tungurahua
11	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí
12	Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Toda la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas
13	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Toda la Provincia de Bolívar
14	Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas
15	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Toda la Provincia de Los Ríos
16	Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay
17	Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar
18	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago
19	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro
20	Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja
21	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipec > Toda la Provincia de Zamora Chinchipe

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Proyecto Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador, Realizado	4-Inicio de Trabajo	28/02/2013		13/02/2013		Sí	10.0
2	PLANIFICACIÓN: Dictamen favorable de priorización del proyecto, emitido por SENPLADES, Emitido.	4-Inicio de Trabajo	28/02/2013		14/02/2013		Sí	10.0
3	EJECUCIÓN: Contratación de mallas curriculares para las carreras de los institutos que se abrirán durante el año, Realizado.	4-Inicio de Trabajo	08/03/2013		08/03/2013		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
4	EJECUCIÓN:Equipo de trabajo contratado	4-Inicio de Trabajo	15/03/2013		15/03/2013		Sí	0.25
5	EJECUCIÓN:Sistema de Rendición de cuentas del proyecto, entregado	5-Entregables Intermedios	26/04/2013		26/04/2013		Sí	0.13
6	EJECUCIÓN:Informe sobre la demanda posible para cada instituto, elaborado	5-Entregables Intermedios	29/04/2013		29/04/2013		Sí	0.13
7	EJECUCIÓN:Convenio para consultoría de ingeniería de detalle firmado con el ICO, Firmado.	4-Inicio de Trabajo	13/05/2013		13/05/2013		Sí	0.25
8	EJECUCIÓN:Normativa jurídica de operación administrativa financiera y académica para los ISTTP, entregada a autoridades SENESCYT, Entregado.	9-Entregables Formales	14/05/2013		14/05/2013		Sí	0.13
9	EJECUCIÓN:Informe de avance de la consultoría de equipamiento entregado	5-Entregables Intermedios	30/05/2013		30/05/2013		Sí	0.13
10	EJECUCIÓN:Informe de sistematización de los Talleres Sectoriales y Territoriales, entregado	5-Entregables Intermedios	30/05/2013		30/05/2013		Sí	0.25
11	EJECUCIÓN:Proyecto Senplades replanificado y entregado a las autoridades SENESCYT, Realizado.	5-Entregables Intermedios	30/05/2013		30/05/2013		Sí	0.13
12	EJECUCIÓN:Proyecto arquitectónico modular, aprobado por SENESCYT, Aprobado.	9-Entregables Formales	07/06/2013		07/06/2013		Sí	0.38
13	EJECUCIÓN:Documento del sistema de rendición de cuentas del proyecto, aprobado por autoridades SENESCYT, Aprobado.	9-Entregables Formales	28/06/2013		28/06/2013		Sí	0.13
14	EJECUCIÓN:Especificaciones técnicas de talleres y laboratorios de seis carreras aprobadas por el CES para que se desarrolle ingeniería de detalle y de implantación en el proyecto arquitectónico modulado, entregadas al ICO, Aprobado.	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		30/07/2013		Sí	0.25
15	EJECUCIÓN:Especificaciones técnicas de talleres y laboratorios de seis carreras aprobadas por el CES para que se desarrolle ingeniería de detalle y de implantación en el proyecto arquitectónico modulado, entregadas al ICO, Aprobado.	5-Entregables Intermedios	12/09/2013		12/09/2013		Sí	0.13
16	EJECUCIÓN:Sistematización de la validación de la oferta académica, entregado.	9-Entregables Formales	19/09/2013		19/09/2013		Sí	0.25
17	EJECUCIÓN:Carrera de desarrollo integral infantil, presentada al CES, Realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.13

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
18	EJECUCIÓN:Carrera de entrenamiento deportivo, presentada al CES, Realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.25
19	EJECUCIÓN:Informe de viabilidad de los terrenos, entregado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.25
20	EJECUCIÓN:Informe técnico y de identificación de carreras, entregado.	5-Entregables Intermedios	29/11/2013		29/11/2013		Sí	0.13
21	EJECUCIÓN:13 mallas curriculares creadas.	5-Entregables Intermedios	20/12/2013		20/12/2013		Sí	0.13
22	EJECUCIÓN:Diagnóstico inicial de la formación artística a nivel técnico y tecnológico, entregado.	4-Inicio de Trabajo	20/12/2013		20/12/2013		Sí	0.25
23	EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Sto Domingo, firmadas.	9-Entregables Formales	29/01/2014		29/01/2014		Sí	0.13
24	EJECUCIÓN: Informe de necesidad de equipamiento para 12 Institutos, definido.	9-Entregables Formales	31/01/2014		31/01/2014		Sí	0.13
25	EJECUCIÓN: Implantaciones del proyecto arquitectónico estandarizado para los Institutos, subidas al portal de compras públicas, Realizado.	9-Entregables Formales	24/02/2014		24/02/2014		Sí	0.25
26	EJECUCIÓN: Informe de 10 Carreras presentadas al CES, entregado.	9-Entregables Formales	27/02/2014		27/02/2014		Sí	0.25
27	EJECUCIÓN: Informe de 7 Carreras presentadas al CES, entregado.	9-Entregables Formales	15/03/2014		15/03/2014		Sí	0.25
28	EJECUCIÓN: Informe de 13 Carreras presentadas al CES, Realizado.	9-Entregables Formales	15/04/2014		15/04/2014		Sí	0.25
29	EJECUCIÓN: Productos de las implantaciones, validadas por la SENESCYT, Realizado.	9-Entregables Formales	15/04/2014		21/11/2014		Sí	0.25
30	EJECUCIÓN: Constucción del Instituto Superior Tecnológico en Santo Domingo, iniciada.	9-Entregables Formales	15/05/2014		15/10/2014		Sí	0.25
31	EJECUCIÓN: Equipamiento para 10 carreras, definido.	9-Entregables Formales	15/05/2014		15/12/2014		Sí	0.25
32	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos para construcción al SECOB, realizada.	9-Entregables Formales	03/06/2014		15/08/2014		Sí	0.5
33	EJECUCIÓN: Equipamiento para 7 carreras, definido.	9-Entregables Formales	21/06/2014		15/12/2014		Sí	0.25
34	EJECUCIÓN: Delegación a Secob para la contratación de la construcción del IST de Guayquill en el Plan Masa, Realizado.	9-Entregables Formales	25/07/2014		24/07/2014		Sí	0.25
35	EJECUCIÓN: Informe de avance de la construcción de Institutos, entregado.	9-Entregables Formales	28/08/2014		27/11/2014		Sí	0.25
36	EJECUCIÓN: Informe de la nueva oferta académica, realizado.	9-Entregables Formales	28/08/2014		29/09/2014		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
37	EJECUCIÓN: 3 Convenios firmados con empresas interesadas en acoger estudiantes en las carreras, Mecatrónica Automotriz, Logística de Almacenamiento y Distribución y Desarrollo de Software, firmados	9-Entregables Formales	31/08/2014		04/11/2014		Sí	0.5
38	EJECUCIÓN: Clases de nivelación de las carreras aprobadas por el CES , iniciadas.	9-Entregables Formales	30/09/2014		27/11/2014		Sí	0.75
39	EJECUCIÓN: Mobiliario para el Instituto de Patrimonio en Quito, adquirido.	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		30/12/2014		Sí	0.5
40	EJECUCIÓN: Equipamiento para institutos constuidos por otras Carteras de Estado, adquirido.	9-Entregables Formales	28/11/2014		27/11/2014		Sí	0.5
41	EJECUCIÓN: Primera fase de remodelación del Instituto de Turismo y Patrimonio, entregada.	9-Entregables Formales	28/11/2014		31/12/2014		Sí	0.75
42	EJECUCIÓN: Informe de avance de la construcción de Institutos, entregado.	9-Entregables Formales	10/12/2014		27/11/2014		Sí	0.5
43	EJECUCIÓN: Productos de las implantaciones para los Institutos a construirse en el 2015, validadas por la SENESCYT, Realizado.	9-Entregables Formales	10/12/2014		10/12/2014		Sí	0.5
44	EJECUCION: Convenios firmados con entidades receptoras para 11 carreras aprobadas y 17 carreras en proceso de aprobación, firmados.	9-Entregables Formales	15/12/2014		15/12/2014		Sí	0.5
45	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Cotacachi, iniciada.	9-Entregables Formales	15/01/2015		26/01/2015		Sí	0.75
46	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Latacunga, iniciada.	9-Entregables Formales	15/01/2015		27/01/2015		Sí	0.13
47	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Urququí, iniciada.	9-Entregables Formales	15/01/2015		26/01/2015		Sí	0.88
48	EJECUCIÓN: Consecución de cartas de intención para la formación dual de carreras en proceso de aprobación en el CES	9-Entregables Formales	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.25
49	EJECUCIÓN: Readecuación del Instituto Superior Tecnológico en Vilcabamba, iniciada.	9-Entregables Formales	15/03/2015		15/03/2015		Sí	0.88
50	EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Guamote, firmadas.	9-Entregables Formales	29/05/2015		29/05/2015		Sí	0.25
51	EJECUCIÓN: Convenios firmados con empresas interesadas en acoger	9-Entregables Formales	15/06/2015		15/06/2015		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	estudiantes en la carrera de Guianza Turística, firmados							
52	EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Cotacachi, firmadas.	9-Entregables Formales	15/06/2015		15/06/2015		Sí	0.25
53	EJECUCIÓN: Clases de nivelación de nueva oferta académica período 1/2015, Iniciadas	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.5
54	EJECUCIÓN: Términos de referencia para la adquisición de equipamiento para las carreras priorizadas en el 2015, elaborados	9-Entregables Formales	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.5
55	EJECUCIÓN: Términos de referencia para la adquisición de mobiliario para los institutos priorizados 2015, elaborados	9-Entregables Formales	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.25
56	EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el Instituto Tecnológico de Cuenca, adjudicada	9-Entregables Formales	30/09/2015		30/10/2015		Sí	1.25
57	EJECUCIÓN: Comisiones Nacionales de Carrera CNCs para carreras con inicio de clases en periodo académico Marzo/Abril 2015, conformadas	9-Entregables Formales	30/10/2015		30/12/2015		Sí	0.5
58	EJECUCIÓN: Convenios con entidades receptoras para la formación dual de carreras que inician actividad académica en periodo Sept./Oct. 2015, firmados	9-Entregables Formales	30/10/2015		30/10/2015		Sí	0.5
59	EJECUCIÓN: Ferias de socialización y sensibilización para incremento de la matrícula en formación técnica y tecnológica, realizadas	9-Entregables Formales	06/11/2015		06/11/2015		Sí	0.13
60	EJECUCIÓN: Informe de avance de construcciones de Institutos, elaborado	9-Entregables Formales	15/12/2015		15/12/2015		Sí	0.0
61	EJECUCIÓN: Informe de validación de implantaciones en planes masa, elaborado	9-Entregables Formales	15/12/2015		15/12/2015		Sí	0.25
62	EJECUCIÓN: Vinculación de 10 Prometeos/Ateneos para Institutos Superiores Tecnológicos, cancelado	9-Entregables Formales	15/12/2015		15/12/2015		Sí	0.25
63	EJECUCIÓN: Construcción del instituto territorial Cotopaxi Latacunga, concluida	5-Entregables Intermedios	29/01/2016		29/01/2016		Sí	0.8
64	EJECUCIÓN: Planificación operativa anual de acuerdo al PAI aprobado 2016	5-Entregables Intermedios	29/01/2016		29/01/2016		Sí	0.03
65	EJECUCIÓN: Aprobación de la actualización del dictamen de prioridad del proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador	5-Entregables Intermedios	26/02/2016	26/02/2016			No	2.0
66	EJECUCIÓN: Informe de los valores de arrastre y de obras	5-Entregables Intermedios	26/02/2016	26/02/2016			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	complementarias para concluir la construcción o readecuación de los institutos superiores en Cotacachi, Vilcabamba, Urcuquí, Santo Domingo, Quito							
67	EJECUCIÓN: Fiscalización de la readecuación del instituto superior tecnológico en Azogues, adjudicada	5-Entregables Intermedios	25/03/2016	25/03/2016			No	0.8
68	EJECUCIÓN: Readecuación del instituto superior tecnológico en Azogues, adjudicada	5-Entregables Intermedios	25/03/2016	25/03/2016			No	0.8
69	EJECUCIÓN: Doce nuevas carreras revisadas por el CES a ser implementadas en los institutos de educación superior, aprobadas	9-Entregables Formales	30/03/2016	30/03/2016			No	0.0
70	EJECUCIÓN: Comisiones Nacionales de Carrera CNCs para carreras con inicio de clases en periodo académico Sept./Oct. 2015, conformadas	9-Entregables Formales	31/03/2016	31/03/2016			No	0.0
71	EJECUCIÓN: Readecuación del Instituto Superior Tecnológico en Azogues, iniciada.	9-Entregables Formales	31/03/2016	31/03/2016			No	0.0
72	EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el instituto tecnológico de Ambato, adjudicada	5-Entregables Intermedios	29/04/2016	29/04/2016			No	0.8
73	EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Esmeraldas, firmadas.	5-Entregables Intermedios	29/04/2016	29/04/2016			No	0.8
74	EJECUCIÓN: Construcción del instituto territorial Imbabura Urcuquí, entregada	5-Entregables Intermedios	27/05/2016	27/05/2016			No	0.8
75	EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el instituto tecnológico de Esmeraldas, adjudicada	5-Entregables Intermedios	27/05/2016	27/05/2016			No	0.8
76	EJECUCIÓN: Construcción del instituto sectorial en logística y transporte santo domingo de los Tsachilas Santo Domingo, entregada	5-Entregables Intermedios	24/06/2016	24/06/2016			No	0.8
77	EJECUCIÓN: Readecuación del instituto sectorial en patrimonio y turismo Pichincha Quito, entregada	5-Entregables Intermedios	24/06/2016	24/06/2016			No	0.8
78	EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Esmeraldas, firmadas.	9-Entregables Formales	30/06/2016	30/06/2016			No	0.0
79	EJECUCIÓN: Concursos de méritos y oposición para Rectores de Institutos Superiores Tecnológicos Públicos, iniciados	9-Entregables Formales	29/07/2016	29/07/2016			No	0.0
80	EJECUCIÓN: Equipamiento del instituto ubicado en Vilcabamba, instalado	5-Entregables Intermedios	29/07/2016	29/07/2016			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
81	EJECUCIÓN: Términos de referencia para la adquisición de equipamiento para nuevos institutos, preparados	5-Entregables Intermedios	29/07/2016	29/07/2016			No	0.03
82	EJECUCIÓN: Construcción del instituto territorial con especialización en textil y cuero Imbabura Cotacachi, entregada	5-Entregables Intermedios	26/08/2016	26/08/2016			No	0.8
83	EJECUCIÓN: Escrituras del terrenos de Riobamba, firmadas.	5-Entregables Intermedios	26/08/2016	26/08/2016			No	0.5
84	EJECUCIÓN: Readeacuación del instituto territorial con especialización en petróleos Sucumbios Lago Agrio, iniciada	5-Entregables Intermedios	26/08/2016	26/08/2016			No	0.8
85	EJECUCIÓN: Escrituras del terrenos de Riobamba, firmadas.	9-Entregables Formales	31/08/2016	31/08/2016			No	0.0
86	EJECUCIÓN: Construcción del instituto sectorial agropecuario Los Rios , Quevedo, iniciada	5-Entregables Intermedios	29/09/2016	29/09/2016			No	0.8
87	EJECUCIÓN: Construcción del instituto territorial con especialización en servicios portuarios El Oro Machala, iniciada	5-Entregables Intermedios	29/09/2016	29/09/2016			No	0.8
88	EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Machala, firmadas.	5-Entregables Intermedios	30/09/2016	30/09/2016			No	0.5
89	EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Ambato, firmadas.	5-Entregables Intermedios	28/10/2016	28/10/2016			No	0.5
90	EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Montufar, firmadas.	5-Entregables Intermedios	28/10/2016	28/10/2016			No	0.5
91	EJECUCIÓN: Escrituras del terreno del Pangui, firmadas.	5-Entregables Intermedios	28/10/2016	28/10/2016			No	0.5
92	EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Montúfar, firmadas.	9-Entregables Formales	31/10/2016	31/10/2016			No	0.0
93	EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Ambato, firmadas.	9-Entregables Formales	31/10/2016	31/10/2016			No	0.0
94	EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Machala, firmadas.	9-Entregables Formales	31/10/2016	31/10/2016			No	0.0
95	EJECUCIÓN: Diez nuevas carreras revisadas por el ces a ser implementadas en los institutos de Educación Superior, aprobadas	5-Entregables Intermedios	25/11/2016	25/11/2016			No	0.5
96	EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Quito sur, firmadas.	5-Entregables Intermedios	25/11/2016	25/11/2016			No	0.5
97	EJECUCIÓN: Equipamiento de los institutos ubicados en Latacunga, Santo Domingo, Cotacachi, Quito, instalado	5-Entregables Intermedios	15/12/2016	15/12/2016			No	0.5
98	EJECUCIÓN: Informe de avance de construcciones de institutos, elaborado	5-Entregables Intermedios	15/12/2016	15/12/2016			No	0.03
99	EJECUCIÓN: Avance fisco 2017	5-Entregables Intermedios	01/01/2017	01/01/2017			No	11.0
100	EJECUCIÓN: Avance fisco 2018	5-Entregables Intermedios	01/01/2018	01/01/2018			No	12.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
101	EJECUCIÓN: Avance físico 2019	5-Entregables Intermedios	01/01/2019	01/01/2019			No	10.49
102	CIERRE: Informe de Cierre	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2019	31/12/2019			No	10.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	PROYECTO NO SE RECIBIO RESPUESTA EN EL CANTON SAN MIGUEL	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	22/02/2016
2	PROYECTO NO SE RECIBIO RESPUESTA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	30/01/2016
3	Supervisión Negativa no se ha podido verificar la ejecución del proyecto en Morona Santiago	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	12/01/2016
4	Verificación Reconversión de la Educación	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	30/12/2015
5	Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador.	Pabón Caranqui, Paola Verenice	{PR} - Provincia - PICHINCHA	30/11/2015
6	red de Investigación marina con instituciones como UPSE, SEC.TEC MAR, FUERZAS ARMADAS,ESPOL, UTMANABI, INST OCEANOGRAFICO ARMADA,CAMARA PESQUERIA GYE	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	28/08/2015
7	Supervisión Negativa no se a podido verificar los avances del proyecto en Morona Santiago de acuerdo a los hitos 53	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	28/08/2015
8	Supervision satisfactoria al Proyecto y su ejecución	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	27/07/2015
9	GOBERNADOR	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	28/05/2015
10	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	28/04/2015
11	APLICACIÓN RECONVERSION EDUCACION TÉCNICA	Torres Pallo, Jorge	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	24/12/2014
12	Supervisión del proyecto	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	31/10/2014
13	Supervisión del Proyecto	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	18/03/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Periodo	Meta	Resultado del Periodo	Fecha de Inicio	Último Periodo Actualizado
1	Porcentaje de avance en obra del Instituto Tecnológico Superior en Santo Domingo		-	-	-	01/01/2015	-
2	Porcentaje de avance en obra del Instituto Tecnológico Superior en Quito		-	-	-	01/01/2015	-
3	Porcentaje de avance en obra del Instituto Tecnológico Superior en Latagunga		-	-	-	01/01/2015	-
4	Número de Construcciones iniciadas en el año 2016		-	-	-	01/01/2015	-
5	Porcentaje de avance en obra del Instituto Tecnológico Superior en Cotacachi		96.73 %	0.49	0.474	01/01/2016	Enero


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	28,700.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	28,981,656.44 **
Costo Total:	308,483,239.35
Total Devengado:	15,160,847.57
% Costo Total Devengado:	4.91 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 4.91 %

Perfil Económico 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	30,239,958.19	0.00	0.00	30,239,958.19
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	60,239,958.19	9,993,469.07	0.00	70,233,427.26
Ppto. Codificado	21,487,960.43	13,842,885.76	0.00	35,330,846.19
Ppto. Comprometido	15,476,917.87	96,951.25	0.00	15,573,869.12
Planeado - Codificado (2016)		-13,842,885.76		
Programado a Devengar	35,689,110.06	13,917,760.12	0.00	49,606,870.18
Ppto. Devengado	15,063,896.32	96,951.25	0.00	15,160,847.57
Estimado a fin de año	* 15,063,896.32	0.00	0.00	15,063,896.32
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	20,625,213.74	13,917,760.12	0.00	34,542,973.86
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 42.21 %	0.70 %	0.00 %	30.56 %
Ppto. Codificado 998	67,799.99	0.00	0.00	67,799.99
Ppto. Devengado 998	67,799.99	0.00	0.00	67,799.99



* Ppto. Devengado

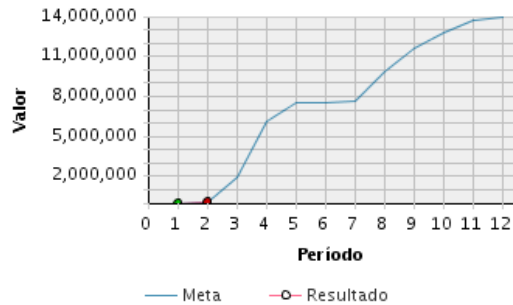PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016



Presupuesto Mensual 2016

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	50,130.66	96,951.25	50,130.66	96,951.25	193.40 %		0.70 %
Mar	1,848,865.69		1,898,996.35				
Abr	4,174,168.03		6,073,164.38				
May	1,433,532.10		7,506,696.48				
Jun	68,629.17		7,575,325.65				
Jul	104,946.29		7,680,271.94				
Ago	2,198,205.87		9,878,477.81				
Sep	1,749,342.88		11,627,820.69				
Oct	1,098,698.01		12,726,518.70				
Nov	1,004,216.38		13,730,735.08				
Dic	187,025.04		13,917,760.12				
Total	13,917,760.12	96,951.25					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
6	Incrementar la capacidad de gestión del Sistema de Educación Superior Público de nivel Técnico y Tecnológico a nivel nacional MEDIANTE, el proyecto de reconversión de la educación superior publica de nivel técnico y tecnológico y conformación de Entidades Operativas Descentralizadas - EOD's.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1. ASOCIACIÓN HITO 1 - Proyecto SENPLADES	A.1.pdf	14/11/2013
2	A2. ASOCIACIÓN HITO 2 - Dictamen SENPLADES	A.2.pdf	14/11/2013
3	A3. ASOCIACIÓN HITO 5 - Sistema de Rendición de Cuentas	A.3.docx	14/11/2013
4	A4. ASOCIACIÓN HITO 6 - Demanda posible para cada instituto	A.4.docx	14/11/2013
5	A5. ASOCIACIÓN HITO 7 - Convenio específico firmado con ICO	A.5.PDF	14/11/2013
6	A6. ASOCIACIÓN HITO 9 - Plan de consultoría-equipamiento	A.6.pptx	15/11/2013
7	A7. ASOCIACIÓN HITO 10 - Sistematización de talleres	A.7.docx	15/11/2013
8	A8. ASOCIACIÓN HITO 10- Sistematización de talleres	A.8.docx	15/11/2013
9	A9. ASOCIACIÓN HITO 11 - Replanificación proyecto	A.9.doc	15/11/2013
10	B1. ASOCIACIÓN HITO 14 - Especificaciones técnicas	B.1.pptx	15/11/2013
11	B2. ASOCIACIÓN HITO 17 - Carrera Desarrollo Integral Infantil	B.2.docx	15/11/2013
12	B3. ASOCIACIÓN HITO 17 - Entrega de DII al CES	B.3.PDF	15/11/2013
13	B4. ASOCIACIÓN HITO 20- Identificación de Carreras	B.4.PDF	03/12/2013
14	B5. ASOCIACIÓN HITO 23- Escrituras del terreno de Sto. Domingo, firmadas	B.5.pdf	05/05/2014
15	B6. ASOCIACIÓN HITO 24- Informe de necesidad de equipamiento para 12 Institutos, definido	B.6.pdf	05/05/2014
16	B7. ASOCIACIÓN HITO 26- 10 Carreras presentadas al CES	B.7.docx	05/05/2014
17	B8. ASOCIACIÓN HITO 27- Informe de 7 Carreras presentadas al CES, entregado.	B.8.pdf	05/05/2014
18	B9. ASOCIACIÓN HITO 25-Implantaciones del proyecto arquitectónico estandarizado para los Institutos, subidas al portal de compras públicas.	B.9.pdf	05/05/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
19	C.1 ASOCIACIÓN HITO 1: Oficio validación MCCTH	C.1.pdf	28/02/2014
20	C2. ASOCIACIÓN HITO 28- 13 Carreras presentadas al CES	C.2.docx	07/03/2014
21	C3. Reporte Ejecución e-SIGEF febrero-resumen 2014	C.3.pdf	05/05/2014
22	C4. Reporte Ejecución e-SIGEF febrero 2014	C.4.pdf	25/03/2014
23	C5. ASOCIACIÓN HITOS 18, 20 24: Autorización para replanificar hitos	C.5.PDF	04/04/2014
24	C5. ASOCIACIÓN HITOS 18, 20 24: Autorización para replanificar hitos	C.5.png	04/04/2014
25	C6. Reporte e-SIGEF marzo 2014	C.6.pdf	07/04/2014
26	C7. Reporte e-SIGEF mes de abril 2014	C.7.pdf	03/06/2014
27	C8. Reporte e-sigef mes de mayo 2014	C.8.pdf	05/06/2014
28	C9. ASOCIACIÓN HITO 34- Delegación a Secob para la contratación de la construcción del IST de Guayquill en el Plan Masa	C.9.pdf	24/07/2014
29	D1. Reporte e-sigef mes de junio 2014	D.1..pdf	31/07/2014
30	D2. Reporte e-sigef mes de Julio 2014	D.2.pdf	31/07/2014
31	D3. Reporte e-sigef mes de Agosto 2014	D.3.pdf	02/09/2014
32	D4. ASOCIACIÓN HITO 32- Transferencia de recursos para construcción al SECOB, realizada.	D.4.pdf	23/09/2014
33	D5. ASOCIACIÓN HITO 36- EJECUCIÓN: Informe de la nueva oferta académica, realizado.	D.5.pdf	29/09/2014
34	D6. Reporte e-sigef mes de Septiembre 2014	D6..pdf	02/10/2014
35	D7. ASOCIACIÓN HITO 30.- EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Santo Domingo, iniciada.	D.7.pdf	15/10/2014
36	D8. Reporte e-sigef mes de octubre 2014	D8..pdf	04/11/2014
37	D9. ASOCIACIÓN HITO 37.- EJECUCIÓN: 3 Convenios firmados con empresas interesadas en acoger estudiantes en las carreras, Mecatrónica Automotriz, Logística de Almacenamiento y Distribución y Desarrollo de Software, firmados.	D9.pdf	04/11/2014
38	E1. ASOCIACIÓN HITO 35 EJECUCIÓN: Informe de avance de la construcción de Institutos, entregado.	E.1.pdf	27/11/2014
39	E2. ASOCIACIÓN HITO 29 EJECUCIÓN: Productos de las implantaciones, validadas por la SENESCYT, Realizado.	E.2.pdf	27/11/2014
40	E3. ASOCIACIÓN HITO 40 EJECUCIÓN: Equipamiento para institutos construidos por otras Carteras de Estado, adquirido.	E.3.pdf	27/11/2014
41	E4. ASOCIACIÓN HITO 42 EJECUCIÓN: Informe de avance de la construcción de Institutos, entregado.	E.4.pdf	27/11/2014
42	E5. ASOCIACIÓN HITO 38 EJECUCIÓN: Clases de nivelación de las carreras aprobadas por el CES , iniciadas.	E.5.pdf	01/12/2014
43	E6 Reporte e-sigef mes de Noviembre 2014	E.6.pdf	01/12/2014
44	E7. ASOCIACIÓN AL HITO 43 EJECUCIÓN: Productos de las implantaciones para los Institutoras a construirse en el 2015, validadas por la SENESCYT, Realizado	E7.pdf	10/03/2015
45	E8. ASOCIACIÓN AL HITO 43 EJECUCIÓN: Productos de las implantaciones para los Institutoras a construirse en el 2015, validadas por la SENESCYT, Realizado	E8.pdf	15/12/2014
46	E9. ASOCIACIÓN AL HITO 43 EJECUCIÓN: Productos de las implantaciones para los Institutoras a construirse en el 2015, validadas por la SENESCYT, Realizado	E9.pdf	15/12/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
47	F1. ASOCIACIÓN AL HITO 43 EJECUCIÓN: Productos de las implantaciones para los Institutoras a construirse en el 2015, validadas por la SENESCYT, Realizado	F1.pdf	15/12/2014
48	F2. ASOCIACIÓN A LOS HITOS 31 EJECUCIÓN: Equipamiento para 10 carreras, definido y 33 EJECUCIÓN: Equipamiento para 7 carreras, definido	F2.pdf	15/12/2014
49	F3. ASOCIACIÓN HITO 44 EJECUCION: Convenios firmados con entidades receptoras para 11 carreras aprobadas y 17 carreras en proceso de aprobación, firmados.	F3.pdf	16/12/2014
50	F4. ASOCIACIÓN HITO 39 EJECUCIÓN: Mobiliario para el Instituto de Patrimonio en Quito, adquirido.	F4.pdf	30/12/2014
51	F5. ASOCIACIÓN HITO 41 EJECUCIÓN: Primera fase de remodelación del Instituto de Turismo y Patrimonio, entregada.	F5.pdf	31/12/2014
52	F6. Reporte e-sigef mes de Diciembre 2014	F6..pdf	05/01/2015
53	F7. ASOCIACIÓN HITO 47 EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Urcuquí, iniciada.	F.7.PDF	26/01/2015
54	F8. ASOCIACIÓN HITO 45 EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Cotacachi, iniciada.	F.8.pdf	26/01/2015
55	F9. ASOCIACIÓN HITO 46 EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Latacunga, iniciada.	F.9.PDF	27/01/2015
56	G1. Reporte e-sigef mes de Enero 2015	G1..pdf	05/02/2015
57	G2. ASOCIACIÓN HITO 48 EJECUCIÓN: Consecución de cartas de intención para la formación dual de carreras en proceso de aprobación en el CES	G2..pdf	28/02/2015
58	G3. Reporte e-sigef mes de Febrero 2015	G3.pdf	28/02/2015
59	G4. ASOCIACIÓN HITO 49.- EJECUCIÓN: Readecuación del Instituto Superior Tecnológico en Vilcabamba, iniciada.	G4..pdf	16/03/2015
60	G5. Reporte e-SIGEF Marzo 2015	G5.pdf	30/03/2015
61	G6. Reporte e-SIGEF Abril 2015	G6.pdf	30/04/2015
62	G7. ASOCIACIÓN HITO 50-EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Guamote, firmadas.	G7.pdf	29/05/2015
63	G8. Reporte e-SIGEF Mayo 2015	G8.pdf	04/06/2015
64	G9. ASOCIACIÓN HITO 51.-EJECUCIÓN: Convenios firmados con empresas interesadas en acoger estudiantes en la carrera de Guianza Turística, firmados	G9.pdf	15/06/2015
65	H1. ASOCIACIÓN HITO 52.- EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Cotacachi, firmadas.	H1.pdf	15/06/2015
66	H2. ASOCIACIÓN HITO 53.-EJECUCIÓN: Clases de nivelación de nueva oferta académica período 1/2015, Iniciadas	H2.pdf	30/06/2015
67	H3. Reporte e-SIGEF Junio 2015	H3.pdf	02/07/2015
68	H4. Reporte e-SIGEF Julio 2015	H4.pdf	05/08/2015
69	H5. ASOCIACIÓN HITO 56.- EJECUCIÓN: Términos de referencia para la adquisición de equipamiento para las carreras priorizadas en el 2015, elaborados	H5.pdf	04/09/2015
70	H6. ASOCIACIÓN HITO 56.- EJECUCIÓN: Términos de referencia para la adquisición de equipamiento para las carreras priorizadas en el 2015, elaborados	H6.pdf	04/09/2015
71	H7. ASOCIACIÓN HITO 56.- EJECUCIÓN: Términos de referencia para la adquisición de equipamiento para las carreras priorizadas en el 2015, elaborados	H7.pdf	04/09/2015
72	H8. ASOCIACIÓN HITO 57.- EJECUCIÓN: Términos de referencia para la adquisición de mobiliario para los institutos priorizados 2015, elaborados	H8.pdf	04/09/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
73	H9. Asociación Hito 58. Consultoría de implantación para el Instituto Tecnológico de Cuenca, adjudicada	H9.pdf	04/11/2015
74	I1. Asociación Hito 64. Convenios con entidades receptoras para la formación dual de carreras que inician actividad académica en periodo Sept./Oct. 2015, firmados	I1.pdf	04/11/2015
75	I2. Asociación Hito 67.- EJECUCIÓN: Ferias de socialización y sensibilización para incremento de la matrícula en formación técnica y tecnológica, realizadas	I2.pdf	07/12/2015
76	I3 ASOCIACIÓN HITO 62 EJECUCIÓN: Comisiones Nacionales de Carrera CNCs para carreras con inicio de clases en periodo académico Marzo/Abril 2015, conformadas	I3.pdf	30/12/2015
77	I4 ASOCIACION HITO 68 EJECUCIÓN: Informe de avance de construcciones de Institutos, elaborado	I4.pdf	31/12/2015
78	I5 ASOCIACION HITO 69 EJECUCIÓN: Informe de validación de implantaciones en planes masa, elaborado	I5.pdf	30/12/2015
79	I6: ASOCIACIÓN HITO 63 EJECUCIÓN: Construcción del instituto territorial Cotopaxi Latacunga, concluida	I6.pdf	05/02/2016
80	I7: ASOCIACIÓN HITO 64 EJECUCIÓN: Construcción del instituto territorial Cotopaxi Latacunga, concluida	I7.pdf	05/02/2016

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Calipsa Santos, Edgar Iván	Analista de Equipamiento 4	Coordinador de Equipamiento, Proyecto de Reconversión	ecalispa@senescyt.gob.ec	
Miño Granda, Jessica Paola	Analista Administrativo-Financiero 4,	Coordinadora Administrativa Financiera, Proyecto de Reconversión	jmino@senescyt.gob.ec	
Mora Orellana, Milton Oswaldo	Analista de Equipamiento 4	Coordinador de Infraestructura, Proyecto de Reconversión	momora@senescyt.gob.ec	
Reinoso Hidalgo, Juan Fernando	Gerente del Proyecto (E)	Gerente (E) proyecto Reconversión	jreinoso@senescyt.gob .ec	
Romero Vaca, Sofía Elizabeth	Analista de Soporte Legal y Jurídico 4	Analista de Soporte Legal y Jurídico 4	seromero@senescyt.gob.ec	
