

SENESCYT - Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Subsecretaría de Formación Académica y Profesional
PROYECTO: K004 PROYECTO DE EXCELENCIA

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto: | Cuji Llugna, Luis Fernando (lcuji@senescyt.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Ramírez Gallegos, René Alberto | Programas Relacionados: | PROYECTO DE EXCELENCIA |
| Titular: | Cuji Llugna, Luis Fernando | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Procesos | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 091590000.0000.376139 | TIR: | 13.00 % |
| Objetivos Operativos: | 8 | VAN: | 83,279.64 |
| Viabilidad Técnica: | Media | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 6,085,423.07 |
| Localidad de Gestión: | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2013 - 31/12/2017 |
| Fecha de última actualización: | 11/04/2017 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2014 |
| Modificado por: | Martínez Chevez, Mayra Elizabeth | Fecha del siguiente Hito: | 28/04/2017 |

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

DATOS GENERALES

Descripción

Fortalecer y mejorar las capacidades de gestión académica, investigativa, de vinculación con la colectividad y administrativa-financiera de las universidades y escuelas politécnicas públicas de calidad, para instalar procesos de mejora continua de la educación superior, que responda a los objetivos estratégicos nacionales y territoriales con perspectiva de acreditación internacional.

Beneficios Cualitativos

Información en proceso de actualización

Tipo de Beneficiario

Información en proceso de actualización


Restricciones

Proyecto dirigido a 7 Universidades de Calidad

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO






Transcurrido: 86.36 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2017

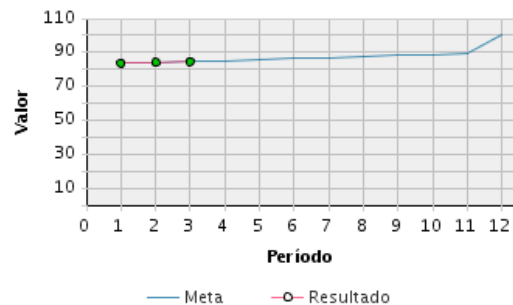AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance

| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2017 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 83 % | 84 % | 85 % | 85 % | 86 % | 86 % | 87 % | 88 % | 88 % | 89 % | 89 % | 100 % |

| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 83 % | 84 % | 85 % | | | | | | | | | |
| | Estado | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  | | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| <p>MARZO 2017</p> <p>Durante el mes de marzo de 2017 se cumplieron dos de los hitos programados. Hito 35 Informe de avance de obra ESPE Santo Domingo, elaborado; e, Hito 36 Informe de avance de obra ESPOCH Macas, elaborado.</p> <p>Se realizaron las siguientes actividades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Monitoreo y seguimiento semanal de avance de obra de construcción de la FASE I-A de la futura Sede de la UFA ESPE en Santo Domingo de los Tsáchilas. Asociación hito 35 2.Monitoreo y seguimiento semanal de avance de obra de remodelación y mantenimiento de la Extensión de Morona Santiago de la ESPOCH. Asociación hito 36 3.Elaboración de Informe de avance de obra ESPE Santo Domingo. Asociación hito 35. 4.Elaboración de informe de avance de obra ESPOCH Macas. Asociación hito 36. 5.Revisión y aprobación de Informe de avance de obra ESPE Santo Domingo. Asociación hito 35. 6.Revisión y aprobación de informe de avance de obra ESPOCH Macas. Asociación hito 36. 7. Reuniones técnicas para la generación de programas de posgrado conjuntos el 7, 8, 13, 22, y 28 de abril de 2017 con la UTA, UCE y AECID. <p>Adicionalmente se realizaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Actualización del Proyecto de Excelencia en el SIPeIP 2.Organización y logística de charla académica en Macas, el 14/03/ 2017 3.Organización y logística para recorrido de obra de la Extensión de Morona Santiago de la ESPOCH por parte de la Subsecretaría General de Educación Superior, realizada el 14/03/2017 4.Elaboración de insumos: ayuda memoria, fichas técnicas y líneas argumentales para el recorrido de obra de la Extensión de Morona Santiago de la ESPOCH 5.Elaboración de informe de ejecución del Proyecto de Excelencia para incorporarse en el informe de rendición de cuentas de la institución. 6.Apoyo en organización y logística de charla académica en la Universidad Técnica de Ambato, realizada el 21/03/2017 7.Realización de video conferencia para coordinación de publicación de libro, en el marco del trabajo de acompañamiento de redes académicas, el 15/03/2017 8.Reunión del núcleo de la RESG, realizada en el marco del acompañamiento a redes académicas, el 24/03/2017 9. Reunión para implementación del programa de posgrado conjunto en producción alimentaria el 8/03/2017 10. Reunión para revisión de presupuesto del programa de posgrado conjunto en producción alimentaria el 28/03/2017 | Espinoza Castro, Silvia Valeria | 10/04/2017 - 10:49 AM |
| <p>FEBRERO 2017</p> <p>Durante el mes de febrero de 2017 se cumplieron dos de los hitos programados. Hito 33 Lineamientos de respuesta al acoso sexual en Pichincha, en el marco del plan de acompañamiento a redes, socializado; e, Hito 34; y, Lineamientos de respuesta al acoso sexual, en Provincias, en el marco del plan de acompañamiento a redes, socializado.</p> <p>Se realizaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Actualización de base de contactos de IES de Pichincha que pertenecen a la Red de Educación Superior y Género (RESG) . Asociación hito 33 2.Actualización de base de contactos de IES de Provincia que pertenecen a la RESG. Asociación hito 34 3.Generación del oficio para socializar los Lineamientos de respuesta al acoso sexual a IES que pertenecen a la RESG de Pichincha. Asociación al hito 33 4.Envío de oficio N° SENESCYT-SFA-2017-0116-O, a 10 instituciones de educación superior de Pichincha que pertenecen a la RESG, a través de Correos del Ecuador. Asociación hito 33 5.Envío de oficio N° SENESCYT-SFA-2017-0116-O, a 25 instituciones de educación superior de Pichincha que pertenecen a la RESG, a través de Correos del Ecuador. Asociación hito 34 | Espinoza Castro, Silvia Valeria | 08/03/2017 - 05:33 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
| <p>6.Envío de "Lineamientos generales para la respuesta al acoso sexual y otras formas de violencia basada en género en las instituciones de educación superior en el Ecuador", a las IES de Pichincha, que integran la RESG, a través de correo electrónico. Asociación hito 33</p> <p>7.Envío de "Lineamientos generales para la respuesta al acoso sexual y otras formas de violencia basada en género en las instituciones de educación superior en el Ecuador", a las IES de 13 provincias, que integran la RESG, a través de correo electrónico. Asociación hito 34</p> <p>8.Elaboración de informe de la socialización de los "Lineamientos generales para la respuesta al acoso sexual y otras formas de violencia basada en género en las instituciones de educación superior en el Ecuador", a IES de Pichincha. Asociación hito 33</p> <p>9.Elaboración de informe de la socialización de los "Lineamientos generales para la respuesta al acoso sexual y otras formas de violencia basada en género en las instituciones de educación superior en el Ecuador", a IES de 13 provincias. Asociación hito 34</p> <p>Adicionalmente se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>1.Seguimiento semanal al avance de la obra de construcción de la Fase I-A de la futura sede de la UFA ESPE en Santo Domingo de los Tsáchilas.</p> <p>2.Seguimiento semanal al avance de la obra de reapertura de la extensión de Morona Santiago de la ESPOCH.</p> <p>3.Inspección in-situ obra de construcción de la Fase I-A de la futura sede de la UFA ESPE en Santo Domingo de los Tsáchilas, domingo 12 de febrero de 2017.</p> <p>4.Coordinación y logística para visita del señor Presidente a la obra de construcción de la Fase I-A de la futura sede de la UFA ESPE en Santo Domingo de los Tsáchilas, el 13 de febrero de 2017</p> <p>5.Inspección in-situ obra de construcción de reapertura de la extensión de Morona Santiago de la ESPOCH, el 24 de febrero de 2017.</p> <p>6.Coordinación y conducción de reuniones del núcleo de la RESG el 10 y 24 de febrero de 2017</p> | | |
| <p>ENERO 2017</p> <p>Durante el mes de enero de 2017 se cumplieron dos de los hitos programados. Hito 31 Definido el plan de acompañamiento a redes académicas; e, Hito 32 Informe de cumplimiento de plan de acompañamiento a redes 2016, elaborado</p> <p>Se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>1.Reunión del núcleo de la RESG para definir propuesta de trabajo para el 2017. Asociación al hito 31</p> <p>2.Elaboración del plan de acción de la RESG para el 2017. Asociación al hito 31</p> <p>3.Elaboración del plan de acompañamiento redes académicas para el año 2017. Asociación al hito 31</p> <p>4.Organización y conducción de la primera reunión ampliada de la RESG del 2017. Asociación al hito 31</p> <p>5.Actualización de datos de los representantes de las instituciones de educación superior a la RESG. Asociación hito 31</p> <p>6. Elaboración del Informe de cumplimiento al plan de acompañamiento a redes correspondiente al año 2016. Asociación al hito 32</p> <p>Adicionalmente se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>1.Seguimiento semanal al avance de la obra de construcción de la Fase I-A de la futura sede de la UFA ESPE en Santo Domingo de los Tsáchilas.</p> <p>2.Seguimiento semanal al avance de la obra de reapertura de la extensión de Morona Santiago de la ESPOCH.</p> <p>3.Elaboración de ayuda memoria de la primera reunión ampliada de la RESG</p> <p>4.Informe de acciones a favor de ciudadanos y ciudadanas LGBTI</p> <p>5.Informes de avances en la reivindicación de los derechos de la mujer</p> <p>6.Seguimiento a la ampliación del convenio de cooperación interinstitucional entre la SENESCYT y la UFA ESPE para la construcción de los laboratorios de Petroquímica de la extensión Latacunga de dicha institución</p> <p>7.Revisión de informes para aceptación de productos generados en el marco de la construcción de la Agenda 2035 de Educación Superior</p> <p>8.Seguimiento a la ejecución del proceso de construcción de programas de posgrado conjunto.</p> <p>9. En el mes de enero de 2017 no se realizaron transferencias de recursos</p> | Espinoza Castro, Silvia Valeria | 14/02/2017 - 04:35 PM |
| <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p> | Castro Arredondo, Hugo Nicanor | 10/01/2017 - 12:17 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| <p>NOVIEMBRE 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p> | Castro Arredondo, Hugo Nicanor | 08/12/2016 - 12:41 PM |
| <p>OCTUBRE 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p> | Castro Arredondo, Hugo Nicanor | 11/11/2016 - 05:01 PM |
| <p>SEPTIEMBRE 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p> | Castro Arredondo, Hugo Nicanor | 05/10/2016 - 04:19 PM |
| <p>AGOSTO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p> <p>2. Para el mes de Agosto se realizo la transferecnia a la ESPE por un monto de 5.500.000,00</p> | Castro Arredondo, Hugo Nicanor | 02/09/2016 - 09:02 AM |
| <p>JULIO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p> <p>2. Para el mes de Julio no se realizaron transferencias</p> | Castro Arredondo, Hugo Nicanor | 08/08/2016 - 04:25 PM |
| <p>JUNIO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p> | Castro Arredondo, Hugo Nicanor | 04/07/2016 - 11:57 AM |
| <p>MAYO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p> | Castro Arredondo, Hugo Nicanor | 03/06/2016 - 10:56 AM |
| <p>ABRIL 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p> | Castro Arredondo, Hugo Nicanor | 03/05/2016 - 10:29 AM |
| <p>MARZO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p> | Castro Arredondo, Hugo Nicanor | 04/04/2016 - 04:54 PM |
| <p>FEBRERO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p> | Gordillo Salinas, Mario Andrés | 02/03/2016 - 09:13 AM |
| <p>ENERO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p> | Gordillo Salinas, Mario Andrés | 16/02/2016 - 03:31 PM |
| <p>ENERO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p> | Gordillo Salinas, Mario Andrés | 05/02/2016 - 05:25 PM |
| <p>DICIEMBRE 2015</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p> | Gordillo Salinas, Mario Andrés | 29/01/2016 - 08:45 AM |
| <p>NOVIEMBRE 2015</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p> | Gordillo Salinas, Mario Andrés | 07/12/2015 - 10:05 AM |
| <p>OCTUBRE 2015.</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p> | Gordillo Salinas, Mario Andrés | 10/11/2015 - 10:23 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| SEPTIEMBRE 2015. 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia. | Gordillo Salinas, Mario Andrés | 27/10/2015 - 03:38 PM |
| AGOSTO 2015. 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia. | Gordillo Salinas, Mario Andrés | 10/09/2015 - 05:09 PM |
| JULIO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia. | Gordillo Salinas, Mario Andrés | 10/09/2015 - 05:04 PM |
| JUNIO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia. | Gordillo Salinas, Mario Andrés | 10/09/2015 - 05:04 PM |
| JUNIO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia. | Gordillo Salinas, Mario Andrés | 05/07/2015 - 09:05 PM |
| MAYO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia. | Gordillo Salinas, Mario Andrés | 08/06/2015 - 11:38 AM |
| ABRIL 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia. | Gordillo Salinas, Mario Andrés | 04/05/2015 - 09:23 AM |
| MARZO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia. | Gordillo Salinas, Mario Andrés | 04/05/2015 - 09:22 AM |
| FEBRERO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia. | Gordillo Salinas, Mario Andrés | 04/05/2015 - 09:22 AM |
| ENERO 2015 1. Se realizó la actualización del Proyecto de Inversión de Excelencia. | Gordillo Salinas, Mario Andrés | 18/02/2015 - 11:41 AM |

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|--|-------------------------------|---------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 2- NACIONAL. Económico. Retraso en pagos CAUSARÍA paralización de las obras | 25/01/2017 | Luis Fernando Cuji Llugna | 30 % | 80 | 24 | 0/1 |
| 2- NACIONAL. * General. Desintegración de redes académicas CAUSARÍA que no se cumpla con el plan de acompañamiento | 25/01/2017 | Luis Fernando Cuji Llugna | 30 % | 70 | 21 | 0/1 |

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|--|
| 1 | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | DEFINICIÓN: Equipo de trabajo Definido | 4-Inicio de Trabajo | 01/01/2013 | | 01/01/2013 | | Sí | 10.0 |
| 2 | PLANEACIÓN: Dictamen de Prioridad Aprobada | 3-Adjudicación | 02/01/2013 | | 02/01/2013 | | Sí | 10.0 |
| 3 | EJECUCIÓN: Avance Físico 2014 | 5-Entregables Intermedios | 23/12/2014 | | 23/12/2014 | | Sí | 30.0 |
| 4 | EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2015 | | 31/01/2015 | | Sí | 1.66 |
| 5 | EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2015 | | 28/02/2015 | | Sí | 1.66 |
| 6 | EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/03/2015 | | 30/03/2015 | | Sí | 1.66 |
| 7 | EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2015 | | 30/04/2015 | | Sí | 1.66 |
| 8 | EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2015 | | 30/05/2015 | | Sí | 1.66 |
| 9 | EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2015 | | 30/06/2015 | | Sí | 1.66 |
| 10 | EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/07/2015 | | 30/07/2015 | | Sí | 1.66 |
| 11 | EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/08/2015 | | 30/08/2015 | | Sí | 1.66 |
| 12 | EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2015 | | 30/09/2015 | | Sí | 1.66 |
| 13 | EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/10/2015 | | 30/10/2015 | | Sí | 1.66 |
| 14 | EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2015 | | 30/11/2015 | | Sí | 1.66 |
| 15 | EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2015 | | 30/12/2015 | | Sí | 1.66 |
| 16 | EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/01/2016 | | 30/01/2016 | | Sí | 1.0 |
| 17 | EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2016 | | 28/02/2016 | | Sí | 1.0 |
| 18 | EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado | 5-Entregables Intermedios | 01/03/2016 | | 01/03/2016 | | Sí | 1.0 |
| 19 | EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado | 5-Entregables Intermedios | 17/03/2016 | | 17/03/2016 | | Sí | 0.5 |
| 20 | EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado | 5-Entregables Intermedios | 29/04/2016 | | 29/04/2016 | | Sí | 0.5 |
| 21 | EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2016 | | 30/04/2016 | | Sí | 0.5 |
| 22 | EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado | 5-Entregables Intermedios | 29/05/2016 | | 29/05/2016 | | Sí | 0.5 |
| 23 | EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2016 | | 30/05/2016 | | Sí | 1.0 |
| 24 | EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2016 | | 30/06/2015 | | Sí | 1.0 |
| 25 | EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/07/2016 | | 30/07/2016 | | Sí | 1.0 |
| 26 | EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/08/2016 | | 30/08/2016 | | Sí | 1.0 |
| 27 | EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2016 | | 30/09/2016 | | Sí | 1.0 |
| 28 | EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/10/2016 | | 30/10/2016 | | Sí | 1.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 29 | EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2016 | | 30/11/2016 | | Sí | 1.0 |
| 30 | EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2016 | | 30/12/2016 | | Sí | 1.08 |
| 31 | EJECUCIÓN: Definido el plan de acompañamiento a Redes 2017, realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2017 | | 31/01/2017 | | Sí | 0.15 |
| 32 | EJECUCIÓN: Informe de cumplimiento de plan de acompañamiento a redes 2016, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2017 | | 31/01/2017 | | Sí | 0.29 |
| 33 | EJECUCIÓN: Lineamientos de respuesta al acoso sexual en Pichincha, en el marco del plan de acompañamiento a redes, socializado | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2017 | | 28/02/2017 | | Sí | 0.29 |
| 34 | EJECUCIÓN: Lineamientos de respuesta al acoso sexual, en Provincias, en el marco del plan de acompañamiento a redes, socializado | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2017 | | 28/02/2017 | | Sí | 0.29 |
| 35 | EJECUCIÓN: Informe de avance de obra ESPE Santo Domingo, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2017 | | 31/03/2017 | | Sí | 0.29 |
| 36 | EJECUCIÓN: Informe de avance de obra de ESPOCH MACAS, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2017 | | 31/03/2017 | | Sí | 0.29 |
| 37 | EJECUCIÓN: Entregado al CES 1 programa de posgrado conjunto en producción alimentaria para aprobación, realizado | 5-Entregables Intermedios | 28/04/2017 | 28/04/2017 | | | No | 0.29 |
| 38 | EJECUCIÓN: Finalizada infraestructura para aulas UFA ESPE Santo Domingo, realizado | 5-Entregables Intermedios | 28/04/2017 | 28/04/2017 | | | No | 0.29 |
| 39 | EJECUCIÓN: Finalizada área remodelada ESPOCH Macas, realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2017 | 31/05/2017 | | | No | 0.29 |
| 40 | EJECUCIÓN: Propuesta de programa de posgrado conjunto, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2017 | 31/05/2017 | | | No | 0.29 |
| 41 | EJECUCIÓN: Primer borrador de ponencias sobre educación superior y género para publicación, en el marco del plan de acompañamiento a redes, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2017 | 30/06/2017 | | | No | 0.29 |
| 42 | EJECUCIÓN: Reapertura extensión Macas de la ESPOCH, realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2017 | 30/06/2017 | | | No | 0.29 |
| 43 | EJECUCIÓN: Elaborada versión final de ponencias sobre educación superior y género para publicación, en el marco del plan de acompañamiento a redes, realizada | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2017 | 31/07/2017 | | | No | 0.29 |
| 44 | EJECUCIÓN: Informe de seguimiento al convenio ESPE - SENESCYT, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2017 | 31/07/2017 | | | No | 0.29 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 45 | EJECUCIÓN: Informe de seguimiento al convenio ESPOCH - SENESCYT, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2017 | 31/08/2017 | | | No | 0.29 |
| 46 | EJECUCIÓN: Plan de fortalecimiento de buenas prácticas, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2017 | 31/08/2017 | | | No | 0.29 |
| 47 | EJECUCIÓN: Ejecutada primera actividad de fortalecimiento de buenas prácticas, realizado | 5-Entregables Intermedios | 29/09/2017 | 29/09/2017 | | | No | 0.29 |
| 48 | EJECUCIÓN: Ejecutada segunda actividad de fortalecimiento de buenas prácticas, realizado | 5-Entregables Intermedios | 29/09/2017 | 29/09/2017 | | | No | 0.29 |
| 49 | EJECUCIÓN: Diseñada campaña contra la violencia a la mujer en el marco del acompañamiento a Redes, realizada | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2017 | 31/10/2017 | | | No | 0.29 |
| 50 | EJECUCIÓN: Revisada y aprobada propuesta de programa de posgrado conjunto, realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2017 | 31/10/2017 | | | No | 0.29 |
| 51 | EJECUCIÓN: Implementada campaña contra la violencia a la mujer en el marco del acompañamiento a Redes, realizado | 5-Entregables Intermedios | 20/11/2017 | 20/11/2017 | | | No | 0.3 |
| 52 | EJECUCIÓN: Implementado posgrado investigativo conjunto, realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2017 | 30/11/2017 | | | No | 0.3 |
| 53 | EJECUCIÓN: Liquidado convenio ESPE- SENESCYT, realizado | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2017 | 29/12/2017 | | | No | 0.15 |
| 54 | EJECUCIÓN: Liquidado convenio ESPOCH - SENESCYT, realizado | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2017 | 29/12/2017 | | | No | 0.3 |
| 55 | EJECUCIÓN: Definido el plan de acompañamiento a Redes 2017, realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2017 | 30/12/2017 | | | No | 0.29 |
| 56 | CIERRE: Informe de Cierre | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2017 | 31/12/2017 | | | No | 10.0 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|--|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Número de planes de acompañamiento ejecutados | | - | - | - | 01/01/2017 | - |
| 2 | Número de actividades para fortalecimiento de buenas prácticas | | - | - | - | 01/01/2017 | - |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 6,085,423.07 ** |
| Costo Total: | 65,420,690.00 |
| Total Devengado: | 6,037,173.26 |
| % Costo Total Devengado: | 9.23 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 9.23 %

Perfil Económico 2017

| | Años Previos | Año Actual (2017) | Años Futuros | Total |
|--|----------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Ppto. Planeado | 7,813,779.30 | 63,009.60 | 0.00 | 7,876,788.90 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 7,333,451.46 | 121,536.16 | 0.00 | 7,454,987.62 |
| Ppto. Codificado | 6,323,655.85 | 63,009.54 | 0.00 | 6,386,665.39 |
| Ppto. Comprometido | 6,180,501.30 | 14,759.73 | 0.00 | 6,195,261.03 |
| Planeado - Codificado (2017) | | 0.06 | | |
| Programado a Devengar | 7,743,023.88 | 63,009.54 | 0.00 | 7,806,033.42 |
| Ppto. Devengado | 6,022,413.53 | 14,759.73 | 0.00 | 6,037,173.26 |
| Estimado a fin de año | * 6,022,413.53 | 0.00 | 0.00 | 6,022,413.53 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 1,720,610.35 | 63,009.54 | 0.00 | 1,783,619.89 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 77.78 % | 23.42 % | 0.00 % | 77.34 % |
| Ppto. Codificado 998 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 |
| Ppto. Devengado 998 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 |




* Ppto. Devengado

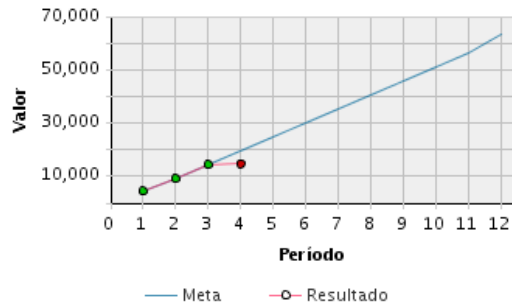PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017



Presupuesto Mensual 2017

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 4,449.62 | 4,449.62 | 4,449.62 | 4,449.62 | 100.00 % | ● | 7.06 % |

| Presupuesto Mensual 2017 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|---|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 4,783.79 | 4,783.79 | 9,233.41 | 9,233.41 | 100.00 % |  | 14.65 % |
| Mar | 5,188.28 | 5,188.28 | 14,421.69 | 14,421.69 | 100.00 % |  | 22.89 % |
| Abr | 5,313.32 | 338.04 | 19,735.01 | 14,759.73 | 74.79 % |  | 23.42 % |
| May | 5,250.80 | | 24,985.81 | | | | |
| Jun | 5,250.80 | | 30,236.61 | | | | |
| Jul | 5,250.80 | | 35,487.41 | | | | |
| Ago | 5,250.80 | | 40,738.21 | | | | |
| Sep | 5,250.80 | | 45,989.01 | | | | |
| Oct | 5,250.80 | | 51,239.81 | | | | |
| Nov | 5,250.80 | | 56,490.61 | | | | |
| Dic | 6,518.93 | | 63,009.54 | | | | |
| Total | 63,009.54 | 14,759.73 | | | |  | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|---|
| 18 | Incrementar la calidad y pertinencia de la oferta académica de posgrado nacional e internacional, MEDIANTE la elaboración de insumos técnicos que aporten a la construcción de política pública. |
| 19 | Incrementar la gestión de la Dirección de Registro de Títulos, MEDIANTE la elaboración de informes técnicos - jurídicos para otras áreas de la Secretaría y respuestas sobre títulos extranjeros a ciudadanos e instituciones |
| 20 | Incrementar la gestión de la Dirección de Grado MEDIANTE lineamientos de apoyo e informes técnicos al organismo de derecho público encargado de la planificación y regulación del funcionamiento de las entidades del Sistema de Educación Superior en lo relacionado a la formación académica y profesional de grado |
| 21 | Incrementar la gestión de la política pública para la formación académica y profesional de Grado, Mediante la elaboración de insumos técnicos para otras áreas de la Secretaría Instituciones de Educación Superior y ciudadanos en general |
| 22 | Incrementar la gestión de la política pública relacionada a las exenciones aduaneras Mediante la elaboración de informes técnicos previo requerimiento de las instituciones de educación superior. |
| 23 | Reducir el tiempo de respuesta a las solicitudes de reconocimiento y registro de títulos extranjeros y nacionales respectivamente, MEDIANTE la optimización del uso de recursos y herramientas de la dirección. |

| Objetivos Operativos Matriciales | |
|--|---|
| SENESCYT - Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación >Coordinación General de Planificación | |
| 5 | Incrementar la eficiencia de la gestión de la planificación institucional MEDIANTE la aplicación de metodologías y herramientas para la generación de planes, programas, proyectos de inversión y desconcentración territorial. |
| 7 | Incrementar la eficacia del seguimiento a planes, programas y proyectos MEDIANTE la aplicación de metodologías y herramientas de análisis de resultados para la generación de informes y respuestas a pedidos de información. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|-------------------------------------|---------|---------------|
| 1 | A1. Reporte e-SIGEF Enero 2015 | A1.pdf | 30/03/2015 |
| 2 | A2. Reporte e-SIGEF febrero 2015 | A2.pdf | 30/03/2015 |
| 3 | A3. Reporte e-SIGEF Marzo 2015 | A3.pdf | 30/03/2015 |
| 4 | A4. Reporte e-SIGEF Abril 2015 | A4.pdf | 30/04/2015 |
| 5 | A5. Reporte e-SIGEF Mayo 2015 | A5.pdf | 05/06/2015 |
| 6 | A6. Reporte e-SIGEF JUNIO 2015 | A6.pdf | 20/02/2016 |
| 7 | A7. Reporte e-SIGEF JULIO 2015 | A7.pdf | 20/02/2016 |
| 8 | A8. Reporte e-SIGEF AGOSTO 2015 | A8.pdf | 20/02/2016 |
| 9 | A9. Reporte e-SIGEF SEPTIEMBRE 2015 | A9.pdf | 20/02/2016 |
| 10 | B1. Reporte e-SIGEF OCTUBRE 2015 | B1.pdf | 20/02/2016 |
| 11 | B2. Reporte e-SIGEF NOVIEMBRE 2015 | B2.pdf | 20/02/2016 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|---------|---------------|
| 12 | B3. Reporte e-SIGEF DICIEMBRE 2015 | B3.pdf | 20/02/2016 |
| 13 | B4. Reporte e-SIGEF ENERO 2016 | B4.pdf | 20/02/2016 |
| 14 | B5. Reporte e-SIGEF FEBRERO 2016 | B5.pdf | 02/03/2016 |
| 15 | B6. Reporte e-SIGEF MARZO 2016 | B6.pdf | 04/04/2016 |
| 16 | B7. Reporte e-SIGEF ABRIL 2016 | B7.pdf | 03/05/2016 |
| 17 | B8. Reporte e-SIGEF MAYO 2016 | B8.pdf | 03/06/2016 |
| 18 | B9. Reporte e-SIGEF JUNIO 2016 | B9.pdf | 04/07/2016 |
| 19 | C1. Reporte e-SIGEF JULIO 2016 | C1.pdf | 08/08/2016 |
| 20 | C2. Reporte e-SIGEF Agosto 2016 | C2.pdf | 06/09/2016 |
| 21 | C3. Reporte e-SIGEF Septiembre 2016 | C3.pdf | 05/10/2016 |
| 22 | C4. Reporte e-SIGEF Octubre 2016 | C4.pdf | 09/11/2016 |
| 23 | C5. Reporte e-SIGEF Noviembre 2016 | C5.pdf | 12/12/2016 |
| 24 | C6. Asociación hito 31. Plan de Acompañamiento Redes 2017 | C6.pdf | 06/02/2017 |
| 25 | C7. Asociación Hito 32. Informe de seguimiento Plan Acompañamiento Redes 2016 | C7.pdf | 06/02/2017 |
| 26 | C8. Reporte e-SIGEF Enero 2017 | C8.pdf | 01/03/2017 |
| 27 | C9. Reporte e-SIGEF Febrero 2017 | C9.pdf | 01/03/2017 |
| 28 | D1. ASOCIACIÓN HITO 33: Lineamientos de respuesta al acoso sexual, socializado | C10.pdf | 08/03/2017 |
| 29 | D2. ASOCIACIÓN HITO 34: Lineamientos de respuesta al acoso sexual, en Provincias, en el marco del plan de acompañamiento a redes, socializado | C11.pdf | 08/03/2017 |
| 30 | D3. Asociación Hito 35: Informe de avance de obra ESPE Santo Domingo elaborado | D3.pdf | 03/04/2017 |
| 31 | D4. Asociación Hito 36: Informe de avance de obra ESPOCH Macas, elaborado | D4.pdf | 03/04/2017 |
| 32 | D5. Reporte e-SIGEF Marzo 2017 | D5.pdf | 11/04/2017 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|---------------------------------|--|--|---------------------------|-------------|
| Cuji Llugna, Luis Fernando | Subsecretario de Formación Académica y Profesional | Subsecretario de Formación Académica y Profesional | lcuji@senescyt.gob.ec | 2505660 |
| Espinoza Castro, Silvia Valeria | Líder del Proyecto | Analista 3 del Proyecto de Excelencia | sespinoza@senescyt.gob.ec | 2505660 |
