

**SENESCYT - Secretaría Nacional De Educación Superior, Ciencia, Tecnología E Innovación**  
**SNIESE**

**PROYECTO: K001 SENESCYT - Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ecuador**

Líder del Proyecto:	Escobar García, Ximena Alexandra (aescobar@senescyt.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Troya Fernández, Maria del Pilar	Programas Relacionados:	Programa Nacional de Gobierno Electrónico, Provincia - Azuay, Provincia - Bolívar, Provincia - Carchi, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Napo, Provincia - Orellana, Provincia - Pastaza, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Sucumbíos, Provincia - Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe, SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR
Titular:	Escobar García, Ximena Alexandra	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	091590000.0000.372840	TIR:	25.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	203,948.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	635,030.63
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2012 - 31/12/2015
Fecha de última actualización:	30/03/2015	Fecha de Fin Base:	31/12/2014
Modificado por:	Gordillo Salinas, Mario Andrés	Fecha del siguiente Hito:	01/04/2015

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

DESCRIPCIÓN: Diseñar, implantar, administrar y coordinar el Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ecuador.

PRODUCTO: Gobierno integrado de sistemas informáticos; con una interrelación e independencia entre los mismos; para gestionar los procedimientos internos e interinstitucionales, que conlleven a la recopilación, custodia y divulgación de la información conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica de Estudios Superiores (LOES)

LÍNEA BASE: Recopilación de la información en archivos planos de 71 universidades y escuelas politécnicas, y 243 institutos técnicos, tecnológicos, pedagógicos, conservatorios y artes, de los años 2009, 2010, 2011 y 2012; así como el diseño de una página web para recopilación de información.

OBJETIVO GENERAL: Proveer al Sistema Nacional de Educación Superior información de calidad y oportuna a través del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador - SNIESE.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- 1.- Mantener el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior en funcionamiento y actualizado.
- 2.- Diseñar e implementar los requerimientos funcionales del SNIESE.
- 3.- Definir los procesos para el levantamiento de información de las instituciones de educación superior y capacitarlas en el uso del SNIESE.

**Beneficios Cualitativos**

Mejorar el acceso de la ciudadanía a la información completa, confiable, pertinente, válida y actualizada de las instituciones de educación superior del país.

**Tipo de Beneficiario**

La ciudadanía en general, los estudiantes, docentes, investigadores, las instituciones de educación superior.

**Restricciones**

TIEMPO: 36 meses

COSTO: 656.000,00


**ALCANCE:** La SENESCYT en cumplimiento a la disposición emitida en la Constitución Política del Ecuador, y la Ley Orgánica de Educación Superior, debe diseñar, implementar, administrar y coordinar el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador, razón por la cual se contratará una consultoría, la misma que deberá realizar un análisis completo de las necesidades informáticas de la SNIESE y consolidar los resultados en la automatización de los procesos que la entidad y el SNIESE así lo requiera, para esto se deberán levantar los requerimientos funcionales en coordinación con las áreas técnicas de tal manera que se pueda abarcar todos los ámbitos y procesos que el SNIESE debe considerar para ser la herramienta oficial de información de la educación superior. Los requerimientos funcionales deberán contener las reglas del negocio, validaciones claras y en caso de módulos que requieran subir información digital, se deberá diseñar los procesos necesarios para cumplir con estas tareas (documentos digitales o cargas masivas). Dichos documentos deberán ser recopilados y resguardados en un sistema de gestión documental de licencia libre. El Sistema Integrado SNIESE; constará de varios sistemas independientes y modulares los mismos que

**RECURSOS:** Para ejecutar el proyecto SNIESE, se requiere: Gerente SNIESE, Asesor Informático, Analista Informático, Coordinador de Oferta Académica y Estadísticas, Analista de Oferta Académica, Analista Estadística, Coordinación de Validación de Información, Analista de Validación.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 81.18 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2012      Fecha de Fin: 31/12/2015

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

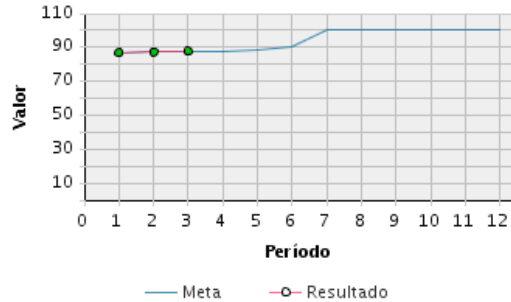

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	87 %	87 %	88 %	88 %	89 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	87 %	87 %	88 %									
Estado												
	●	●	●									

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
FEBRERO 2015  De las actividades realizadas en el SNIESE, se desprende: 1. Informe de entrega de producto 3 (módulo BI -CIT). Hito 39	Escobar García, Ximena Alexandra	03/03/2015 - 02:50 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2. Puesta en marcha módulo de títulos extranjeros PAC - WEB y oferta académica (producto 2). Hito 40</p> <p>3. Se dio cumplimiento a resoluciones del CES, tanto para ingreso de nuevos programas como regularizaciones de los mismos</p> <p>5. Se realizaron modificaciones en el Sistema Académico producto de los informes técnicos efectuados por las Direcciones de Pregrado y Posgrado</p> <p>6. Se actualizaron los datos de las autoridades tanto de Universidades, Escuelas Politécnicas como Institutos</p> <p>7. Se elaboraron estadísticas para atender peticiones externas, así como solicitudes de áreas técnicas de la SENESCYT</p> <p>8. Se efectuó la entrega de usuarios y claves para registro de títulos por parte de las instituciones de educación superior.</p> <p>9. Se desarrollaron oficios, memorandos y guías de correspondencia diaria (20) para la atención a las peticiones formuladas a través de QUIPUX o correo electrónico</p> <p>10. No se han efectuado desembolsos ni transferencias durante este mes</p>		
<p><b>ENERO 2015</b></p> <p>De las actividades realizadas en el SNIESE, se desprende:</p> <p>1. Ejecución entrega de producto 3 (MÓDULO BI -CIT). (Hito 36)</p> <p>2. Capacitación técnica producto 1. (Hito 37)</p> <p>3. Entrega de módulo oferta académica (Hito 38)</p> <p>4. Se dio cumplimiento a resoluciones del CES, tanto para ingreso de nuevos programas como regularizaciones de los mismos</p> <p>5. Se realizaron modificaciones en el Sistema Académico producto de los informes técnicos efectuados por las Direcciones de Pregrado y Posgrado</p> <p>6. Se actualizaron los datos de las autoridades tanto de Universidades, Escuelas Politécnicas como Institutos</p> <p>7. Se elaboraron estadísticas para atender peticiones externas, así como solicitudes de áreas técnicas de la SENESCYT</p> <p>8. Se efectuó la entrega de usuarios y claves para registro de títulos por parte de las instituciones de educación superior.</p> <p>9. Se desarrollaron oficios, memorandos y guías de correspondencia diaria (20) para la atención a las peticiones formuladas a través de QUIPUX o correo electrónico</p> <p>10. No se han efectuado desembolsos ni transferencias durante este mes</p>	<p>Escobar García, Ximena Alexandra</p>	<p>05/02/2015 - 09:56 AM</p>
<p><b>DICIEMBRE 2014</b></p> <p>De las actividades que ha gestionado el SNIESE se destacan:</p> <p>1.Migración de la información de sistemas anteriores. Ejecutado (Hito 34)</p> <p>2.Se dio cumplimiento a resoluciones del CES, tanto para ingreso de nuevos programas como regularizaciones de los mismos</p> <p>3.Se realizaron modificaciones en el Sistema Académico producto de los informes técnicos efectuados por las Direcciones de Pregrado y Posgrado</p> <p>4.Se actualizaron los datos de las autoridades tanto de Universidades, Escuelas Politécnicas como Institutos</p> <p>5.Se elaboraron estadísticas para atender peticiones externas, así como solicitudes de áreas técnicas de la SENESCYT</p> <p>6.Se efectuó la entrega de usuarios y claves para registro de títulos por parte de las instituciones de educación superior.</p> <p>7.Se desarrollaron oficios, memorandos y guías de correspondencia diaria (20) para la atención a las peticiones formuladas a través de QUIPUX o correo electrónico</p> <p>8. No existe registro de "Riesgos" en la ficha de proyecto, toda vez que los Hitos 2015 se encuentran en validación previa su carga en el sistema</p> <p>9.No se han efectuado desembolsos ni transferencias durante este mes</p>	<p>Escobar García, Ximena Alexandra</p>	<p>05/01/2015 - 04:41 PM</p>
<p><b>NOVIEMBRE 2014</b></p> <p>De las actividades que ha gestionado el SNIESE se destacan:</p> <p>1.Informe de la ejecución del Módulo del Portal ciudadano del sistema nacional de información de la educación superior. (Hito 32)</p> <p>2.Informe de ejecución del Módulo de Sistema inteligente de información para visualización de estadísticas estratégicas. (Hito 33)</p> <p>3.Suscripción del Contrato Complementario 20140194 para el análisis, diseño, desarrollo, programación e implementación del SNIESE, con fecha 20 de noviembre de 2014</p> <p>4.Se dio cumplimiento a resoluciones del CES, tanto para ingreso de nuevos programas como regularizaciones de los mismos</p>	<p>Escobar García, Ximena Alexandra</p>	<p>03/12/2014 - 02:54 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>5. Se realizaron modificaciones en el Sistema Académico producto de los informes técnicos efectuados por las Direcciones de Pregrado y Posgrado</p> <p>6. Se actualizaron los datos de las autoridades tanto de Universidades, Escuelas Politécnicas como Institutos</p> <p>7. Se elaboraron estadísticas para atender peticiones externas, así como solicitudes de áreas técnicas de la SENESCYT</p> <p>8. Se efectuó el sorteo de los docentes que son designados como miembros externos de la Comisión de Evaluación de los concursos de Merecimiento y Oposición para contratación del personal académico titular</p> <p>9. Se desarrollaron oficios, memorandos y guías de correspondencia diaria (20) para la atención a las peticiones formuladas a través de QUIPUX o correo electrónico</p> <p>10. No se han efectuado desembolsos ni transferencias durante este mes</p>		
<p>OCTUBRE 2014</p> <p>De las actividades que ha gestionado el SNIESE se destacan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Informe de la ejecución de la ejecución del Módulo del Portal ciudadano del sistema nacional de información de la educación superior. (Hito 31)</li> <li>Se dio cumplimiento a resoluciones del CES, tanto para ingreso de nuevos programas como regularizaciones de los mismos.</li> <li>Se realizaron modificaciones en el Sistema Académico producto de los informes técnicos efectuados por las Direcciones de Pregrado y Posgrado.</li> <li>Se actualizaron los datos de las autoridades tanto de Universidades, Escuelas Politécnicas como Institutos.</li> <li>Se elaboraron estadísticas para atender peticiones externas, así como solicitudes de áreas técnicas de la SENESCYT.</li> <li>Se efectuó el sorteo de los docentes que son designados como miembros externos de la Comisión de Evaluación de los concursos de Merecimiento y Oposición para contratación del personal académico titular.</li> <li>Se desarrollaron oficios, memorandos y guías de correspondencia diaria (20) para la atención a las peticiones formuladas a través de QUIPUX o correo electrónico.</li> <li>No se han efectuado desembolsos ni transferencias durante este mes.</li> </ol>	<p>Gordillo Salinas, Mario Andrés</p>	<p>06/11/2014 - 08:35 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>De las actividades que ha gestionado el SNIESE se destacan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Informe de la ejecución del Módulo de Sistema de Gestión de las IES (Hito relacionado 29)</li> <li>Desarrollo del módulo del Portal ciudadano del sistema nacional de información de la educación superior (Hito relacionado 30)</li> <li>Se dio cumplimiento a resoluciones del CES, tanto para ingreso de nuevos programas como regularizaciones de los mismos.</li> <li>Se realizaron modificaciones en el Sistema Académico producto de los informes técnicos efectuados por las Direcciones de Pregrado y Posgrado.</li> <li>Se actualizaron los datos de las autoridades tanto de Universidades, Escuelas Politécnicas como Institutos.</li> <li>Se elaboraron estadísticas para atender peticiones externas, así como solicitudes de áreas técnicas de la SENESCYT.</li> <li>Se efectuó el sorteo de los docentes que son designados como miembros externos de la Comisión de Evaluación de los concursos de Merecimiento y Oposición para contratación del personal académico titular.</li> <li>Se desarrollaron oficios, memorandos y guías de correspondencia diaria (20) para la atención a las peticiones formuladas a través de QUIPUX o correo electrónico.</li> <li>No se han efectuado desembolsos ni transferencias durante este mes</li> </ol>	<p>Escobar García, Ximena Alexandra</p>	<p>03/10/2014 - 04:41 PM</p>
<p>AGOSTO 2014</p> <p>De las actividades que ha gestionado el SNIESE se destacan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Desarrollo del módulo de Sistema de Gestión de las IES (Hito relacionado 28).</li> <li>Se dio cumplimiento a resoluciones del CES, tanto para ingreso de nuevos programas como regularizaciones de los mismos.</li> <li>Se realizaron modificaciones en el Sistema Académico producto de los informes técnicos efectuados por las Direcciones de Pregrado y Posgrado.</li> <li>Se actualizaron los datos de las autoridades tanto de Universidades, Escuelas Politécnicas como Institutos.</li> <li>Se elaboraron estadísticas para atender peticiones externas, así como solicitudes de áreas técnicas de la SENESCYT.</li> <li>Se efectuó el sorteo de los docentes que son designados como miembros externos de la Comisión de Evaluación de los concursos de Merecimiento y Oposición para contratación del personal académico titular.</li> </ol>	<p>Escobar García, Ximena Alexandra</p>	<p>05/09/2014 - 03:27 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>7. Se desarrollaron oficios, memorandos y guías de correspondencia diaria (20) para la atención a las peticiones formuladas a través de QUIPUX o correo electrónico. 8. No se han efectuado desembolsos durante este mes.</p>		
<p>JULIO 2014 De las actividades que ha gestionado el SNIESE se destacan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desarrollo del módulo de Sistema de Gestión de la información de educación superior. Ejecutado (Hito relacionado 26).</li> <li>2. Informe de la ejecución del Módulo de Sistema de Gestión de la información de educación superior. Ejecutado (Hito relacionado 27).</li> <li>2. Se dio cumplimiento a resoluciones del CES, tanto para ingreso de nuevos programas como regularizaciones de los mismos.</li> <li>3. Se realizaron modificaciones en el Sistema Académico producto de los informes técnicos efectuados por las Direcciones de Pregrado y Posgrado.</li> <li>4. Se actualizaron los datos de las autoridades tanto de Universidades, Escuelas Politécnicas como Institutos.</li> <li>5. Se elaboraron estadísticas para atender peticiones externas, así como solicitudes de áreas técnicas de la SENESCYT.</li> <li>6. Se efectuó el sorteo de los docentes que son designados como miembros externos de la Comisión de Evaluación de los concursos de Merecimiento y Oposición para contratación del personal académico titular.</li> <li>7. Se desarrollaron oficios, memorandos y guías de correspondencia diaria (20) para la atención a las peticiones formuladas a través de QUIPUX o correo electrónico.</li> <li>8. Se realizó la transferencia efectiva del 30% por concepto de Anticipo al Consorcio ThoughtWorks, por el valor de \$165.000,00 sin IVA.</li> </ol>	<p>Escobar García, Ximena Alexandra</p>	<p>01/08/2014 - 07:41 AM</p>
<p>JULIO 2014 De las actividades que ha gestionado el SNIESE se destacan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desarrollo del módulo de Sistema de Gestión de la información de educación superior. Ejecutado (Hito relacionado 26).</li> <li>2. Informe de la ejecución del Módulo de Sistema de Gestión de la información de educación superior. Ejecutado (Hito relacionado 27).</li> <li>2. Se dio cumplimiento a resoluciones del CES, tanto para ingreso de nuevos programas como regularizaciones de los mismos.</li> <li>3. Se realizaron modificaciones en el Sistema Académico producto de los informes técnicos efectuados por las Direcciones de Pregrado y Posgrado.</li> <li>4. Se actualizaron los datos de las autoridades tanto de Universidades, Escuelas Politécnicas como Institutos.</li> <li>5. Se elaboraron estadísticas para atender peticiones externas, así como solicitudes de áreas técnicas de la SENESCYT.</li> <li>6. Se efectuó el sorteo de los docentes que son designados como miembros externos de la Comisión de Evaluación de los concursos de Merecimiento y Oposición para contratación del personal académico titular.</li> <li>7. Se desarrollaron oficios, memorandos y guías de correspondencia diaria (20) para la atención a las peticiones formuladas a través de QUIPUX o correo electrónico.</li> <li>8. Se realizó la transferencia efectiva del 30% por concepto de Anticipo al Consorcio ThoughtWorks, por el valor de \$165.000,00 sin IVA.</li> </ol>	<p>Escobar García, Ximena Alexandra</p>	<p>31/07/2014 - 09:08 AM</p>
<p>JUNIO 2014 De las actividades que ha gestionado el SNIESE se destacan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 30% del anticipo a la empresa consultora que desarrollará el SNIESE. Entregado. (Hito relacionado 25).</li> <li>2. Se dio cumplimiento a resoluciones del CES, tanto para ingreso de nuevos programas como regularizaciones de los mismos.</li> <li>3. Se realizaron modificaciones en el Sistema Académico producto de los informes técnicos efectuados por las Direcciones de Pregrado y Posgrado.</li> <li>4. Se actualizaron los datos de las autoridades tanto de Universidades, Escuelas Politécnicas como Institutos.</li> <li>5. Se elaboraron estadísticas para atender peticiones externas, así como solicitudes de áreas técnicas de la SENESCYT.</li> <li>6. Se efectuó el sorteo de los docentes que son designados como miembros externos de la Comisión de Evaluación de los concursos de Merecimiento y Oposición para contratación del personal académico titular.</li> <li>7. Se desarrollaron oficios, memorandos y guías de correspondencia diaria (20) para la atención a las peticiones formuladas a través de QUIPUX o correo electrónico.</li> </ol>	<p>Escobar García, Ximena Alexandra</p>	<p>07/07/2014 - 09:12 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
8. No se han realizado transferencias en el mes de junio 2014.		
<p>MAYO 2014:</p> <p>De las actividades que ha gestionado el SNIESE se destacan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Firma del contrato con la empresa consultora adjudicada. Ejecutado (Hito relacionado 23).</li> <li>2. Se dio cumplimiento a resoluciones del CES, tanto para ingreso de nuevos programas como regularizaciones de los mismos.</li> <li>3. Se realizaron modificaciones en el Sistema Académico producto de los informes técnicos efectuados por las Direcciones de Pregrado y Posgrado.</li> <li>4. Se actualizaron los datos de las autoridades tanto de Universidades, Escuelas Politécnicas como Institutos.</li> <li>5. Se elaboraron estadísticas para atender peticiones externas, así como solicitudes de áreas técnicas de la SENESCYT.</li> <li>6. Se efectuó el sorteo de los docentes que son designados como miembros externos de la Comisión de Evaluación de los concursos de Merecimiento y Oposición para contratación del personal académico titular.</li> <li>7. Se desarrollaron oficios, memorandos y guías de correspondencia diaria (20) para la atención a las peticiones formuladas a través de QUIPUX o correo electrónico.</li> <li>8. No se han realizado transferencias en el mes de mayo 2014.</li> </ol>	<p>CADENA FUERTES, JOSÉ RUPERTO</p>	<p>04/06/2014 - 05:14 PM</p>
<p>ABRIL 2014:</p> <p>De las actividades que ha gestionado el SNIESE se destacan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proceso de contratación de la empresa que desarrollará el SNIESE. Ejecutado (Hito relacionado 22).</li> <li>2. Se dio cumplimiento a resoluciones del CES, tanto para ingreso de nuevos programas como regularizaciones de los mismos.</li> <li>3. Se realizaron modificaciones en el Sistema Académico producto de los informes técnicos efectuados por las Direcciones de Pregrado y Posgrado.</li> <li>4. Se actualizaron los datos de las autoridades tanto de Universidades, Escuelas Politécnicas como Institutos.</li> <li>5. Se elaboraron estadísticas para atender peticiones externas, así como solicitudes de áreas técnicas de la SENESCYT.</li> <li>6. Se efectuó el sorteo de los docentes que son designados como miembros externos de la Comisión de Evaluación de los concursos de Merecimiento y Oposición para contratación del personal académico titular.</li> <li>7. Se desarrollaron oficios, memorandos y guías de correspondencia diaria (20) para la atención a las peticiones formuladas a través de QUIPUX o correo electrónico.</li> <li>8. No se han realizado transferencias en el mes de abril 2014.</li> </ol>	<p>Escobar García, Ximena Alexandra</p>	<p>05/05/2014 - 04:41 PM</p>
<p>MARZO 2014:</p> <p>De las actividades que ha gestionado el SNIESE se destacan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informe de registro de matriculados del año 2013 de las Universidades y Escuelas Politécnicas (Hito relacionado 21).</li> <li>2. Se dio cumplimiento a resoluciones del CES, tanto para ingreso de nuevos programas como regularizaciones de los mismos.</li> <li>3. Se realizaron modificaciones en el Sistema Académico producto de los informes técnicos efectuados por las Direcciones de Pregrado y Posgrado.</li> <li>4. Se actualizaron los datos de las autoridades tanto de Universidades, Escuelas Politécnicas como Institutos.</li> <li>5. Se elaboraron estadísticas para atender peticiones externas, así como solicitudes de áreas técnicas de la SENESCYT.</li> <li>6. Se efectuó el sorteo de los docentes que son designados como miembros externos de la Comisión de Evaluación de los concursos de Merecimiento y Oposición para contratación del personal académico titular.</li> <li>7. Se desarrollaron oficios, memorandos y guías de correspondencia diaria (20) para la atención a las peticiones formuladas a través de QUIPUX o correo electrónico.</li> <li>8. No se han realizado transferencias en el mes de marzo 2014.</li> </ol>	<p>Escobar García, Ximena Alexandra</p>	<p>04/04/2014 - 04:18 PM</p>
<p>FEBRERO 2014:</p> <p>De las actividades que ha gestionado el SNIESE se destacan:</p> <p>-Se revisaron los ajustes informáticos en el aplicativo de errores de registro de títulos, previo el paso a producción y notificación a las instituciones de educación superior.</p>	<p>Escobar García, Ximena Alexandra</p>	<p>05/03/2014 - 12:32 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Se dio cumplimiento a resoluciones del CES, tanto para ingreso de nuevos programas como regularizaciones de los mismos.</li> <li>-Se realizaron modificaciones en el Sistema Académico producto de los informes técnicos efectuados por las Direcciones de Pregrado y Posgrado.</li> <li>-Se actualizaron los datos de las autoridades tanto de Universidades, Escuelas Politécnicas como Institutos.</li> <li>-Se elaboraron estadísticas para atender peticiones externas, así como solicitudes de áreas técnicas de la SENESCYT.</li> <li>-Se efectuó el sorteo de los docentes que son designados como miembros externos de la Comisión de Evaluación de los concursos de Merecimiento y Oposición para contratación del personal académico titular.</li> <li>-Se desarrollaron oficios, memorandos y guías de correspondencia diaria (20) para la atención a las peticiones formuladas a través de QUIPUX o correo electrónico.</li> </ul>		
<p>ENERO 2014.- De las actividades que ha gestionado el SNIESE se destacan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Cumplimiento del Hito 18 y 19, detallando el informe técnico de errores detectados en la base de datos de registro de títulos, previo la comunicación a las IES para el uso de la herramienta, a fin de ingresar las correcciones necesarias.</li> <li>-Cumplimiento a resoluciones del CES, tanto para ingreso de nuevos programas como regularizaciones de los mismos.</li> <li>-Modificaciones en el Sistema Académico producto de los informes técnicos efectuados por las Direcciones de Pregrado y Posgrado.</li> <li>-Actualizaciones de datos de las autoridades tanto de Universidades, Escuelas Politécnicas como Institutos</li> <li>-Entrega de resultados de los documentos físicos y/o digitales entregadas por las instituciones de educación superior para validar la legalidad de la oferta académica.</li> <li>-Elaboración de estadísticas para atender peticiones externas, así como solicitudes de áreas técnicas de la SENESCYT.</li> <li>-Sorteo de los docentes que son designados como miembros externos de la Comisión de Evaluación de los concursos de Merecimiento y Oposición para contratación del personal académico titular.</li> <li>-Elaboración de formularios para el archivo de la documentación de los institutos técnicos, tecnológicos, pedagógicos, arte y música, producto del levantamiento de datos años 2011-2012.</li> <li>-Desarrollo de oficios, memorandos y guías de correspondencia diaria (20) para la atención a las peticiones formuladas a través de QUIPUX o correo electrónico.</li> </ul>	Escobar García, Ximena Alexandra	03/02/2014 - 11:55 AM
<p>DICIEMBRE 2013.- De las actividades que ha gestionado el SNIESE se destacan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Cumplimiento del Hito 16 y 17 con la solicitud a la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación para la creación de una herramienta informática que permita a las IES corregir los errores de la base de Registro de Títulos. Se ha entregado el documento de Requerimientos Funcionales para proceder con el desarrollo de la aplicación.</li> <li>-Cumplimiento a resoluciones del CES, tanto para ingreso de nuevos programas como regularizaciones de los mismos.</li> <li>-Modificaciones en el Sistema Académico producto de los informes técnicos efectuados por las Direcciones de Pregrado y Posgrado.</li> <li>-Actualizaciones de datos de las autoridades tanto de Universidades, Escuelas Politécnicas como Institutos</li> <li>-Entrega de resultados de los documentos físicos y/o digitales entregadas por las instituciones de educación superior para validar la legalidad de la oferta académica.</li> <li>-Elaboración de estadísticas para atender peticiones externas, así como solicitudes de áreas técnicas de la SENESCYT.</li> <li>-Sorteo de los docentes que son designados como miembros externos de la Comisión de Evaluación de los concursos de Merecimiento y Oposición para contratación del personal académico titular.</li> <li>-Elaboración de formularios para el archivo de la documentación de los institutos técnicos, tecnológicos, pedagógicos, arte y música, producto del levantamiento de datos años 2011-2012.</li> <li>-Desarrollo de oficios, memorandos y guías de correspondencia diaria (20) para la atención a las peticiones formuladas a través de QUIPUX o correo electrónico.</li> </ul>	Escobar García, Ximena Alexandra	03/01/2014 - 03:27 PM
<p>NOVIEMBRE 2013.- De las actividades que ha gestionado el SNIESE se destacan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Cumplimiento del Hito 14 con la entrega del plan aprobado del proceso de depuración de la base de registro de títulos.</li> <li>-Cumplimiento del Hito 15 con la entrega del Informe del proceso de depuración de errores detectados en la base de datos de registro de títulos</li> <li>-Cumplimiento a resoluciones del CES, tanto para ingreso de nuevos programas como regularizaciones de los mismos.</li> <li>-Modificaciones en el Sistema Académico producto de los informes técnicos efectuados por las Direcciones de Pregrado y Posgrado.</li> </ul>	Escobar García, Ximena Alexandra	03/12/2013 - 10:18 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Actualizaciones de datos de las autoridades tanto de Universidades, Escuelas Politécnicas como Institutos                      -Entrega de resultados de los documentos físicos y/o digitales entregadas por las instituciones de educación superior para validar la legalidad de la oferta académica.                      -Elaboración de estadísticas para atender peticiones externas, así como solicitudes de áreas técnicas de la SENESCYT.                      -Sorteo de los docentes que son designados como miembros externos de la Comisión de Evaluación de los concursos de Merecimiento y Oposición para contratación del personal académico titular.                      -Elaboración de formularios para el archivo de la documentación de los institutos técnicos, tecnológicos, pedagógicos, arte y música, producto del levantamiento de datos años 2011-2012.                      -Desarrollo de oficios, memorandos y guías de correspondencia diaria (20) para la atención a las peticiones formuladas a través de QUIPUX o correo electrónico.                      -Organización del archivo secuencial y documentación elaborada por el SNIESE.                      -Revisión y atención diaria a las peticiones remitidas directamente al correo electrónico del SNIESE.</p>		
<p>OCTUBRE 2013: De las actividades que ha gestionado el SNIESE se destacan: Cumplimiento del Hito 14 elaborando el Proyecto de depuración de la base de títulos con su cronograma respectivo, adicionalmente a las actividades administrativas como: Cumplimiento a resoluciones del CES, tanto para ingreso de nuevos programas como regularizaciones de los mismos, Modificaciones en el Sistema Académico producto de los informes técnicos efectuados por las Direcciones de Pregrado y Posgrado, Actualizaciones de datos de las autoridades tanto de Universidades, Escuelas Politécnicas como Institutos, Revisión de los documentos físicos y/o digitales entregadas por las instituciones de educación superior para validar la legalidad de la oferta académica, restando 4 IES para culminar la totalidad, Elaboración de estadísticas para atender peticiones externas, así como solicitudes de áreas técnicas de la SENESCYT, Sorteo de los docentes que son designados como miembros externos de la Comisión de Evaluación de los concursos de Merecimiento y Oposición para contratación del personal académico titular, Elaboración de formularios para el archivo de la documentación de los institutos técnicos, tecnológicos, pedagógicos, arte y música, producto del levantamiento de datos años 2011-2012, Desarrollo de oficios, memorandos y guías de correspondencia diaria (20) para la atención a las peticiones formuladas a través de QUIPUX o correo electrónico, Organizar el archivo secuencial y documentación elaborada por el SNIESE, Revisión y atención diaria a las peticiones remitidas directamente al correo electrónico del SNIESE.</p>	Escobar García, Ximena Alexandra	04/11/2013 - 04:59 PM
<p>SEPTIEMBRE 2013. Durante este mes se desarrolló, se analizó y se difundió entre las autoridades, la nueva propuesta de diseño para el Sistema Integrado SNIESE, basado en 3 factores, 1. Generar transaccionabilidad en el sistemas, 2. Carga información validada, 3. Generar una interfaz que pueda ser dispuesta por todas las IES para la actualización de información, todo esto basado en la reutilización de software ya existente que inclusive las IES han desarrollado. También es necesario aclarar que esta información es necesaria para crear sistemas que pueda fundirse sin que sea necesario desarrollo; todo basado en un bus gobernable de servicios que integre a los actores que por la LOES interactuen con el SNIESE. Por último se ve la necesidad de crear y analizar el levantamiento de procesos o al menos macro procesos que sean los generadores de las funcionalidades del sistema.</p>	Parra Llive, Edwin Raúl	02/10/2013 - 06:03 PM
<p>Debido a ajustes en la definición de los términos de referencia en la plataforma a diseñar, el perfil del proveedor, el perfil del equipo de trabajo, el alcance, las herramientas a utilizar en el desarrollo del sistema SNIESE, el rediseño de la conceptualización de los requerimientos funcionales; realizada anteriormente sobre los procesos del SNIESE para lograr concatenar las últimas definiciones de los instrumentos jurídicos y de regulación como son los reglamentos de escalafón docente, el proyecto de nuevo reglamento de régimen académico publicado por el CES, los actuales procesos de acreditación de carreras y programas y evaluación de extensiones por parte del CEAACES, han proporcionado los insumos necesarios para plasmar la gestión académica de la educación superior en el nuevo SNIESE, esto hizo que se deba reprogramar los hitos hasta diciembre del 2013. Las actividades se están llevando a cabo para cumplir con el proceso de contratación propuesto y poder conseguir la entrega del módulo administrativo en diciembre del 2013.</p>	Loayza Polo, Edwin Eduardo	03/09/2013 - 05:03 PM
<p>Se continuó con la construcción de las especificaciones técnicas, incorporando la mayoría de consideraciones y nueva normativa que regula la educación superior, una nueva versión del borrador del nuevo Reglamento de Régimen Académico, disponible en la página web del Consejo de Educación Superior, propone una manera alternativa de agrupación de carreras y titulaciones, mismas que deben ser tomadas en cuenta en la construcción del módulo básico o administrativo del sistema, esta adición modifica de manera sustancial la manera de registro, agrupación y gestión de la oferta académica. El Consejo de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, iniciará el proceso de evaluación de carreras para lo cual solicitó la inclusión de más campos de información sobre la información ya levantada, esto implica la dedicación de algunos recursos en la definición de nuevas matrices, comunicación a las</p>	Loayza Polo, Edwin Eduardo	02/08/2013 - 05:05 PM



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
universidades y procedimientos a considerar. Los esfuerzos por la depuración de la información de institutos continúan y se tiene ya versiones oficiales de cantidad de estudiantes, docentes e infraestructura del mencionado grupo de instituciones de la educación superior.		
En este mes se llevó a cabo una revisión de los requerimientos funcionales que serán la base para la elaboración del sistema Sniese, una plataforma que contenga todo el registro de la gestión académica de las instituciones de educación superior. Adicionalmente se elaboraron los términos de referencia preliminares para iniciar el análisis técnico de los mismos y complementar los requerimientos informáticos mínimos que se necesitan para obtener una herramienta segura y de buen desempeño. En cuanto a la gestión de la información de institutos, se inició el proceso de depuración, con el análisis de los datos en cuanto a coherencia entre campos levantados y revisión de los títulos de los docentes con respecto al registro de títulos de la Senescyt, con respecto a estudiantes se está validando si los reportados como matriculados, no están incluidos en las nivelaciones tanto de carrera como la general del SNNA.	Loayza Polo, Edwin Eduardo	02/07/2013 - 11:43 AM
Al finalizar el mes de mayo se dio por culminado el período oficial de carga de la información de los institutos, mismos que entregaron en su gran mayoría las matrices referentes a estudiantes, docentes, infraestructura, oferta académica, personal administrativo y bienes muebles e inmuebles. Cabe recalcar que de la totalidad de institutos registrados en la base del SNIESE (282), se recibió información del 90% de los mismo, ya que la diferencia no se logró contactar debido al cierre, o imposibilidad de conocer su estado o paradero, esta investigación permitirá que se puedan depurar instituciones que ya no ofertan carreras en el nivel técnico o tecnológico, sustentando la necesidad de reconvertir algunos institutos, principalmente públicos para solventar la demanda existente.	Loayza Polo, Edwin Eduardo	03/06/2013 - 06:43 PM
En el mes de Abril se inició la recolección de datos de los institutos técnicos y tecnológicos, un total de 282 entidades fueron comunicadas y contactadas. Se elaboró el respectivo manual de usuario con las consideraciones particulares de la gestión de los institutos, el portal <a href="http://www.sniese.gob.ec">www.sniese.gob.ec</a> , en la sección "Levantamiento de Datos de Institutos 2011-2012", está lista para aceptar las matrices de información respectiva. En lo referente a la información de las Universidades remitida al CEAACES con fecha 22 de marzo, esta fue utilizada para la determinación de cierre de 44 extensiones universitarias que no cumplieron los criterios técnicos de calidad, actualmente el trabajo interinstitucional se ve fortalecido por la información proporcionada desde la SENESCYT a través de la gestión del equipo SNIESE, una vez culminada la evaluación por parte del CEAACES, la información será cruzada para determinar datos validados en su totalidad.	Loayza Polo, Edwin Eduardo	02/05/2013 - 03:20 PM
Marzo 2013: Con fecha 22 de marzo del 2013, se recibió el 100% de la información de todas las Universidades y Escuelas Politécnicas del País, con los formularios de resumen institucional firmados por las máximas autoridades. La información luego de revisada en su contenido lógico, formatos y corrección de cruces, fue remitida al CEAACES, quienes dieron inicio al proceso de evaluación de las instituciones. Se cumplió con el compromiso en el tiempo acordado (viernes 22 de marzo del 2013) con la mencionada entidad a través de la entrega en los formatos adicionales solicitados. Paralelamente se dio inicio al proceso de levantamiento de información de los Institutos, con las tareas de revisión del manual de usuario y preparación de comunicaciones a los institutos para la preparación de la información. Durante este mes se dotó al Secretario Nacional de información previa para poder responder inquietudes de la ciudadanía en general.	Loayza Polo, Edwin Eduardo	02/04/2013 - 11:11 AM
FEBRERO 2013: Cada una de las 57 universidades, ha sido monitoreada a través de correo electrónico con más de 1.500 atenciones resueltas y alrededor de 400 llamadas telefónicas atendidas por parte del equipo del SNIESE. La información que actualmente se ha recopilado, no ha pasado los filtros de calidad necesarios para la evaluación del CEAACES, por lo tanto está siendo sometida a revisiones y cuestionamientos por parte del equipo técnico del SNIESE. A la fecha se ha analizado el 70% de Universidades que han entregado los datos, posteriormente se ha enviado los reportes respectivos de errores e inconsistencias a cada institución de educación superior.	Loayza Polo, Edwin Eduardo	28/02/2013 - 06:09 PM
ENERO 2013: Se llevó a cabo la jornada de capacitación del levantamiento de información en 6 ciudades del país de manera exitosa. Las Universidades y Escuelas Politécnicas han sido atendidas oportunamente durante todo el mes a través del correo <a href="mailto:sniese@senescyt.gob.ec">sniese@senescyt.gob.ec</a> y telefónicamente a través de las extensiones 131 y 137, en todos los requerimientos o aclaraciones referentes a las matrices de levantamiento de información. Como requerimiento urgente para el Sistema de Admisión y Nivelación (SNNA) las Universidades cumplieron con entregar la oferta de carreras vigentes en el 2013 para el Examen Nacional de la Educación Superior (ENES) el día 25 de enero del 2013. Se envió a las Universidades un archivo de soporte que valida la información, previo a subirla en el portal WEB del SNIESE.	Loayza Polo, Edwin Eduardo	06/02/2013 - 02:46 PM

Problemas cerrados: 3

### RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	<b>5- PROYECTO. Alcance.</b> El no establecer mecanismos de contingencia, por parte de la consultora, para subsanar las observaciones funcionales y técnicas generadas en los planes de prueba de los 6 módulos a entregarse CAUSARÍA el retraso de la entrega final del SNIESE	05/03/2015	Ximena Alexandra Escobar García	50 %	80	40	0/1

Riesgos cerrados: 11

### LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3
2	Zona 1 - Norte > Carchi > Toda la Provincia del Carchi
3	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas
4	Zona 1 - Norte > Imbabura > Toda la Provincia de Imbabura
5	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios
6	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Toda la Provincia de Napo
7	Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Toda la Provincia de Orellana
8	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha
9	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo
10	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Toda la Provincia de Cotopaxi
11	Zona 3 - Centro > Pastaza > Toda la Provincia de Pastaza
12	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Toda la Provincia de Tungurahua
13	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí
14	Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Toda la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas
15	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Toda la Provincia de Bolívar
16	Zona 5 - Litoral > Galápagos > Toda la Provincia de Galapagos
17	Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas
18	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Toda la Provincia de Los Ríos
19	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Toda la Provincia de Santa Elena
20	Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay
21	Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar
22	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago
23	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro
24	Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja
25	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Toda la Provincia de Zamora Chinchipe

### HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Proyecto Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ecuador, Realizado	1-Solicitud de Información	31/12/2012		31/12/2012		Sí	10.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
2	PLANEACIÓN: Solicitud dictamen de prioridad, Aprobada	4-Inicio de Trabajo	31/12/2012		31/12/2012		Sí	10.0
3	EJECUCIÓN: Universidades y Escuelas Politécnicas capacitadas para el levantamiento de información. Ejecutado	4-Inicio de Trabajo	23/01/2013		23/01/2013		Sí	2.0
4	EJECUCIÓN: TDRs para contratación de sistema de indicadores. Elaborado	4-Inicio de Trabajo	08/02/2013		08/02/2013		Sí	2.0
5	EJECUCIÓN: Informe de registro de información en los formularios de levantamiento de información de los años 2011 y 2012. Entregado	5-Entregables Intermedios	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
6	EJECUCIÓN: Formularios institucionales de respaldo de las UEP firmados por los respectivos rectores. Recibido y Almacenado	5-Entregables Intermedios	15/03/2013		15/03/2013		Sí	2.0
7	EJECUCIÓN: Informe general de validación de la información proveniente de las UEP. Elaborado	5-Entregables Intermedios	30/04/2013		30/04/2013		Sí	2.0
8	EJECUCIÓN: Reporte de la información levantada y validada de las UEP al CES y CEAACES. Entregado	5-Entregables Intermedios	20/05/2013		20/05/2013		Sí	2.0
9	EJECUCIÓN: Informe de levantamiento de la información proveniente de los institutos. Elaborado	5-Entregables Intermedios	31/05/2013		31/05/2013		Sí	2.0
10	EJECUCIÓN: Informe de revisión general integral de los requerimientos funcionales del SNIESE. Elaborado	5-Entregables Intermedios	14/06/2013		14/06/2013		Sí	2.0
11	EJECUCIÓN: TDR's para el proceso de contratación de la empresa que desarrollará el SNIESE. Elaborado	9-Entregables Formales	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0
12	EJECUCIÓN: Informe de avance del proceso de contratación de la empresa que desarrollará el SNIESE. Elaborado	2-Publicación de Pliegos	19/07/2013		19/07/2013		Sí	2.0
13	EJECUCIÓN: Documento de especificaciones técnicas ajustado a los nuevos requerimientos. Ejecutado	3-Adjudicación	31/08/2013		30/08/2013		Sí	2.0
14	EJECUCIÓN: Informe del proceso de contratación de empresa consultora. Ejecutado	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		30/09/2013		Sí	2.0
15	EJECUCIÓN: Entrega del plan aprobado del proceso de depuración de la base de registro de títulos. Entregado	9-Entregables Formales	04/11/2013		04/11/2013		Sí	2.0
16	EJECUCIÓN: Entrega del primer producto (Base de errores encontrados en la	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		30/11/2013		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	información de registro de títulos). Entregado							
17	EJECUCIÓN: Envío de solicitud a universidades para que se corrija la información de registro de títulos. Enviado	9-Entregables Formales	05/12/2013		05/12/2013		Sí	2.0
18	EJECUCIÓN: Información para corrección recibida.	1-Solicitud de Información	30/12/2013		30/12/2013		Sí	2.0
19	EJECUCIÓN: Creación de scripts para la actualización de la información de registro de títulos. Creado	1-Solicitud de Información	20/01/2014		20/01/2014		Sí	2.0
20	EJECUCIÓN: Informe de evaluación del proceso de validación de información. Entregado	5-Entregables Intermedios	30/01/2014		30/01/2014		Sí	2.0
21	EJECUCIÓN: Implementación de la interfaz para registro de matriculados del año 2013 de las Universidades y Escuelas Politécnicas. Ejecutado.	5-Entregables Intermedios	19/02/2014		19/02/2014		Sí	2.0
22	EJECUCIÓN: Informe de registro de matriculados del año 2013 de las Universidades y Escuelas Politécnicas. Entregado	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/03/2014		Sí	2.0
23	EJECUCIÓN: Proceso de contratación de la empresa que desarrollará el SNIESE. Ejecutado	1-Solicitud de Información	30/04/2014		30/04/2014		Sí	2.0
24	EJECUCIÓN: Firma del contrato con la empresa consultora adjudicada. Ejecutado	2-Publicación de Pliegos	30/05/2014		30/05/2014		Sí	2.0
25	EJECUCIÓN: 30% del Anticipo a la empresa consultora que desarrollará el SNIESE. Entregado.	5-Entregables Intermedios	15/06/2014		15/06/2014		Sí	2.0
26	EJECUCIÓN: Desarrollo del módulo de Sistema de Gestión de la información de educación superior. Ejecutado	5-Entregables Intermedios	14/07/2014		14/07/2014		Sí	2.0
27	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del Módulo de Sistema de Gestión de la información de educación superior. Ejecutado	5-Entregables Intermedios	21/07/2014		21/07/2014		Sí	2.0
28	EJECUCIÓN: Desarrollo del módulo de Sistema de Gestión de las IES. Ejecutado	9-Entregables Formales	18/08/2014		18/08/2014		Sí	2.0
29	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del Módulo de Sistema de Gestión de las IES. Ejecutado	5-Entregables Intermedios	01/09/2014		01/09/2014		Sí	2.0
30	EJECUCIÓN: Desarrollo del módulo del Portal ciudadano del sistema nacional de información de la educación superior. Ejecutado	9-Entregables Formales	29/09/2014		29/09/2014		Sí	2.0
31	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del Módulo del Portal	5-Entregables Intermedios	13/10/2014		13/10/2014		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	ciudadano del sistema nacional de información de la educación superior. Ejecutado							
32	EJECUCIÓN: Desarrollo del módulo de Sistema inteligente de información para visualización de estadísticas estratégicas. Ejecutado	9-Entregables Formales	10/11/2014		10/11/2014		Sí	2.0
33	EJECUCIÓN: Informe de ejecución del Módulo de Sistema inteligente de información para visualización de estadísticas estratégicas. Ejecutado	5-Entregables Intermedios	24/11/2014		24/11/2014		Sí	2.0
34	EJECUCIÓN: Migración de la información de sistemas anteriores. Ejecutado	9-Entregables Formales	19/12/2014		19/12/2014		Sí	2.0
35	EJECUCIÓN: Informe de la propuesta metodológica de la Capacitación a funcionarios SENESCYT. Ejecutado	9-Entregables Formales	23/01/2015		23/01/2015		Sí	2.0
36	EJECUCIÓN: Capacitación Técnica Producto 1. Ejecutado	9-Entregables Formales	30/01/2015		30/01/2015		Sí	0.5
37	EJECUCIÓN: Entrega de Módulo Oferta Académica. Ejecutado	9-Entregables Formales	30/01/2015		30/01/2015		Sí	0.15
38	EJECUCIÓN: Entrega de Producto 3 (Módulo BI-CIT). Elaborado	9-Entregables Formales	30/01/2015		30/01/2015		Sí	0.15
39	EJECUCIÓN: Informe de entrega de Producto 3 (Módulo BI-CIT). Elaborado	9-Entregables Formales	13/02/2015		13/02/2015		Sí	0.15
40	EJECUCIÓN: Puesta en marcha Módulo de Títulos Extranjeros PAC - WEB y Oferta Académica (Producto 2). Ejecutado	9-Entregables Formales	18/02/2015		18/02/2015		Sí	0.15
41	EJECUCIÓN: Capacitación Técnica Producto 3. Ejecutado	9-Entregables Formales	02/03/2015		02/03/2015		Sí	0.15
42	EJECUCIÓN: Entrega de Producto 4 (Funcionarios de las IES). Elaborado	9-Entregables Formales	13/03/2015		13/03/2015		Sí	0.15
43	EJECUCIÓN: Informe de entrega de Producto 4 (Funcionarios de las IES). Elaborado	9-Entregables Formales	27/03/2015		27/03/2015		Sí	0.15
44	EJECUCIÓN: Puesta en marcha Módulo BI - CIT (Producto 3). Ejecutado	9-Entregables Formales	01/04/2015	01/04/2015			No	0.15
45	EJECUCIÓN: Capacitación Técnica Producto 4. Ejecutado	9-Entregables Formales	13/04/2015	13/04/2015			No	0.15
46	EJECUCIÓN: Entrega de Producto 5 (Portal Ciudadano). Entregado	9-Entregables Formales	30/04/2015	30/04/2015			No	0.15
47	EJECUCIÓN: Puesta en marcha Módulo funcionarios de las IES. Ejecutado	9-Entregables Formales	13/05/2015	13/05/2015			No	0.15
48	EJECUCIÓN: Entrega de Producto 6 (BI funcionarios	9-Entregables Formales	15/05/2015	15/05/2015			No	0.15

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	SENESCYT y entes reguladores). Elaborado							
49	EJECUCIÓN: Informe Producto 5 (PORTAL CIUDADANO). Elaborado	9-Entregables Formales	15/05/2015	15/05/2015			No	0.15
50	EJECUCIÓN: Informe de entrega Producto 6 (BI funcionarios SENESCYT y entes reguladores). Elaborado	9-Entregables Formales	29/05/2015	29/05/2015			No	0.15
51	EJECUCIÓN: Capacitación Técnica Producto 5. Ejecutado	9-Entregables Formales	01/06/2015	01/06/2015			No	0.15
52	EJECUCIÓN: Capacitación Técnica Producto 6. Ejecutado	9-Entregables Formales	15/06/2015	15/06/2015			No	0.15
53	EJECUCIÓN: Puesta en marcha Módulo BI funcionarios SENESCYT y entes reguladores. Ejecutado	9-Entregables Formales	30/06/2015	30/06/2015			No	0.6
54	EJECUCIÓN: Puesta en marcha Módulo Portal Ciudadano. Ejecutado	9-Entregables Formales	30/06/2015	30/06/2015			No	0.5
55	CIERRE: Informe final de entrega de Producto	9-Entregables Formales	30/07/2015	30/07/2015			No	10.0

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Proyecto en ejecución de acuerdo a lo planificado en Orellana.	Herrera Jaramillo, Ramiro Vicente	{PR} - Provincia - ORELLANA	19/05/2014
2	Supervisión del proyecto en Orellana	Herrera Jaramillo, Ramiro Vicente	{PR} - Provincia - ORELLANA	11/04/2014

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de capacitaciones para el uso de la plataforma SNIESE		-	-	-	01/01/2015	-
2	Número de usuarios que acceden al sistema para registro de títulos en el SNIESE		-	-	-	01/01/2014	-


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	165,000.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	635,030.63 **
Costo Total:	1,662,083.77
Total Devengado:	110,780.63
% Costo Total Devengado:	6.67 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 6.67 %

**Perfil Económico 2015**

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
<b>Ppto. Planeado</b>	1,361,502.06	524,250.00	0.00	<b>1,885,752.06</b>
<b>Ppto. Externo Planeado</b>	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Ppto. Aprobado Inicial</b>	131,287.10	204,800.00	0.00	<b>336,087.10</b>
<b>Ppto. Codificado</b>	107,234.20	689,250.00	0.00	<b>796,484.20</b>
<b>Ppto. Comprometido</b>	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Planeado - Codificado (2015)</b>		-165,000.00		
<b>Programado a Devengar</b>	779,066.20	524,250.00	0.00	<b>1,303,316.20</b>
<b>Ppto. Devengado</b>	110,780.63	0.00	0.00	<b>110,780.63</b>
<b>Estimado a fin de año</b>	* 110,780.63	204,800.00	0.00	<b>315,580.63</b>
<b>Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)</b>	668,285.57	319,450.00	0.00	<b>987,735.57</b>
<b>% de Programado a Devengar vs. Devengado</b>	* 14.22 %	0.00 %	0.00 %	<b>8.50 %</b>
<b>Ppto. Codificado 998</b>	0.00	165,000.00	0.00	<b>165,000.00</b>
<b>Ppto. Devengado 998</b>	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015**

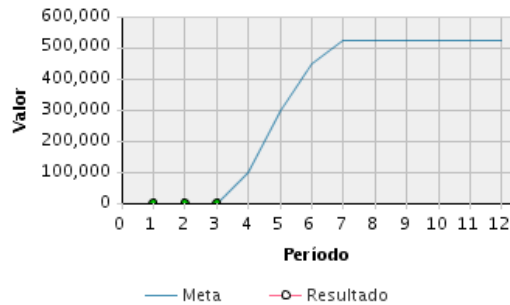

<b>Presupuesto Mensual 2015</b>							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	0.00 %

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	100,000.00		100,000.00				
May	200,000.00		300,000.00				
Jun	150,000.00		450,000.00				
Jul	74,250.00		524,250.00				
Ago	0.00		524,250.00				
Sep	0.00		524,250.00				
Oct	0.00		524,250.00				
Nov	0.00		524,250.00				
Dic	0.00		524,250.00				
<b>Total</b>	<b>524,250.00</b>	<b>0.00</b>					

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
2	Incrementar la disponibilidad de información de Educación Superior MEDIANTE el levantamiento, procesamiento y validación de datos para la creación de un sistema de información.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 ASOCIACIÓN HITO 1.- PROYECTO FORMATO SENPLADES	A.1.pdf	30/04/2014
2	A.2 ASOCIACIÓN HITO 2.- DICTAMEN PRIORIDAD	A.2.pdf	30/04/2014
3	A.3 ASOCIACIÓN HITO 2 (ANEXO 1).- UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS CAPACITADAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN	A.3.pdf	30/04/2014
4	A.4 ASOCIACIÓN HITO 2 (ANEXO 2).- UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS CAPACITADAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN	A.4.pdf	30/04/2014
5	A.5 ASOCIACIÓN HITO 3.- TDRS PARA CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE INDICADORES. ELABORADO	A.5.pdf	30/04/2014
6	A.6 ASOCIACIÓN HITO 4 (ANEXO 1).- INFORME DE REGISTRO DE INFORMACIÓN EN LOS FORMULARIOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS AÑOS 2011 Y 2012	A.6.pdf	30/04/2014
7	A.7 ASOCIACIÓN HITO 4 (ANEXO 2).- INFORME DE REGISTRO DE INFORMACIÓN EN LOS FORMULARIOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS AÑOS 2011 Y 2012	A.7.pdf	30/04/2014
8	A.8 ASOCIACIÓN HITO 5.- FORMULARIOS INSTITUCIONALES DE RESPALDO DE LAS UEP FIRMADOS POR LOS RESPECTIVOS RECTORES. RECIBIDOS Y ALMACENADOS	A.8.pdf	30/04/2014
9	A.9 ASOCIACIÓN HITO 5 (ANEXO 2).- FORMULARIOS INSTITUCIONALES DE RESPALDO DE LAS UEP FIRMADOS POR LOS RESPECTIVOS RECTORES. RECIBIDOS Y ALMACENADOS	A.9.pdf	30/04/2014
10	B.1 ASOCIACIÓN HITO 5 (ANEXO 3).- FORMULARIOS INSTITUCIONALES DE RESPALDO DE LAS UEP	B.1.pdf	30/04/2014



**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	FIRMADOS POR LOS RESPECTIVOS RECTORES. RECIBIDOS Y ALMACENADOS		
11	B.2 ASOCIACIÓN HITO 5 (ANEXO 4).- FORMULARIOS INSTITUCIONALES DE RESPALDO DE LAS UEP FIRMADOS POR LOS RESPECTIVOS RECTORES. RECIBIDOS Y ALMACENADOS	B.2.pdf	30/04/2014
12	B.3 ASOCIACIÓN HITO 6 (ANEXO 1).- INFORME GENERAL DE VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LAS UEP. ELABORADO	B.3.pdf	30/04/2014
13	B.4 ASOCIACIÓN HITO 6 (ANEXO 2).- INFORME GENERAL DE VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LAS UEP. ELABORADO	B.4.pdf	30/04/2014
14	B.5 ASOCIACIÓN HITO 7.- REPORTE DE LA INFORMACIÓN LEVANTADA Y VALIDADA DE LAS UEP AL CES Y CEAACES. ENTREGADO	B.5.pdf	30/04/2014
15	B.6 ASOCIACIÓN HITO 8.- INFORME DE LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LOS INSTITUTOS. ELABORADO	B.6.pdf	30/04/2014
16	B.7 ASOCIACIÓN HITO 9.- INFORME DE REVISIÓN INTEGRAL DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SNIесе. ELABORADO	B.7.pdf	30/04/2014
17	B.8 ASOCIACIÓN HITO 10 (ANEXO 1).- TDRS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA QUE DESARROLLARÁ EL SNIесе. ELABORADO	B.8.pdf	30/04/2014
18	B.9 ASOCIACIÓN HITO 10 (ANEXO 2).- TDRS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA QUE DESARROLLARÁ EL SNIесе. ELABORADO	B.9.pdf	30/04/2014
19	C.1 ASOCIACIÓN HITO 11.- INFORME DE AVANCE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA QUE DESARROLLARÁ EL SNIесе. ELABORADO	C.1.pdf	30/04/2014
20	C.2 ASOCIACIÓN HITO 12 (ANEXO 1).- DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AJUSTADOS A LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS. REALIZADO	C.2.pdf	30/04/2014
21	C.3 ASOCIACIÓN HITO 12 (ANEXO 2).- DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AJUSTADOS A LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS. REALIZADO	C.3.pdf	30/04/2014
22	C.4 ASOCIACIÓN HITO 13.- INFORME DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA	C.4.pdf	30/04/2014
23	C.5 ASOCIACIÓN HITO 14 (ANEXO 1).- ENTREGA DEL PLAN APROBADO DEL PROCESO DE DEPURACIÓN DE LA BASE DE REGISTRO DE TÍTULOS	C.5.pdf	02/05/2014
24	C.6 ASOCIACIÓN HITO 14 (ANEXO 2).- ENTREGA DEL PLAN APROBADO DEL PROCESO DE DEPURACIÓN DE LA BASE DE REGISTRO DE TÍTULOS	C.6.pdf	02/05/2014
25	C.7 ASOCIACIÓN HITO 14 (ANEXO 3).- ENTREGA DEL PLAN APROBADO DEL PROCESO DE DEPURACIÓN DE LA BASE DE REGISTRO DE TÍTULOS	C.7.pdf	02/05/2014
26	C.8 ASOCIACIÓN HITO 15.- ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO (BASE DE ERRORES ENCONTRADOS EN LA INFORMACIÓN DE REGISTRO DE TÍTULOS)	C.8.pdf	02/05/2014
27	C.9 ASOCIACIÓN HITO 16.- ENVÍO DE SOLICITUD A UNIVERSIDADES PARA QUE SE CORRIJA LA INFORMACIÓN DE REGISTRO DE TÍTULOS. ENVIADO	C.9.pdf	02/05/2014
28	D.1 ASOCIACIÓN HITO 17.- INFORMACIÓN PARA CORRECCIÓN RECIBIDA. EN PROCESO	D.1.pdf	02/05/2014
29	D.2 ASOCIACIÓN HITO 18.- COMPONENTE 2.- CREACIÓN DE SCRIPTS PARA LA ACTUALIZACIÓN	D.2.pdf	02/05/2014

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	DE LA INFORMACIÓN DE REGISTRO DE TÍTULOS. CREADO		
30	D.3 ASOCIACIÓN HITO 19.- COMPONENTE 2.- INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN. ENTREGADO	D.3.doc	02/05/2014
31	D.4 ASOCIACIÓN HITO 20.- IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERFAZ PARA REGISTRO DE MATRICULADOS DEL AÑO 2013 DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS. EJECUTADO	D.4.pdf	02/05/2014
32	D.5 REPORTE ESIGEF FEBRERO PROYECTO SNIESE 2014	D.5.pdf	02/05/2014
33	D.6 INFORME PRESUPUESTO PROGRAMADO FEBRERO 2014	D.6.pdf	02/05/2014
34	D.7 ASOCIACIÓN HITO 21.- INFORME DE REGISTRO DE MATRICULADOS DEL AÑO 2013 DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS	D.7.pdf	02/05/2014
35	D.8 REPORTE ESIGEF MARZO 2014	D.8.pdf	02/05/2014
36	D.9 ASOCIACIÓN HITO 22 (ANEXO 1).- PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA QUE DESARROLLARÁ EL SNIESE. EJECUTADO	D.9.pdf	02/05/2014
37	E.1 ASOCIACIÓN HITO 22 (ANEXO 2).- PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA QUE DESARROLLARÁ EL SNIESE. EJECUTADO	E.1.pdf	02/05/2014
38	E.2 ASOCIACIÓN HITO 22 (ANEXO 3).- PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA QUE DESARROLLARÁ EL SNIESE. EJECUTADO	E.2.pdf	02/05/2014
39	E.3 ASOCIACIÓN HITO 23.- FIRMA DEL CONTRATO CON LA EMPRESA CONSULTORA ADJUDICADA	E.3.pdf	03/06/2014
40	E.4 REPORTE E-SIGEF MES DE ABRIL 2014	E.4.pdf	03/06/2014
41	E.5 Reporte e-sigef mes de mayo 2014	E.5.pdf	05/06/2014
42	E.6 ASOCIACIÓN HITO 25 (ANEXO 1).- 30% DEL ANTICIPO A LA EMPRESA CONSULTORA QUE DESARROLLARÁ EL SNIESE. ENTREGADO.	E.6.pdf	27/06/2014
43	E.7 ASOCIACIÓN HITO 26.- DESARROLLO DEL MÓDULO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	E.7.pdf	16/07/2014
44	E.8 ASOCIACIÓN HITO 27.- INFORME DE LA EJECUCIÓN DEL MÓDULO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR. EJECUTADO	E.8.PDF	23/07/2014
45	E.9 ASOCIACIÓN HITO 25 (ANEXO 2).- 30% DEL ANTICIPO A LA EMPRESA CONSULTORA QUE DESARROLLARÁ EL SNIESE. ENTREGADO.	E.9.pdf	29/07/2014
46	F.1 ASOCIACIÓN HITO 28.- DESARROLLO DEL MÓDULO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS IES. EJECUTADO	F.1.PDF	18/08/2014
47	F.1 Reporte e-sigef mes de junio 2014	F.1.pdf	31/07/2014
48	F.2 Reporte e-sigef mes de Julio 2014	F.2.pdf	31/07/2014
49	F.3 ASOCIACIÓN HITO 29.- INFORME DE LA EJECUCIÓN DEL MÓDULO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS IES.	F.3.PDF	01/09/2014
50	F.4. Reporte e-sigef mes de Agosto 2014	F.4.pdf	02/09/2014
51	F.5 ASOCIACIÓN HITO 30.- DESARROLLO DEL MÓDULO DEL PORTAL CIUDADANO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.	F.5.PDF	30/09/2014
52	F.6. Reporte e-sigef mes de Septiembre 2014	F6..pdf	02/10/2014

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
53	F.7 ASOCIACIÓN HITO 31.- INFORME DE LA EJECUCIÓN DEL MÓDULO DEL PORTAL CIUDADANO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.	F.7.pdf	15/10/2014
54	F.8. Reporte e-sigef mes de octubre 2014	F8..pdf	04/11/2014
55	F.9 ASOCIACIÓN HITO 32.- INFORME DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL MÓDULO DE SISTEMA INTELIGENTE DE INFORMACIÓN PARA VISUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS ESTRATÉGICAS.	F.9.PDF	13/11/2014
56	G.1 Reporte e-sigef mes de Noviembre 2014	G.1.pdf	01/12/2014
57	G.2 ASOCIACIÓN HITO 33.- INFORME DE EJECUCIÓN DEL MÓDULO DE SISTEMA INTELIGENTE DE INFORMACIÓN PARA VISUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS ESTRATÉGICAS	G.2.PDF	02/12/2014
58	G.3 INFORME TÉCNICO PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO COMPLEMENTARIO SNIESE	G.3.pdf	02/12/2014
59	G.4 CONTRATO COMPLEMENTARIO SNIESE	G.4.PDF	02/12/2014
60	G.5 ASOCIACIÓN HITO 34.-MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SISTEMAS ANTERIORES	G.5.PDF	20/12/2014
61	G.6. Reporte e-sigef mes de Diciembre 2014	G6..pdf	05/01/2015
62	G.7 ASOCIACIÓN HITO 35: INFORME DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA DE LA CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS SENESCYT	G.7.pdf	29/01/2015
63	G.8 ASOCIACIÓN HITO 36: ENTREGA DE PRODUCTO 3 (MÓDULO BI -CIT).	G.8.PDF	30/01/2015
64	G.9 ASOCIACIÓN HITO 37 (ANEXO 1): CAPACITACIÓN TÉCNICA PRODUCTO 1.	G.9.PDF	30/01/2015
65	H.1 ASOCIACIÓN HITO 37 (ANEXO 2): CAPACITACIÓN TÉCNICA PRODUCTO 1.	H.1.PDF	30/01/2015
66	H.2 ASOCIACIÓN HITO 37 (ANEXO 3): CAPACITACIÓN TÉCNICA PRODUCTO 1.	H.2.PDF	30/01/2015
67	H.3 ASOCIACIÓN HITO 38: ENTREGA DE MÓDULO OFERTA ACADÉMICA.	H.3.PDF	30/01/2015
68	H.4 Reporte e-sigef mes de Enero 2015	H.4.pdf	09/02/2015
69	H.5 ASOCIACIÓN HITO 39: INFORME DE ENTREGA DE PRODUCTO 3 (MÓDULO BI -CIT)	H.5.pdf	19/02/2015
70	H.6. Reporte e-sigef mes de Febrero 2015	H.6.pdf	27/02/2015
71	H.7 ASOCIACIÓN HITO 40: PUESTA EN MARCHA MÓDULO DE TÍTULOS EXTRANJEROS PAC - WEB Y OFERTA ACADÉMICA (PRODUCTO 2)	H.7.PDF	27/02/2015
72	H.8 ASOCIACIÓN HITO 41: CAPACITACIÓN TÉCNICA PRODUCTO 3	H.8.PDF	03/03/2015
73	H.9 ASOCIACIÓN HITO 42: ENTREGA DE PRODUCTO 4 (FUNCIONARIOS DE LAS IES)	H.9.PDF	23/03/2015
74	I1. Reporte e-SIGEF Marzo 2015	I1.pdf	30/03/2015

## LIGAS EXTERNAS

### Dirección (URL)

1	SENESCYT
	<a href="http://educacionsuperior.gob.ec">http://educacionsuperior.gob.ec</a>

## EQUIPO DEL PROYECTO

<b>Nombre</b>	<b>Rol</b>
Escobar García, Ximena Alexandra	Gerente del Proyecto
Fabara Riofrio, Christian Eduardo	Lider técnico
Fiallos, Maria Fernanda	Lider técnico
