

**SENESCYT - Secretaría Nacional De Educación Superior, Ciencia, Tecnología E Innovación**  
**SNNA**

**PROYECTO: K001 SENESCYT - SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN**

Líder del Proyecto:	Araujo, Lorena (laraujo@senami.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Troya Fernández, Maria del Pilar	Programas Relacionados:	Provincia - Azuay, Provincia - Bolivar, Provincia - Carchi, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Napo, Provincia - Orellana, Provincia - Pastaza, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Sucumbíos, Provincia - Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe, SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION
Titular:	Araujo, Lorena	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Brainware - Talento Humano	Retorno Económico:	0.00
CUP:	091590000.0000.372746	TIR:	21.88 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	43,826,504.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	229,475,534.65
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/03/2011 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	31/03/2015	Fecha de Fin Base:	31/12/2017
Modificado por:	Gordillo Salinas, Mario Andrés	Fecha del siguiente Hito:	01/04/2015

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** El proyecto se enmarca a la política 2.6 b) Fortalecer el sistema de educación superior, asegurando las interrelaciones entre los distintos niveles y la oferta educativas para garantizar el acceso meritocrático y sin discriminación de los postulantes al Sistema de Educación Superior.

**PRODUCTO:** Nóminas de aspirantes remitidos a los módulos de nivelación de carrera, especial o general

**LÍNEA BASE:** En el Ecuador, 60% de los postulantes alcanzan un cupo dentro del sistema de educación superior, es decir que de 247.682 aspirantes, 148.609 alcanzan un cupo dentro de la educación pública del país (Se deben analizar estos datos como una aproximación, no se ha logrado eliminar la doble postulación).

**OBJETIVO GENERAL:** Reducir las heterogeneidades y mejorar el perfil cognitivo, social y subjetivo de los aspirantes que los habilite al ingreso a las instituciones de educación superior, sin discriminación a ningún grupo poblacional.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

1. Diseñar instrumentos de evaluación, validación y administración del sistema nacional de nivelación y admisión.
2. Implementar el sistema nacional de nivelación y admisión.
3. Administrar y supervisar el sistema nacional de nivelación y admisión.

**Beneficios Cualitativos**

Reducir las heterogeneidades y mejorar el perfil cognitivo, social y subjetivo de los aspirantes que los habilite al ingreso a las instituciones de educación superior, sin discriminación a ningún grupo poblacional.

**Tipo de Beneficiario**

Bachilleres que no han accedido a la educación superior

**Restricciones**

TIEMPO: El tiempo de duración del proyecto es del 2013 - 2017

COSTO: \$ 274.328.701

RECURSOS: HUMANOS: Personal capacitado para la aplicación de los procesos.


ALCANCE: Nacional

Fase Actual:

- Anteproyecto
- Definición
- Planeación
- Ejecución**
- Cierre
- Completado
- Congelado
- Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 59.73 %  
 Fecha de Inicio: 01/03/2011      Fecha de Fin: 31/12/2017

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

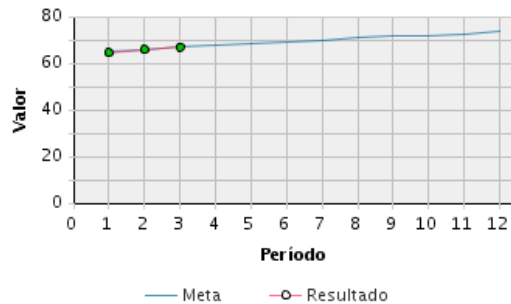

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	65 %	66 %	67 %	68 %	68 %	69 %	70 %	71 %	72 %	72 %	72 %	74 %
	Avance real acumulado											
	65 %	66 %	67 %									
Estado												
	●	●	●									

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Febrero 2015: Logística: 1.Lectura óptica de las hojas de respuestas del examen Habilitación Docente del 31 de enero 2015 (ASOCIACIÓN HITO 83). 2.Entrega de cadena de respuestas del examen Habilitación Docente del 31 de enero 2015 (ASOCIACIÓN HITO 83). 3.Entrega de base de recintos y coordinadores asignados para el proceso Exonera a Contact Center (ASOCIACIÓN HITO 74). 4.Entrega de kits al COLOG por parte del EL TELEGRAFO para el EXONERA febrero 2015 (ASOCIACIÓN HITO 74). 5.Aplicación del EXONERA febrero 2015 (ASOCIACIÓN HITO 74). 6.Recepción de hojas de respuesta y cuadernillos EXONERA febrero 2015 (ASOCIACIÓN HITO 74). 7.Lectura óptica de las hojas de respuesta EXONERA febrero 2015 (ASOCIACIÓN HITO 74). 8.Entrega de cadena de respuestas del EXONERA febrero 2015 (ASOCIACIÓN HITO 74).	Garzón, Viviana	03/03/2015 - 09:40 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>9. Visitas a Unidades Educativas que serán recinto en los procesos ENES 2015 en la provincia de Pichincha (ASOCIACIÓN HITO 81).</p> <p>10. Asignación de recintos ENES marzo 2015 (ASOCIACIÓN HITO 81).</p> <p>11. Cruzar bases de adventistas con listado de inscritos para el ENES marzo 2015 (ASOCIACIÓN HITO 81).</p> <p>12. Cruzar base de datos para la toma del ENES en el exterior (ASOCIACIÓN HITO 81).</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>13. Validación de cupos asignados a Personas Privadas de Libertad y planificación de proceso de aceptación.</p> <p>14. Desarrollo y validación de convenio e instructivo para desarrollo de carrera focalizada de Seguridad Ciudadana y orden Público.</p> <p>15. Seguimiento al proceso de asignación de cupos de carreras focalizadas.</p> <p>16. Talleres con seis universidades de política de cuotas para presentar perfil de becarios e información sobre beca nacional IECE.</p> <p>17. Elaboración de instructivo de política de cuotas.</p> <p>18. Elaboración de instructivo de reportes estadísticos y de proceso de cierre de carreras.</p> <p>19. Validación y aprobación de instructivo de seguimiento a becas nacionales.</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>20. Elaboración de cartas para los trámites de colocación para 74 estudiantes.</p> <p>21. Revisión informes finales de Nivelación Especial en la ESPE y ESPO de GAR V</p> <p>22. Entrega de reportes de asistencias de GAR VI periodo 2 al IECE</p> <p>23. Implementación de los exámenes de admisión de UCL en Quito a 18 estudiantes GAR que postularon por dicha universidad.</p> <p>24. Primer acercamiento con el Proyecto de Servicio Civil Ciudadano del MRL y el Departamento de Educación de la Policía para actualizar el proceso de voluntariado de los GAR;</p> <p>25. Implantación de una herramienta en la que se está recompilando información de las universidades e institutos de los listados vigentes (para poder mejorar el seguimiento a las postulaciones y para analizar la eficacia de los listados en temas de colocación).</p> <p>Nivelación:</p> <p>26. Consulta de carreras duales de la ESPE.</p> <p>27. Regularización de cupos remanentes.</p> <p>28. Levantamiento de información para Evaluación de nivelación</p> <p>29. Levantamiento de informes de monitoreo.</p> <p>30. Elaboración de TDR para nivelación GAR.</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>31. Selección e inscripción para el curso de habilitación docente "Pedagogía y Didáctica edición 3"</p> <p>32. Apertura del sistema para la inscripción del ENES Docente de Marzo. (ASOCIACIÓN HITO 82)</p> <p>33. Inicia grupo complementario al curso Especialización en docencia de Matemáticas dirigido a docentes de nivelación de las IES públicas con.</p> <p>34. Publicación en cuentas personales de los resultados de la prueba Enes docentes aplicadas el 31 de enero (ASOCIACIÓN HITO 83)</p> <p>35. Realización del Primer Taller de Formación de docentes Mentores SNNA, seleccionados del grupo de Especialistas en matemáticas, realizado en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (Riobamba).</p> <p>36. Tutoría diaria para acompañamiento en línea (página de Facebook), en tres áreas temáticas la prueba ENES-ESTUDIANTES (razonamiento verbal, numérico y abstracto).</p> <p>Transferencias:</p> <p>37. No transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>ENERO 2015</p> <p>Logística:</p> <p>1. Se solicitó a los Adventistas envían listas notarizada de potenciales aspirantes que rindan exonera en horario nocturno.</p> <p>2. Asignación de recintos para el Exonera.</p> <p>3. Envío de la base de datos a "El Telégrafo" para iniciar proceso de impresión por parte de la Unidad de Logística (DATA VARIABLE).</p> <p>4. Asignación de personal docente (aplicadores, supervisores, coordinadores).</p> <p>5. Armado de kits y listados para la toma del examen Habilitación Docentes del 31 de Enero de 2015 (ASOCIACIÓN HITO 75).</p> <p>6. Aplicación del examen Habilitación Docentes en las siguientes Provincias: Azuay, Bolívar, Chimborazo, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Manabí, Pastaza, Pichincha (ASOCIACIÓN HITO 80).</p> <p>7. Diseño de la interface de usuario y base de datos (ASOCIACIÓN HITO 78).</p> <p>8. Establecer interconexión con el registro civil y la base del SENESCYT (ASOCIACIÓN HITO 78).</p> <p>9. Pruebas de control de calidad del funcionamiento de la plataforma (ASOCIACIÓN HITO 78).</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p>	<p>Garzón, Viviana</p>	<p>04/02/2015 - 05:39 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>10.Seguimiento al proceso de tercera postulación y asignación de cupos (ASOCIACIÓN HITO 76).</p> <p>11.Desarrollo de campaña de política de cuotas para tercera postulación.</p> <p>12.Información a IES sobre disponibilidad de matriz MTN para matriculación.</p> <p>13.Coordinación con Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia para proceso de asignación de cupos de carreras focalizadas y planificación de próxima cohorte (ASOCIACIÓN HITO 76).</p> <p>14.Revisión de la funcionalidad de la plataforma de inscripción y encuesta de contexto (ASOCIACIÓN HITO 77).</p> <p>15.Habilitación de la plataforma de inscripción (ASOCIACIÓN HITO 77).</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>16.Revisión de los contenidos y programas de la nivelación especial y elaboración propuesta nivelación especial 2015</p> <p>17.Investigación y elaboración primer borrador de propuesta programa de pasantías.</p> <p>18.Revisión y fortalecimiento de los procesos de apoyo y seguimiento psicoemocionales pre- y post- salida de los GAR.</p> <p>19.Gestión de los reportes de asistencias y notas de GAR V para el IECE</p> <p>Promoción de la Política Pública.</p> <p>20.Coordinación interinstitucional con la población Achuar.</p> <p>21.Capacitación a autoridades y docentes de la provincia de Pastaza Distrito 1 y 2 ( 131 personas)</p> <p>22.Actualización de Planes de sesión para aplicar en el territorio.</p> <p>23.Acompañamiento PPL en el proceso de postulación y construcción del proyecto de vida académico.</p> <p>Nivelación:</p> <p>24.Realización de acuerdos de gestión y presupuestarios con los Rectores, Vicerrectores y/o Coordinadores de la Nivelación de las universidades para firmas de contratos por la nivelación de carrera.</p> <p>25.Avance de liquidaciones del 10% de contratos de Nivelación del año 2014.</p> <p>26.Requerimiento de información y acuerdos con los Institutos para la Nivelación General.</p> <p>27.Elaboración de definiciones técnicas para implementar la nivelación en línea en la plataforma "Jóvenes".</p> <p>28.Visitas a universidades e institutos que imparten la nivelación (ASOCIACIÓN HITO 79).</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>29Curso de Habilitación docente "Pedagogía edición 1".</p> <p>30.Inscripción prueba Enes docente (ASOCIACIÓN HITO 75).</p> <p>31.Aplicación de Enes docente a profesionales (ASOCIACIÓN HITO 80).</p> <p>32Curso de perfeccionamiento en Docencia de Matemáticas (300 docentes de nivelación de las IES)</p> <p>Transferencias:</p> <p>33.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>DICIEMBRE 2014:</p> <p>Logística:</p> <p>1.Lectura óptica de pruebas ENES.</p> <p>2.Consolidación y validación de personal que participó en el ENES.</p> <p>3.Apoyo y coordinación con CEAACES para asesoría en la aplicación de pruebas para la carrera de medicina.</p> <p>4.Informe de novedades del proceso ENES.</p> <p>5.Definición de nuevas contrapartes para la coordinación logística ENES.</p> <p>6.Elaboración de cronograma global del proceso.</p> <p>7.Destrucción del material del EXONERA.</p> <p>8.Evaluación del proceso logístico desplegado.</p> <p>9.Reunión con proveedores para próximos procesos</p> <p>10.Reunión de evaluación de la figura de coordinador de seguridad implementada en último proceso</p> <p>11.Diseño e impresión de hoja de respuesta y apoyo logístico para la implementación del inventario de intereses profesionales en proyecto de orientación profesional con Prometeo.</p> <p>12.Apoyo en proceso de aplicación ENES para habilitación docente (impresión, lectura óptica, generación de calificaciones)</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>13.Coordinación de la carga de oferta académica en cada proceso: solicitud a las IES, activación de carreras en el sistema según informe de carreras vigentes y seguimiento a carga (ASOCIACIÓN HITO 72).</p> <p>14.Reuniones con las universidades para promover la racionalización de la oferta.</p> <p>15.Coordinación del proyecto piloto "Política de Cuotas" (seguimiento a convenios, asignación de becarios, desarrollo de aplicativo y apoyo en generación de sistema de tutorías).</p>	<p>Garzón, Viviana</p>	<p>05/01/2015 - 01:56 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>16.Coordinación con Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica para carga de oferta focalizada (ASOCIACIÓN HITO 72).</p> <p>17.Recopilación de información sobre cada IES y las carreras ofertadas para la publicación de estas en el Telégrafo.</p> <p>18.Seguimiento a becas nacionales (IECE).</p> <p>19.Talleres de Presentación de componentes de becas nacionales con énfasis en las becas BDH y política de cuotas a los coordinadores de las diferentes IES del país para la concreción de la línea de becas del programa nacional Eloy Alfaro.</p> <p>20.Apertura de la plataforma informática para la aceptación de los cupos asignados (ASOCIACIÓN HITO 72).</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>21.Seguimiento a los casos de estudiantes en los siguientes procesos: postulación a la beca internacional y firma de contratos, activación de cupo, re postulación.</p> <p>Nivelación:</p> <p>22.Monitorio a universidades e institutos que realizan la nivelación.</p> <p>23.Recepción de respuestas a las cartas precontractuales enviadas a las universidades.</p> <p>24.Elaborar el presupuesto general del costo de la nivelación</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>25.Revisión del proceso informático de registro para habilitación docente.</p> <p>26.Implementación del curso de Pedagogía para habilitación docente.</p> <p>27.Seguimiento del curso en línea de especialización en matemáticas.</p> <p>Transferencias:</p> <p>28.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>Noviembre 2014:</p> <p>El Sistema de Nivelación y Admisión se encuentra alineado al proyecto de gobierno electrónico.</p> <p>Logística:</p> <p>1.Solicitud de datos de docentes que participaron como Aplicadores, Supervisores, Apoyo y Reserva</p> <p>2.Ingreso de datos de docentes que participaron como Aplicadores, Supervisores, Apoyo y Reserva a la plataforma SNNA en el ENES de septiembre de 2014.</p> <p>3.Contacto con las Universidades para solicitar información sobre, infraestructura, datos generales del recinto, datos autoridades.</p> <p>4.Capacitación al personal CEAACES para la aplicación de exámenes de evaluación de fin de carrera y/o habilitación para el ejercicio profesional.</p> <p>5.TDR para compra de destructor de papel</p> <p>6.Solicitar material para habilitación docente a Telégrafo.</p> <p>7.Solicitud de números de formas, clave de control, números de preguntas para el EXONERA de enero 2015.</p> <p>8.Actualización del formato para visitas de recintos académicos que participarán en futuros procesos.</p> <p>9.Guías, instructivos, capacitación en línea.</p> <p>10.Respuesta a reclamos de evaluados en el ENES de septiembre de 2014.</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>11.Validación de oferta académica subida al sistema (ASOCIACIÓN HITO 71)..</p> <p>12.Definición y aplicación de algoritmo de selección de postulantes para política de cuotas (ASOCIACIÓN HITO 71).</p> <p>13.Validación de registro de personas privadas de libertad habilitadas para postular (ASOCIACIÓN HITO 71).</p> <p>14.Definición de proceso de asignación de cupos.</p> <p>15.Pruebas de integración funcional del módulo de nivelación del SNNA.</p> <p>16.Desarrollo de los algoritmos de asignación de cupos para los segmentos de Grupo de alto rendimiento, política de cuotas y población general.</p> <p>17.Habilitación del sistema de gestión docente para inscripciones</p> <p>18.Desarrollo del aplicativo para aceptación de cupos.</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>19.Evento de socialización de los GAR VII</p> <p>20.Reuniones con University of British Columbia, University College London</p> <p>21.Postulaciones GAR VII - seguimiento (ASOCIACIÓN HITO 71).</p> <p>22.Gestión de las solicitudes de activaciones y re-postulaciones de cupos GAR anteriores (ASOCIACIÓN HITO 71).</p> <p>23.Reuniones con las Universidades ESPOL y Cuenca</p> <p>24.Informe de asistencia GAR V y GAR VI</p> <p>25.Preparación propuesta de nueva Nivelación Especial</p> <p>Nivelación:</p> <p>26.Preparación de la documentación y logística para las salidas del monitoreo a 28 universidades Y 33 institutos que implementan la Nivelación del SNNA.</p>	<p>Garzón, Viviana</p>	<p>03/12/2014 - 03:34 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>27. Transferencia del dinero presupuestado para los 33 Institutos por la implementación de la nivelación del Segundo Semestre 2014.</p> <p>28. Pago del 40% según contrataciones realizadas a 30 Universidades por implementación de la Nivelación General, de Carrera y Especial.</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>29. Receptar y organizar la información de los 373 docentes habilitados para inscribir en el curso de Especialización de Matemáticas según convenio OEI-SENESCYT.</p> <p>30. Continuar proceso de habilitación docente a los 300 aspirantes que aprobaron el ENES-docente a través del curso de Pedagogía y Didáctica según convenio OEI-SENESCYT.</p> <p>31. Realizar propuesta de nivelación a la Policía Nacional por medio de la cual sus aspirantes podrán ingresar a sus filas de forma coordinada con las autoridades de la Policía para firma del convenio entre Ministerio del Interior y la SENESCYT.</p> <p>32.2 consultorías levantadas para diseño de cursos de especialización en Ciencias Sociales y Lenguaje según convenio OEI-SENESCYT.</p> <p>Transferencias:</p> <p>33. Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión" con un valor de USD. 2'161.496,00.</p>		
<p>Octubre 2014:</p> <p>Logística:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lectura óptica de pruebas ENES.</li> <li>2. Apoyo y coordinación con CEAACES para asesoría en la aplicación de pruebas para la carrera de medicina.</li> <li>3. Informe de novedades del proceso ENES.</li> <li>4. Definición de nuevas contrapartes para la coordinación logística ENES.</li> <li>5. Elaboración de cronograma global del proceso.</li> <li>6. Destrucción del material del EXONERA.</li> <li>7. Reunión con proveedores para próximos procesos.</li> <li>8. Reunión de evaluación de la figura de coordinador de seguridad implementada en último proceso.</li> <li>9. Diseño e impresión de hoja de respuesta y apoyo logístico para la implementación del inventario de intereses profesionales en proyecto de orientación profesional con Prometeo.</li> <li>10. Apoyo en proceso de aplicación ENES para habilitación docente (impresión, lectura óptica, generación de calificaciones).</li> </ol> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Coordinación de la carga de oferta académica en cada proceso: solicitud a las IES, activación de carreras en el sistema según informe de carreras vigentes y seguimiento a carga.</li> <li>12. Reuniones con las universidades para promover la racionalización de la oferta.</li> <li>13. Coordinación del proyecto piloto "Política de Cuotas".</li> <li>14. Coordinación con Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica para carga de oferta focalizada.</li> <li>15. Recopilación de información sobre cada IES y las carreras ofertadas para la publicación de estas en el Telégrafo.</li> <li>16. Seguimiento a becas nacionales (IECE).</li> <li>17. Talleres de Presentación de componentes de becas nacionales con énfasis en las becas BDH y política de cuotas a los coordinadores de las diferentes IES del país para la concreción de la línea de becas del programa nacional Eloy Alfaro.</li> </ol> <p>Grupo GAR:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>18. Contratación nivelación especial ESPE y UdCuenca.</li> <li>19. Inicio de clases de nivelación especial en Quito y Cuenca.</li> <li>20. Reunión de coordinación Campus France.</li> <li>21. Tratamiento de casos especiales.</li> <li>22. Atención a la postulación.</li> </ol> <p>Nivelación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>23. Guías de presupuestación de 43 Institutos Tecnológicos para Nivelación de Carrera, General y Desarrollo Integral Infantil.</li> <li>24. Acompañamiento para el inicio de la Nivelación de Carrera de 29 Universidades, y 43 Institutos Tecnológicos.</li> <li>25. TDRs de la Universidad Católica de Cuenca.</li> <li>26. Pago del 40 % correspondiente al Segundo Semestre de 26 Universidades.</li> <li>27. Reuniones con Zonales, Institutos Superiores y Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.</li> </ol> <p>Habilitación Docente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>28. Lanzamiento de la campaña para la preselección docente. Seguimiento del Convenio con OEI y consultoría.</li> <li>29. Revisión y organización de preselección docente.</li> <li>30. Lanzamiento de la campaña para el curso de virtual de Matemáticas.</li> <li>31. Invitación a los becarios para que participen del Curso de Habilitación.</li> </ol>	<p>Garzón, Viviana</p>	<p>04/11/2014 - 05:33 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>32. Recalificación de exámenes de Habilitación Docente. Transferencias: 33. No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2014: Logística: 1. Reunión con los delegados de los Ministerios de Educación, de Defensa, Coordinador de Seguridad, Policía, Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos para organización del ENES. 2. Envío de base de datos a El Telégrafo para la impresión del material a ser utilizado en el ENES. 3. Asignación de recintos y organización de agendas para la aplicación del ENES en el exterior, adventistas, personas privadas de la libertad. 4. Coordinación de la logística para el funcionamiento del ENES. 5. Aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior ENES. 6. Recepción de hojas de respuesta. Recepción de material utilizado en bodega. Apoyo y Seguimiento Académico: 7. Coordinación de la carga de oferta académica en cada proceso: solicitud a las IES, activación de carreras en el sistema según informe de carreras vigentes y seguimiento a carga. 8. Coordinación del proyecto piloto "Política de Cuotas" (seguimiento a convenios, asignación de becarios, desarrollo de aplicativo y apoyo en generación de sistema de tutorías). 9. Firma de convenio entre Senescyt y Conadis para acompañamiento y apoyo en el proceso del proyecto de Política de Cuotas. 10. Coordinación del proyecto piloto "Acceso a educación superior para personas privadas de libertad". 11. Aplicación del ENES en los Centros de Rehabilitación Social de Quito, Latacunga y Guayaquil. 12. Seguimiento a becas nacionales (IECE). Grupo GAR: 13. Contacto con los estudiantes GAR para apoyar la concreción de sus becas internacionales. 14. Finalización del curso de inglés para GAR VI. 15. Diseño del sistema de acompañamiento psicológico a los estudiantes GAR. Nivelación: 16. Se completó el proceso de Lista de Espera, vinculando a 1833 nuevos aspirantes, respetando el puntaje de corte de cada carrera. 17. Inicio y finalización del segundo grupo de nivelación virtual en el país. 18. Se finalizó el proceso de matriculación de los estudiantes en primera matrícula en las IES públicas del país. 19. Se completó al 90% la revisión de los informes finales del I SEM 2014, y su correspondiente orden de pago de los contratos de nivelación. 20. Liderazgo pedagógico de la política de democratización en 72 cantones. 21. Implementación de la prueba piloto del Inventario de Intereses Profesionales de Jóvenes a 1344 estudiantes en la provincia de Pichincha, en colaboración con el Prometeo Mariusz Wolonciej. 22. Acompañamiento pedagógico a los contenidos de la plataforma JÓVENES. Habilitación Docente: 23. Aplicación del examen ENES a 1248 docentes para consolidar el proceso de habilitación docente; 24. Lanzamiento de la campaña para la preselección docente que tiene como objetivo, escoger a los mejores perfiles para consolidar un proceso de formación y acompañamiento docente en la educación superior. Seguimiento del Convenio con OEI y consultoría. Transferencias: 25. Para el mes de Septiembre no se realizaron transferencias de recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>	<p>Egas Guayaquil, Galo</p>	<p>03/10/2014 - 06:29 PM</p>
<p>AGOSTO 2014: Logística: 1. Aplicación y recepción del examen Exonera a nivel nacional (HITO ASOCIADO: 65). 2. Lectura óptica y entrega de cadena de respuestas de exámenes Exonera (HITO ASOCIADO: 65). 3. Destrucción del material ENES Marzo 2014. 4. Capacitación a nivel nacional a los funcionarios del Nivel Distrital del MinEduc: Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación, Planificación, y Directores Distritales, para la aplicación del ENES. 5. Talleres a nivel nacional a los funcionarios del Nivel Distrital del MinEduc: Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación, Planificación, y Directores Distritales, para actualizar la base de recintos.</p>	<p>Egas Guayaquil, Galo</p>	<p>05/09/2014 - 05:27 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>6.Levantamiento de oportunidades de mejora y recomendaciones del proceso Exonera.            7.Campaña con Contact Center para verificación de datos de los recintos y de los rectores.            8.Reuniones de trabajo para preparar el ENES de septiembre del 2014.            9.Reunión de trabajo con: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Talento Humano y Administrativo Financiero, para preparar la toma del ENES a nivel nacional y en el exterior.            10.Actualización de organigramas, guías y documentos para el ENES septiembre 2014.            11.Participación en la Audiencia convocada por la Defensoría del Pueblo de Guayaquil para establecer el protocolo de aplicación del examen ENES y EXONERA para la comunidad Adventista.  <b>Apoyo y Seguimiento Académico:</b>            12.Coordinación de la carga de oferta académica en cada proceso: solicitud a las IES, activación de carreras en el sistema según informe de carreras vigentes y seguimiento a carga.            13.Generación de reportes de oferta y demanda académica para las IES.            14.Reuniones con las universidades para promover la racionalización de la oferta.            15.Coordinación del proyecto piloto "Política de Cuotas" (seguimiento a convenios, asignación de becarios, desarrollo de aplicativo y apoyo en generación de sistema de tutorías).            16.Coordinación del proyecto piloto "Acceso a educación superior para personas privadas de libertad".            17.Coordinación con Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica para carga de oferta cerrada.            18.Seguimiento a becas nacionales (IECE).  <b>Grupo GAR:</b>            19.Socializaciones y seguimiento a los procesos GAR de postulación en Cuenca, Quito y Guayaquil.            20.Seguimiento al proyecto "Servicio Civil Ciudadano" del grupo GAR.            21.Reunión con jóvenes GAR V, en proceso de nivelación especial con jóvenes GAR que recién culminaron su primer año de estudios en el exterior (en Quito).  <b>Nivelación:</b>            22.Elaboración de informes para el pago de contratos Nivelación 40% de las IES.            23.Matriculación de estudiantes para Nivelación de carrera.            24.Matriculación y desarrollo de Nivelación general - presencial.            25.Matriculación de Nivelación general - virtual.            26.Acompañamiento a coordinadores de nivelación.  <b>Habilitación Docente:</b>            27.Talleres de validación de estándares de desempeño del MINEDUC, con universidades e institutos, para adaptarlos a los docentes de la nivelación.            28.Diseño y articulación del convenio con la OEI y una Consultoría especializada que permitirá la formación con acompañamiento en el aula de un grupo de docentes de la nivelación para especializarlos en procesos de acompañamiento y la habilitación de los docentes a través de cursos de especialización en Pedagogía y Didáctica.            29.Avances para la formulación del convenio con la OEI para que el CAEU proporcione capacitación disciplinar en el proceso de desarrollo profesional de los docentes de la nivelación y a un grupo de docentes que se especializarán en procesos de acompañamiento.            30.Diseño de instrumentos para seleccionar docentes que se incorporarán a la formación con acompañamiento.            31.Orientaciones al CAEU para diseñar curso de Pedagogía y Didáctica que permitirá la habilitación docente de los profesores de la Nivelación.  <b>Transferencias:</b>            32.Se transfirieron recursos del proyecto emblemá</p>		
<p><b>JULIO 2014:</b>            1.Contratación de servicios para 2014 de El Telégrafo, Comando Logístico (COLOG) para impresión de materiales, elaboración y armado de kits, y entrega en los plazos estipulados (Hito asociado 62).            2.Elaboración de la agenda para el exonera.            3.Gestión de recintos y asignación de estudiantes a los mismos para la toma del EXONERA (Hito asociado 62).            4.Realización de talleres con los funcionarios del Ministerio de Educación (MINEDUC) a nivel nacional para recabar información y hacer encadenamiento de recintos para el ENES (Hito asociado 62).            5.Informe y talleres de capacitación a las IES que van a ser recintos para el EXONERA sobre número de estudiantes y docentes aplicadores así como información general referente al proceso (Hito asociado 62).            6.Selección, comunicación y capacitación al personal de la Senescyt que va a participar en el EXONERA(Hito asociado 62).</p>	<p>Egas Guayaquil, Galo</p>	<p>01/08/2014 - 08:31 AM</p>



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>7.Revisión técnica, limpieza y mantenimiento de lectores ópticos así como lugar físico para la lectura (Hito asociado 62).</p> <p>8.Campaña de comunicación para publicitar el Exonera (Hito asociado 62).</p> <p>9.Coordinación con el INEVAL para la entrega al El Telégrafo de la información para la impresión de los cuadernillos en el Exonera (Hito asociado 62).</p> <p>10.Reunión de trabajo con la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos para coordinar protocolos de seguridad a fin de garantizar la protección de personas y colectividades de los efectos negativos de desastres de origen natural o antrópico que se podrían suscitar en el evento mencionado (Hito asociado 62).</p> <p>11.Acompañamiento administrativo para la salida de 137 estudiantes con carta de aceptación.</p> <p>12.Evento, desayuno de despedida a los estudiantes GAR (con Comunicación).</p> <p>13.Cierre de curso de inglés con British School para GAR V.</p> <p>14.Seguimiento académico a ESPE y ESPOL para inicio de nivelación académica GAR V.</p> <p>15.Inicio de evaluación diagnóstica de inglés para GAR VI.</p> <p>16.Cierre de negociación con OEI para convenio de fortalecimiento de habilidades docentes.</p> <p>17.Cierre de contrato con Universidad de Cuenca.</p> <p>18.Visitas de monitoreo a las IES centro.</p> <p>19.Acompañamiento a Feria Regional de Proyecto Integrador de Saberes en Manta (ULEAM) y Riobamba (ITS Carlos Cisneros).</p> <p>20.Contratos pendientes UNL, ITAE.</p> <p>21.Reuniones de coordinación con unidades de bienestar estudiantil.</p> <p>22.Inicio del proceso de inscripción de aspirantes a la educación superior para la convocatoria ENES septiembre 2014 (Hito asociado: 63).</p> <p>23. Inicio de reuniones y talleres de tutorías para las IES del piloto de política de cuotas.</p> <p>24.Reunión con cooperación internacional para asesoría en proyecto de acceso a educación superior de personas privadas de la libertad.</p> <p>25.Se transfirieron recursos del proyecto "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión" en el presupuesto del Ministerio de Educación, con el objeto de cumplir con el Acuerdo Interinstitucional Nro. 2012-001 del 03 de mayo 2012 con un valor de USD 608,333.00.</p>		
<p>Junio 2014:</p> <p>1. Taller con las zonales para acordar enfoque de monitoreo a la nivelación, se optó por fortalecer la mirada cualitativa. Visita para validar instrumentos a EPN. Elaboración de informes de devolución para cada IES. Tres semanas de visitas a las IES centro del país y Pichincha.</p> <p>2. Cierre de habilitación y perfeccionamiento docente con Universidad de Cuenca. Proyecto final de nivelación para II SEM 2014 y 205.</p> <p>3. Visita de socialización a Guayaquil. Reunión para GAR CT. Inicio de Servicio Civil Ciudadano para GAR IV. Seguimiento a los 120 estudiantes con carta de aceptación para salir al extranjero en el II SEM 2014.</p> <p>4. Proceso de asignación de cupos acorde a calificación ENES y opciones de postulación de los aspirantes para 3 instancias, postulación, repostulación y segunda repostulación (Hito asociado: 60).</p> <p>5. Proceso de aceptación de cupos en las 3 instancias de postulación, repostulación y segunda repostulación, está última etapa terminará el domingo 6 de julio (Hito asociado: 61).</p> <p>6. Implementación del mecanismo de 'Lista de Espera' para aumentar la eficiencia del sistema en la utilización de cupos de la oferta académica.</p> <p>7. Proceso de planificación del EXONERA iniciado con instituciones involucradas (INEVAL entre otras), para los estudiantes que han aceptado rendir el examen a través de la plataforma informática del SNNA al momento de aceptar el cupo asignado (Hito asociado: 61).</p> <p>8. No se realizaron transferencias</p>	Egas Guayaquil, Galo	05/07/2014 - 09:15 PM
<p>Mayo 2014:</p> <p>1. Establecimiento de comisiones técnicas para adjudicación de contratos 2014 a las IES (Hito asociado: 58).</p> <p>2. Elaboración de informes de validación de pago final correspondiente al 1er Semestre 2014 (Hito asociado: 58).</p> <p>3. Reuniones de trabajo con zonales, institutos y sus autoridades en relación a la nivelación (Hito asociado: 58).</p> <p>4. Reubicación de estudiantes en diferentes IES, dado casos de cierre de carreras (Hito asociado: 58).</p> <p>5. Talleres de capacitación con institutos para dar a conocer cambios en nivelación general y de carrera (Hito asociado: 58).</p> <p>6. Campaña de comunicación para los estudiantes que optaron por nivelación general (Hito asociado: 58).</p> <p>7. Validación del sistema y de las interfaces de postulación (Hito asociado: 59).</p> <p>8. Campaña de comunicación para publicitar el proceso de postulación (Hito asociado: 59).</p>	Egas Guayaquil, Galo	03/06/2014 - 04:54 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>9.Monitoreo diario del proceso de postulación y de la plataforma tecnológica (Hito asociado: 59).                      10.Emisión de alertas tempranas a las autoridades de las IES para difundir oferta y desplegar estrategias de promoción en las carreras con bajos niveles de demanda (Hito asociado: 59).                      11. No se realizaron transferencias</p>		
<p>ABRIL 2014:</p> <p>1.Adjudicación en SERCOP de 25 contratos para la nivelación del 2014.                      2.Reunión de coordinación para nivelación en Institutos de Educación Superior.                      3.Matriculación de estudiantes para inicio de nivelación de carrera I SEM 2014.                      4.Novena convocatoria de habilitación docente.                      5.Asesoría para redireccionamiento de oferta académica de todas las universidades públicas.                      6.Gestión de acuerdos del piloto de "Diversidad en el Campus" sobre política de cuotas con 5 universidades auto y cofinanciadas.                      7.Carga de Oferta Académica de las universidades en el Sistema Informático.                      8.Planificación ENES de septiembre/2014                      9. Lectura óptica de los instrumentos de evaluación de este proceso (Hito asociado: 55)                      10. No se realizaron transferencias</p>	CADENA FUERTES, JOSÉ RUPERTO	05/05/2014 - 05:53 PM
<p>MARZO 2014:</p> <p>1.Presentación de formas para la aplicación del ENES. Se construyeron 20 formas para la aplicación del examen el 29 de marzo de 2014. Cada una de las formas tiene una clave única, solamente el personal autorizado por el SNNA manejará esta información al momento de la impresión de las mismas (Hito relacionado: 53).                      2.Capacitación a coordinadores de recinto. Se realizó la capacitación para los 638 coordinadores de recinto a nivel nacional, de los cuales 120 son funcionarios de la SENESCYT (Hito relacionado: 54).                      3.Habilitación de 532 recintos a nivel nacional para la presentación del ENES (Hito relacionado: 52).                      4.Incorporación de las coordinaciones zonales y directores distritales de MINEDUC. Con el fin de dar cumplimiento al acuerdo Interministerial 2014-001 se logró articular la interacción con las Coordinaciones Zonales y Directores Distritales del MINEDUC para implementar la prueba ENES (Hito relacionado: 54).                      5.Se dio cumplimiento con la universalidad y obligatoriedad de la prueba ENES para los Bachilleres de todo el País. Se dio cumplimiento al acuerdo Interministerial 2014-001 en lo que se refiere a la ampliación de la cobertura y obligatoriedad con variadas estrategias como ampliación de períodos de inscripción Y convocatoria a niveles territoriales del MINEDUC y SENESCYT.                      6.Campaña de comunicación. Realización de campaña en diferentes medios como radio, televisión, redes sociales para difusión del ENES, fechas de inscripción, fechas de rendición. Se acompañó con realización de ferias para difusión sobre el Sistema Nacional de Nivelación y Acceso y el Examen Nacional para la Educación Superior.                      7.No se realizaron transferencias</p>	CADENA FUERTES, JOSÉ RUPERTO	04/04/2014 - 03:45 PM
<p>FEBRERO 2014</p> <p>En el período descrito se ejecutaron las siguientes actividades:                      Proceso de inscripción al Examen Nacional para la Educación Superior marzo 2014                      Se procedió a la supervisión de las Instituciones de Educación Superior que imparten los cursos de nivelación.                      Se realizaron los talleres de elaboración y validación de ítems.                      Se asignó USD 816.450,00 (ochocientos dieciséis mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América)sin incluir IVA, para cubrir los costos de nivelación a cargo de los institutos Técnicos y Tecnológicos .</p>	GUANGA CHUNATA, DEYSI MARGOTH	06/03/2014 - 09:56 AM
<p>ENERO 2014:</p> <p>En el período descrito se ejecutaron las siguientes actividades :                      Resultados preliminares del examen de exoneración EXONERA segundo semestre 2013 (hito 47)                      Inicio del proceso de inscripción al ENES marzo 2014 (hito 48)                      Talleres de elaboración y validación de Items para el ENES marzo 2014 (hito 49)                      Publicación de los resultados del examen de exoneración EXONERA segundo semestre 2013 (hito 50)</p>	CADENA FUERTES, JOSÉ RUPERTO	05/02/2014 - 05:19 PM
<p>DICIEMBRE 2013.- De acuerdo al cronograma del componente de Habilitación del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión para el año 2013, con fecha 18 de noviembre 367 docentes se inscriben para rendir el examen para la educación superior ENES, de los cuales 251 rindieron el examen, y 111 aprobaron el mismo; de este grupo 103 docentes asistieron a los cursos de habilitación docentes realizados del 28 de noviembre al 5 de Diciembre, proceso mediante el cual los docentes se capacitan para obtener las herramientas adecuadas y rendir el examen EXHABI.</p>	Ormaza Mejía, Pablo Luis	06/01/2014 - 04:01 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Con fecha 5 de diciembre se aplica el examen EXHABI a 100 aspirantes a la habilitación Docente Entre el 9 y 11 de diciembre se realizó el proceso de Calificación y Entrega de Resultados donde 91 docentes fueron habilitados.</p>		
<p>NOVIEMBRE 2013.- De acuerdo al cronograma del SNNA para el segundo semestre del 2013, y al hito número 42 de este proyecto, los estudiantes quienes obtuvieron en el ENES un puntaje mayor a 600 puntos, pasan al proceso de Postulación donde libre y voluntariamente pueden escoger de 1 hasta 5 opciones de carrera, de la oferta académica brindada por las diferentes Instituciones de Educación Superior (IES) del país; proceso que se realizó entre el 19 de octubre al 3 de Noviembre del presente año. En esta convocatoria el número de cupos asignados fue de 44.417.</p> <p>En relación al hito número 43, cabe recalcar que debido al cambio de fecha de la aplicación del ENES que se realizó el 28 de septiembre 2013, el cronograma de los procesos post aplicación ENES fue modificado, por lo tanto, con fecha 7 de Noviembre del presente año se publica la asignación de cupos del proceso ENES 28 de Septiembre, proceso donde los estudiantes aceptar o rechazan el cupo asignado, una vez finalizado el proceso con fecha 18 de noviembre se da inicio al proceso de re postulación de cupos no demandados o liberados hasta el 24 de noviembre.</p> <p>Con Fecha 13 de Noviembre se realizó una transferencia de recursos por el valor de 223.000,00 USD al Ministerio de Educación, para el pago de los docentes aplicadores ENES de los procesos abril y septiembre 2013.</p>	<p>Reinoso Guevara, Lilian</p>	<p>02/12/2013 - 11:00 AM</p>
<p>OCTUBRE 2013.- De acuerdo al cronograma del Sistema Nacional de Admisión y Nivelación para el II semestre 2013, el 19 de octubre se habilitó la plataforma para la postulación de carrera, proceso mediante el cual los estudiante quienes obtuvieron más de 600 puntos en el ENES pueden escoger voluntariamente 5 opciones de carrera en las instituciones y horarios de su preferencia para posteriormente aspirar a un cupo en una de estas opciones. El proceso de postulación finaliza el 3 de noviembre del presente año.</p> <p>Con fecha 28 de octubre del presente año se llevó a cabo el Taller de Coordinación Estratégica donde se contó con la presencia de las autoridades de las instituciones de educación superior públicas que participan en los procesos del SNNA; con el objetivo de formar alianzas estratégicas con estas instituciones.</p> <p>El Grupo de Alto Rendimiento (GAR) del quinto proceso ENES septiembre 2013, está conformado por 170 estudiantes quienes obtuvieron entre 950 - 989 puntos, por este motivo con fecha 31 de octubre del presente año se llevó a cabo el Taller GAR, para la 5ta generación, donde se informó a los estudiantes y a sus familiares sobre las oportunidades y beneficios de ser parte del grupo GAR, procesos para aplicar a universidades extranjeras, becas, y además se les informó acerca del proceso de Nivelación Especial y los beneficios del mismo.</p>	<p>Reinoso Guevara, Lilian</p>	<p>01/11/2013 - 10:25 AM</p>
<p>Septiembre 2013.- de acuerdo al cronograma establecido para el segundo semestre del 2013, el sábado 28 de septiembre se aplicó a nivel nacional el Examen Nacional para la Educación Superior ENES a 157.000 estudiantes aproximadamente. siendo este un proceso completamente satisfactorio donde se cumplió a cabalidad con los objetivos planteados, manteniendo los protocolos de seguridad lo que dio transparencia y legitimidad al proceso realizado. Cabe recalcar que previo al examen se realizaron las debidas capacitaciones a todo el grupo humano que participó en el proceso y se realizaron los arreglos técnicos y de logística necesarios para la aplicación.</p>	<p>Araujo, Lorena</p>	<p>02/10/2013 - 11:59 PM</p>
<p>AGOSTO 2013.- De acuerdo al cronograma del SNNA, el pasado 3 de Agosto se aplicó por primera vez a nivel nacional, el examen de exoneración EXONERA en 37 recintos académicos del país. 25810 estudiantes rindieron el examen a nivel nacional, el mismo que fue clasificado en 5 áreas de estudio de acuerdo a las carreras ofertadas. La ejecución de la aplicación del EXONERA fue satisfactoria ya que se cumplió en su totalidad los objetivos planteados manteniendo la puntualidad y protocolos de seguridad.</p> <p>Así mismo, con fecha 19 de Agosto, se dio inicio al II Semestre de los cursos de Nivelación a nivel nacional. Se trabajó en todos los aspectos de preparación curricular, es decir, cursos de habilitación docente, distribución de material, asignación de participantes y contacto con las IES involucradas lo que permitió calendarizar las fechas de inicio de la Nivelación tomando en cuenta el régimen Costa y Sierra y ajustarlas para beneficio de los aspirantes. 36.813 aspirantes accedieron a la Nivelación de Carrera y 8850 a la Nivelación General.</p>	<p>Araujo, Lorena</p>	<p>02/09/2013 - 09:35 PM</p>
<p>JULIO 2013: De acuerdo al cronograma de ejecución del SNNA se llevó a cabo el ensamblaje de la herramienta de evaluación para la aplicación nacional del examen de exoneración EXONERA, así como la capacitación a los recintos y al personal que colaborará en la aplicación. A demás del 07 al 09 de julio se realizó el proceso de aceptación de cupos donde un 92,22% de los 50.086</p>	<p>Araujo, Lorena</p>	<p>05/08/2013 - 11:26 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>cupos asignados fueron aceptados por los estudiantes. Con fecha 21 de julio finalizó el proceso de inscripción para el I semestre 2014 que empezó el 15 mayo dónde se registraron 156370 estudiantes. Al mismo tiempo se llevaron a cabo los Talleres de Elaboración y Validación para el ENES en diferentes ciudades del país con la colaboración de docentes de primera línea. En el área de Nivelación se supervisó y se evaluó a nivel nacional los programas de nivelación general y de carrera en las diferentes IES.</p>		
<p>JUNIO 2013: Asignación pública de cupos, proceso donde aproximadamente 50.086 aspirantes accedieron a un cupo reportado por las instituciones de Educación Superior; posteriormente, se realizó el proceso de aceptación de cupos, el mismo que dio paso a la Re postulación, proceso que finaliza el mes de Julio. Se llevó a cabo la ejecución de Talleres de Elaboración y Validación de ítems para el examen de exoneración EXONERA, y la realización del diseño y ensamblaje de la herramienta de evaluación que será aplicada a escala nacional en el mes de julio, actividad que completa el proceso de admisión al Sistema de Educación Superior que inició el 20 de abril para este segundo semestre del 2013 con la toma del Examen Nacional ENES. En el componente de Nivelación, se regularizaron los contratos del primer semestre 2013, 15 contratos adjudicados y 7 en INCOP. Se realizó el proceso de certificación y difusión de habilitación docente donde se habilitaron a 180 docentes; además se acuerdo fecha de inicio de la nivelación especial GAR III y GAR IV.</p>	Araujo, Lorena	01/07/2013 - 03:51 PM
<p>MAYO 2013: Se coordinó y ejecutó con las IES el proceso de construcción de las definiciones operacionales del Examen de Exoneración EXONERA, instrumento que será aplicado a los estudiantes que optaron por rendir este instrumento de evaluación para ingresar directamente a primer año. En el componente de nivelación se habilitó talleres de perfeccionamiento docente para la generación de capacidad profesional instalada que maneje los contenidos curriculares de dicho componente.</p>	Ormaza Mejía, Pablo Luis	03/06/2013 - 02:44 PM
<p>ABRIL 2012: Se aplica el Examen Nacional para la Educación Superior el día 20 de abril a los 147.416 aspirantes registrados en una jornada académica en 221 Recintos Académicos a nivel nacional; en este proceso participaron más de 6000 docentes entre coordinadores nacionales, regionales, de recinto, docentes supervisores y aplicadores. Una vez aplicado el ENES se procedió con el proceso de calificación y emisión de resultados. Al momento, se encuentran los datos en procesos de calibración para la emisión definitiva de resultados.</p>	Cano Cifuentes, Ana Isabel	03/05/2013 - 12:11 PM
<p>MARZO: Se realizan los preparativos para el inicio de los procesos de nivelación a nivel nacional, se capacita a la totalidad de instituciones que participan en el proceso en el manejo de la herramienta informática propia del Componente de Nivelación, así mismo inicia el proceso de capacitación para docentes de nivelación a través del inicio de talleres de desarrollo del pensamiento y metodología del aprendizaje, el cual permite a los docentes luego de la aplicación de una evaluación estandarizada habilitarse para impartir las asignaturas propias de la nivelación. En relación al proceso de admisión, se inician los procesos de impresión de ENES, y el resto de documentación necesaria para la aplicación, se definen los roles de coordinadores, nacionales, regionales y de recinto, y se fijan las fechas para capacitaciones de éste personal a fin de garantizar el éxito en la aplicación del ENES el día 20 de abril.</p>	Cano Cifuentes, Ana Isabel	04/04/2013 - 12:34 PM
<p>FEBRERO 2013: Durante este mes se han ejecutado los procesos planificados en relación a la implementación del componente de nivelación, en relación a los procesos de contratación de la plataforma informática, capacitación a los funcionarios de las instituciones de educación superior que implementarán los procesos en cada una de ellas, socialización de los procesos a los aspirantes que obtuvieron un cupo, y pre- registro de los mismos. En cuanto al proceso de admisión se concluyó con el periodo de registro de aspirantes que no obtuvieron cupo en para el primer periodo académico 2013, a fin de que puedan presentarse al Examen Nacional para la Educación Superior del segundo periodo académico 2013 y no tengan retraso en el inicio de las actividades académicas, se preparan los envíos para de los documentos para la imprenta, y demás insumos para la aplicación de la evaluación.</p>	Cano Cifuentes, Ana Isabel	04/03/2013 - 07:24 PM
<p>ENERO 2013: Durante este periodo se emitieron los resultados del proceso de asignación de cupos, en el que aproximadamente 47.000 aspirantes accedieron a un cupo de los reportados por las instituciones de educación superior, durante éste periodo también se receptan las decisiones de aceptación y rechazo de cupo, éste último periodo finalizará en el mes de febrero. Entre las actividades del mes se han llevado adelante las respectivas planificaciones y avances de procesos de contratación y firma de convenios que asegurarán las aplicaciones correspondientes al año 2013.</p>	Cano Cifuentes, Ana Isabel	04/02/2013 - 06:06 PM
<p>DICIEMBRE: Se ejecuta el proceso de postulación a partir del día 10 de diciembre, se presentaron 97.818 aspirantes a rendir el examen. El proceso de postulación se inició sin ninguna dificultad, el plazo de postulación vence el día 10 de enero; a partir de esa fecha se planificarán los procesos de asignación y reasignación de cupos.</p>	Cano Cifuentes, Ana Isabel	08/01/2013 - 09:49 AM
<p>NOVIEMBRE: Se ejecuta la aplicación de la Tercera versión del Examen Nacional para la Educación Superior, se inscriben 138.998 aspirantes quienes se distribuyen en 267 recintos</p>	Cano Cifuentes, Ana Isabel	30/11/2012 - 08:22 AM

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
a nivel nacional, participan 6500 docentes aproximadamente los mismos que a la misma hora realizan esta actividad de manera ordenada, para el día 30 de noviembre, se ha finalizado el proceso de lectura óptica y se preparan los resultados y análisis estadísticos para la publicación de resultados planificada para el día 5 de diciembre.		
<p>OCTUBRE 2012: Se realizan las impresiones de los cuadernillos del ENES y demás material para la aplicación; se relizan las capacitaciones a los 267 docentes coordinadores de recinto, 55 coordinadores regionales y 10 coordinadores nacionales; de la misma forma se llevan adelante las capacitaciones a los Rectores de los recintos académicos, se realizan las campañas de difusión correspondientes a la convocatoria al ENES para 138998 aspirantes que se presentarán a rendir la evaluación.</p> <p>SEPTIEMBRE 2012: Se realizan los ajustes al proceso de asignación de recintos académicos para la aplicación del ENES de noviembre. Se entregan para reproducción las 12 formas del ENES en el IGM. Se cuenta con 132.500 aspirantes para el primer periodo académico de 2013. Se inician los procesos de capacitación docente para la aplicación del ENES a Coordinadores Nacionales, Regionales y de Recinto.</p> <p>AGOSTO 2012: Se han enviado al equipo de construcción del ENES los reactivos validados para el inicio del proceso de calibración y ensamble para la entrega a impresión en septiembre, se inicia el periodo de inscripciones para el primer periodo académico.</p> <p>JULIO 2012: Se desarrollan reactivos a fin de contar con pilotos para la aplicación de noviembre 2012, se realizan los ajustes a la plataforma informática para el registro de aspirantes.</p> <p>JUNIO 2012: Se realiza la planificación de los talleres de elaboración y validación de reactivos para el mes de julio.</p> <p>ENERO - MAYO 2012: Se ejecutó la primera versión del ENES en cinco instituciones piloto, en convenio con la ESPE.</p> <p>MARZO - DICIEMBRE 2011: Se desarrolló la plataforma informática, desde el ensamble físico, hasta lograr su operatividad, se aplicó una primera versión del ENES como piloto.</p>	Cano Cifuentes, Ana Isabel	09/11/2012 - 03:49 PM

*Problemas cerrados: 3*

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	<b>5- PROYECTO. Técnico.</b> Una falla en la conectividad con el proveedor informático CAUSARÍA que no se pueda dar acceso a las plataformas informáticas.	09/03/2015	Lorena Araujo	20 %	80	16	0/1

*Riesgos cerrados: 10*

## LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Carchi > Toda la Provincia del Carchi
2	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas
3	Zona 1 - Norte > Imbabura > Toda la Provincia de Imbabura
4	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios
5	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Toda la Provincia de Napo
6	Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Toda la Provincia de Orellana
7	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha
8	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo
9	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Toda la Provincia de Cotopaxi
10	Zona 3 - Centro > Pastaza > Toda la Provincia de Pastaza
11	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Toda la Provincia de Tungurahua
12	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
13	Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Toda la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas
14	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Toda la Provincia de Bolívar
15	Zona 5 - Litoral > Galápagos > Toda la Provincia de Galapagos
16	Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas
17	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Toda la Provincia de Los Ríos
18	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Toda la Provincia de Santa Elena
19	Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay
20	Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar
21	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago
22	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro
23	Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja
24	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipec > Toda la Provincia de Zamora Chinchipe

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Equipo de trabajo definido.	4-Inicio de Trabajo	01/05/2011		01/05/2011		Sí	10.0
2	PLANEACIÓN: Solicitud dictamen de prioridad Aprobada	4-Inicio de Trabajo	20/12/2011		20/12/2011		Sí	10.0
3	EJECUCIÓN: Talleres de validación de Reactivos realizados.	4-Inicio de Trabajo	02/01/2012		02/01/2012		Sí	1.0
4	EJECUCIÓN: Calibrado y ensamblado del ENES elaborado.	4-Inicio de Trabajo	17/09/2012		17/09/2012		Sí	1.5
5	EJECUCIÓN: Nóminas de postulantes registrados al IGM para reproducción entregadas.	4-Inicio de Trabajo	10/10/2012		10/10/2012		Sí	1.0
6	EJECUCIÓN: Reproducción y distribución del ENES a Recintos académicos realizada.	1-Solicitud de Información	23/11/2012		23/11/2012		Sí	0.5
7	EJECUCIÓN: Aplicación del ENES realizada.	1-Solicitud de Información	24/11/2012		24/11/2012		Sí	3.0
8	EJECUCIÓN: Prueba de ítems en pilotaje efectuada.	4-Inicio de Trabajo	24/11/2012		24/11/2012		Sí	1.0
9	EJECUCIÓN: Resultados ENES publicados.	1-Solicitud de Información	05/12/2012		05/12/2012		Sí	1.0
10	EJECUCIÓN: Proceso de postulación iniciado.	1-Solicitud de Información	10/12/2012		10/12/2012		Sí	1.0
11	EJECUCIÓN: TDR de la institución que administrará el proceso de Habilitación y Perfeccionamiento de docentes elaborado.	9-Entregables Formales	04/01/2013		09/01/2013		Sí	0.25
12	EJECUCIÓN: Plataforma informática para la recopilación de la información de los docentes que impartirán los cursos de nivelación implementada.	4-Inicio de Trabajo	25/01/2013		25/01/2013		Sí	0.5
13	EJECUCIÓN: Selección final de los docentes para impartir	5-Entregables Intermedios	08/02/2013		08/02/2013		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	los cursos de nivelación realizada.							
14	EJECUCIÓN: Difusión de los docentes seleccionados y recopilación de la documentación correspondiente realizada.	9-Entregables Formales	15/02/2013		15/02/2013		Sí	0.25
15	EJECUCIÓN: Convocatoria en los medios de comunicación del país a docentes que desean participar en el proceso de nivelación.	2-Publicación de Pliegos	22/02/2013		22/02/2013		Sí	0.5
16	EJECUCIÓN: Curso de habilitación: Habilidades de Desarrollo del Pensamiento (40 horas) ejecutado.	4-Inicio de Trabajo	01/03/2013		01/03/2013		Sí	0.5
17	EJECUCIÓN: Calificación y publicación de resultados de proceso de habilitación docente desarrollado.	9-Entregables Formales	08/03/2013		08/03/2013		Sí	0.25
18	EJECUCIÓN: Curso de habilitación: Universidad y Buen Vivir (25 horas) ejecutado.	4-Inicio de Trabajo	15/03/2013		15/03/2013		Sí	0.5
19	EJECUCIÓN: Curso de habilitación: Tecnologías de la información y comunicación (32 horas) ejecutado.	4-Inicio de Trabajo	25/03/2013		25/03/2013		Sí	0.5
20	EJECUCIÓN: Proceso de contratación pública para la implementación del Curso de Nivelación General en el país realizado.	2-Publicación de Pliegos	25/03/2013		25/03/2013		Sí	0.25
21	EJECUCIÓN: Calibración y ensamblaje del ENES elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/03/2013		30/03/2013		Sí	0.75
22	EJECUCIÓN: Nóminas de postulantes registrados al IGM para reproducción entregadas.	5-Entregables Intermedios	30/03/2013		30/03/2013		Sí	0.25
23	EJECUCIÓN: Talleres de Elaboración y validación de Reactivos realizados	4-Inicio de Trabajo	30/03/2013		30/03/2013		Sí	0.75
24	EJECUCIÓN: Curso de habilitación: Nuevas Metodologías de Aprendizaje (40 horas).	4-Inicio de Trabajo	04/04/2013		04/04/2013		Sí	0.25
25	EJECUCIÓN: Aplicación del ENES realizada.	5-Entregables Intermedios	20/04/2013		20/04/2013		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN: Prueba de ítems en pilotaje efectuada.	5-Entregables Intermedios	02/05/2013		02/05/2013		Sí	0.25
27	EJECUCIÓN: Resultados del ENES publicados.	9-Entregables Formales	02/05/2013		02/05/2013		Sí	0.5
28	EJECUCIÓN: Proceso de postulación iniciado.	4-Inicio de Trabajo	13/05/2013		13/05/2013		Sí	0.5
29	EJECUCIÓN: Proceso de Registro para ENES 05 iniciado	1-Solicitud de Información	20/05/2013		20/05/2013		Sí	0.5
30	EJECUCIÓN: Curso de perfeccionamiento docente: Areas disciplinarias (48 horas) ejecutado.	1-Solicitud de Información	03/06/2013		03/06/2013		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
31	EJECUCIÓN: Resultados de Asignación de cupos publicados.	5-Entregables Intermedios	10/06/2013		07/06/2013		Sí	0.25
32	EJECUCIÓN: Resultados finales del ENES publicados.	9-Entregables Formales	16/06/2013		15/06/2013		Sí	0.5
33	EJECUCIÓN: Proceso de Repostulación iniciado.	5-Entregables Intermedios	18/06/2013		15/06/2013		Sí	0.25
34	EJECUCIÓN: Proceso de Nivelación Grupo de Alto Rendimiento (GAR) iniciado.	5-Entregables Intermedios	05/07/2013		05/07/2013		Sí	0.75
35	EJECUCIÓN: Asignación de Cupos II Semestre 2013 realizada.	5-Entregables Intermedios	12/07/2013		12/07/2013		Sí	0.5
36	EJECUCIÓN: Monitoreo Nivelación periodo Marzo - Agosto ejecutado.	5-Entregables Intermedios	15/07/2013		15/07/2013		Sí	0.5
37	EJECUCIÓN: Proceso inscripción para ENES I Semestre 2014 realizado.	1-Solicitud de Información	15/07/2013		15/07/2013		Sí	0.5
38	EJECUCIÓN: Aplicación del Examen de Exoneración EXONERA realizado.	5-Entregables Intermedios	09/08/2013		09/08/2013		Sí	1.0
39	EJECUCIÓN: Formas para la aplicación ENES I Semestre 2014 elaborado.	5-Entregables Intermedios	21/08/2013		21/08/2013		Sí	0.25
40	EJECUCIÓN: Proceso de Nivelación General y de Carrera Agosto 2013-Enero 2014 iniciado.	5-Entregables Intermedios	26/08/2013		26/08/2013		Sí	1.0
41	EJECUCIÓN: Aplicación ENES I Semestre 2014" realizada.	5-Entregables Intermedios	04/10/2013		04/10/2013		Sí	0.25
42	EJECUCIÓN: Docentes para impartir el componente de nivelación habilitados.	5-Entregables Intermedios	15/10/2013		15/10/2013		Sí	0.25
43	EJECUCIÓN: Proceso de Postulación I Semestre 2014 finalizado.	5-Entregables Intermedios	25/10/2013		18/11/2013		Sí	0.25
44	EJECUCIÓN: Proceso de Repostulación I Semestre 2014 finalizado.	1-Solicitud de Información	15/11/2013		26/11/2013		Sí	0.25
45	EJECUCIÓN: Proceso de Nivelación General y de Carrera 2013 finalizado.	1-Solicitud de Información	20/11/2013		20/11/2013		Sí	0.75
46	EJECUCIÓN: Resultados finales ENES I Semestre 2014 publicados.	1-Solicitud de Información	06/12/2013		06/12/2013		Sí	0.5
47	EJECUCIÓN: Resultados Examen Nacional para la Educación Superior ENES publicados año 2013.	5-Entregables Intermedios	27/12/2013		27/12/2013		Sí	0.0
48	EJECUCIÓN: Resultados preliminares del examen de exoneración EXONERA segundo semestre 2013 Realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2014		31/01/2014		Sí	0.62
49	EJECUCIÓN: Proceso de inscripción al ENES marzo 2014 Iniciado	5-Entregables Intermedios	14/02/2014		14/02/2014		Sí	0.63
50	EJECUCIÓN: Supervisión a las Instituciones de Educación	5-Entregables Intermedios	15/02/2014		15/02/2014		Sí	0.63



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Superior que imparten la Nivelación Realizado							
51	EJECUCIÓN: Talleres de elaboración y validación de ltems para el ENES marzo 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	15/02/2014		15/02/2014		Sí	0.63
52	EJECUCIÓN: Número de estudiantes registrados a rendir el ENES marzo 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	25/02/2014		25/02/2014		Sí	0.63
53	EJECUCIÓN: Número de recintos habilitados a escala nacional para el proceso de aplicación del ENES Realizado	5-Entregables Intermedios	02/03/2014		02/03/2014		Sí	0.63
54	EJECUCIÓN: Presentación de formas para la aplicación del ENES marzo 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	05/03/2014		05/03/2014		Sí	0.63
55	EJECUCIÓN: Capacitación a coordinadores nacionales, territoriales, de recinto Realizado	5-Entregables Intermedios	20/03/2014		20/03/2014		Sí	0.63
56	EJECUCIÓN: Aplicación del ENES 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	05/04/2014		04/04/2014		Sí	0.63
57	EJECUCIÓN: Publicación de resultados del ENES marzo 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	05/05/2014		28/04/2014		Sí	0.63
58	EJECUCIÓN: Curso de nivelación primer semestre 2014 Iniciado	5-Entregables Intermedios	30/05/2014		30/05/2014		Sí	0.63
59	EJECUCIÓN: Proceso de postulación Realizado	5-Entregables Intermedios	30/05/2014		26/05/2014		Sí	0.63
60	EJECUCIÓN: Proceso de asignación del ENES marzo 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	05/06/2014		30/05/2014		Sí	0.63
61	EJECUCIÓN: Informe de postulantes que han aceptado rendir el EXONERA Realizado	5-Entregables Intermedios	24/06/2014		24/06/2014		Sí	0.63
62	EJECUCIÓN: Aplicación del examen de exoneración Exonera primer semestre 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	20/07/2014		20/07/2014		Sí	0.63
63	EJECUCIÓN: Inicio del proceso de inscripción al ENES septiembre 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	26/07/2014		26/07/2014		Sí	0.63
64	EJECUCIÓN: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten la Nivelación Realizado	5-Entregables Intermedios	10/08/2014		10/08/2014		Sí	0.63
65	EJECUCIÓN: Publicación de los resultados del examen de exoneración EXONERA primer semestre 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	20/08/2014		01/09/2014		Sí	0.63
66	EJECUCIÓN: Presentación de formas para la aplicación del ENES septiembre 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	20/09/2014		19/09/2014		Sí	0.63
67	EJECUCIÓN: Aplicación del ENES septiembre 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	03/10/2014		03/10/2014		Sí	0.63
68	EJECUCIÓN: Número de estudiantes registrados a rendir	5-Entregables Intermedios	04/10/2014		03/10/2014		Sí	0.63

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	el ENES septiembre 2014 Realizado							
69	EJECUCIÓN: Curso de nivelación segundo semestre 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	05/10/2014		03/10/2014		Sí	0.63
70	EJECUCIÓN: Publicación de resultados del ENES septiembre 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	06/10/2014		03/10/2014		Sí	0.63
71	EJECUCIÓN: Proceso de postulación Iniciado	5-Entregables Intermedios	19/10/2014		10/11/2014		Sí	0.63
72	EJECUCIÓN: Publicación de resultados de asignación del ENES septiembre 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	29/11/2014		08/12/2014		Sí	0.63
73	EJECUCIÓN: Número de postulantes que han aceptado rendir el EXONERA Realizado	5-Entregables Intermedios	19/12/2014		12/01/2015		Sí	0.63
74	EJECUCIÓN: Aplicación del examen de exoneración Exonera segundo semestre 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	28/12/2014		09/02/2015		Sí	0.63
75	EJECUCIÓN: Convocatoria a docentes que desean participar en el proceso de nivelación Iniciado	9-Entregables Formales	14/01/2015		14/01/2015		Sí	0.2
76	EJECUCIÓN: Publicación de resultados de asignación en tercera postulación del ENES II Semestre 2014 Realizado	9-Entregables Formales	16/01/2015		16/01/2015		Sí	0.2
77	EJECUCIÓN: Proceso de inscripción al ENES I Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	19/01/2015		19/01/2015		Sí	0.2
78	EJECUCIÓN: Plataforma informática para la recopilación de la información de los docentes que impartirán los cursos de nivelación implementada Iniciado	9-Entregables Formales	20/01/2015		20/01/2015		Sí	0.2
79	EJECUCIÓN: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten la Nivelación Realizado	9-Entregables Formales	28/01/2015		28/01/2015		Sí	0.2
80	EJECUCIÓN: Aplicación del ENES Docente Realizado	9-Entregables Formales	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.2
81	EJECUCIÓN: Número de estudiantes registrados a rendir el ENES I Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	10/02/2015		10/02/2015		Sí	0.2
82	EJECUCIÓN: Convocatoria a docentes que desean participar en el proceso de nivelación Iniciado	9-Entregables Formales	11/02/2015		11/02/2015		Sí	0.2
83	EJECUCIÓN: Calificación y publicación de resultados de proceso de habilitación docente desarrollado Realizado	9-Entregables Formales	16/02/2015		16/02/2015		Sí	0.2
84	EJECUCIÓN: Publicación de los resultados del examen de exoneración EXONERA I Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	16/02/2015		09/03/2015		Sí	0.2




HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
85	EJECUCIÓN: Socialización de información con las IES para racionalización de la oferta Realizado	9-Entregables Formales	06/03/2015		06/03/2015		Sí	0.2
86	EJECUCIÓN: Aplicación del ENES Docente Realizado	9-Entregables Formales	10/03/2015		10/03/2015		Sí	0.2
87	EJECUCIÓN: Capacitación a coordinadores nacionales, territoriales, de recinto Realizado	9-Entregables Formales	15/03/2015		13/03/2015		Sí	0.2
88	EJECUCIÓN: Aplicación del ENES I Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	23/03/2015		23/03/2015		Sí	0.2
89	EJECUCIÓN: Convocatoria a docentes que desean participar en el proceso de nivelación Iniciado	9-Entregables Formales	01/04/2015	01/04/2015			No	0.2
90	EJECUCIÓN: Curso de nivelación I Semestre 2015 Iniciado	9-Entregables Formales	13/04/2015	13/04/2015			No	0.2
91	EJECUCIÓN: Publicación de resultados del ENES I Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	25/04/2015	25/04/2015			No	0.2
92	EJECUCIÓN: Aplicación del ENES Docente Realizado	9-Entregables Formales	27/04/2015	27/04/2015			No	0.2
93	EJECUCIÓN: Calificación y publicación de resultados de proceso de habilitación docente desarrollado Realizado	9-Entregables Formales	04/05/2015	04/05/2015			No	0.2
94	EJECUCIÓN: Proceso de postulación Iniciado	9-Entregables Formales	13/05/2015	13/05/2015			No	0.2
95	EJECUCIÓN: Curso de habilitación: Pedagogía y Didáctica	9-Entregables Formales	20/05/2015	20/05/2015			No	0.2
96	EJECUCIÓN: Publicación de resultados de asignación en postulación del ENES I Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	05/06/2015	05/06/2015			No	0.2
97	EJECUCIÓN: Proceso de segunda postulación Iniciado	9-Entregables Formales	12/06/2015	12/06/2015			No	0.2
98	EJECUCIÓN: Publicación de resultados de asignación en segunda postulación del ENES I Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	20/06/2015	20/06/2015			No	0.2
99	EJECUCIÓN: Proceso de inscripción al ENES II Semestre 2015 Iniciado	9-Entregables Formales	25/06/2015	25/06/2015			No	0.2
100	EJECUCIÓN: Publicación de resultados de asignación en tercera postulación del ENES I Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	06/07/2015	06/07/2015			No	0.2
101	EJECUCIÓN: Número de postulantes que han aceptado rendir el EXONERA Realizado	9-Entregables Formales	16/07/2015	16/07/2015			No	0.2
102	EJECUCIÓN: Proceso de tercera postulación Iniciado	9-Entregables Formales	27/07/2015	27/07/2015			No	0.2
103	EJECUCIÓN: Aplicación del examen de exoneración Exonera I Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	01/08/2015	01/08/2015			No	0.2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
104	EJECUCIÓN: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten la Nivelación Realizado	9-Entregables Formales	05/08/2015	05/08/2015			No	0.2
105	EJECUCIÓN: Número de estudiantes registrados a rendir el ENES II Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	14/08/2015	14/08/2015			No	0.2
106	EJECUCIÓN: Publicación de los resultados del examen de exoneración EXONERA II Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	25/08/2015	25/08/2015			No	0.2
107	EJECUCIÓN: Curso de nivelación especial de GAR 5 Realizado	9-Entregables Formales	31/08/2015	31/08/2015			No	0.2
108	EJECUCIÓN: Curso de nivelación especial de GAR 6 Realizado	9-Entregables Formales	31/08/2015	31/08/2015			No	0.2
109	EJECUCIÓN: Curso de nivelación II Semestre 2015 Iniciado	9-Entregables Formales	05/09/2015	05/09/2015			No	0.2
110	EJECUCIÓN: Socialización de información con las IES para racionalización de la oferta Realizado	9-Entregables Formales	18/09/2015	18/09/2015			No	0.2
111	EJECUCIÓN: Capacitación a coordinadores nacionales, territoriales, de recinto Realizado	9-Entregables Formales	24/09/2015	24/09/2015			No	0.2
112	EJECUCIÓN: Aplicación del ENES II Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	28/09/2015	28/09/2015			No	0.2
113	EJECUCIÓN: Publicación de resultados del ENES II Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	30/10/2015	30/10/2015			No	0.2
114	EJECUCIÓN: Curso de formación: Especialidad en Matemáticas Realizado	9-Entregables Formales	04/11/2015	04/11/2015			No	0.2
115	EJECUCIÓN: Proceso de postulación Iniciado	9-Entregables Formales	09/11/2015	09/11/2015			No	0.2
116	EJECUCIÓN: Publicación de resultados de asignación en postulación del ENES II Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	04/12/2015	04/12/2015			No	0.2
117	EJECUCIÓN: Curso de formación: Especialidad en Matemáticas Realizado	9-Entregables Formales	05/12/2015	05/12/2015			No	0.2
118	EJECUCIÓN: Proceso de segunda postulación Iniciado	9-Entregables Formales	11/12/2015	11/12/2015			No	0.2
119	EJECUCIÓN: Publicación de resultados de asignación en segunda postulación del ENES II Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	19/12/2015	19/12/2015			No	0.4
120	EJECUCIÓN: Proceso de capacitación sobre el acceso a la educación superior ecuatoriana Realizado	9-Entregables Formales	20/12/2015	20/12/2015			No	0.2
121	EJECUCIÓN: Supervisión a las Instituciones de Educación	9-Entregables Formales	23/12/2015	23/12/2015			No	0.4


**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Superior que imparten la Nivelación Realizado							
122	EJECUCIÓN: Avance Físico 2016	9-Entregables Formales	31/12/2016	31/12/2016			No	11.0
123	EJECUCIÓN: Avance Físico 2017	9-Entregables Formales	30/12/2017	30/12/2017			No	5.2
124	CIERRE: Informe de Cierre	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2017	31/12/2017			No	10.0

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Proceso de aplicación del proyecto en Zamora Chinchipe"	Guamán Cajas, Victor Carlos	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	29/01/2015
2	SUPERVICION AL PROYECTO	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	30/11/2014
3	Verificación del desarrollo del proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	23/09/2014
4	Aplicación del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión en Galápagos	Torres Pallo, Jorge	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	30/05/2014
5	Proyecto ejecutandose segun lo programado	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	29/05/2014
6	Proyecto en ejecución de acuerdo a lo planificado en Orellana.	Herrera Jaramillo, Ramiro Vicente	{PR} - Provincia - ORELLANA	27/05/2014
7	Supervisión del Proyecto	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	18/03/2014
8	Supervisión	Taboada Salazar, Wilmer Roberto	{PR} - Provincia - IMBABURA	15/03/2014

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de cupos aceptados en los procesos de postulación y repostulación		-	-	-	01/01/2012	-


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	3,075,893.46
Estimado Al Fin Del Proyecto:	229,475,534.65 **
Costo Total:	300,275,442.26
Total Devengado:	86,295,757.71
% Costo Total Devengado:	28.74 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 28.74 %

**Perfil Económico 2015**

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	76,461,351.52	27,278,581.62	116,448,126.80	<b>220,188,059.94</b>
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Ppto. Aprobado Inicial	42,227,415.36	37,631,820.96	0.00	<b>79,859,236.32</b>
Ppto. Codificado	100,968,428.44	31,251,072.27	0.00	<b>132,219,500.71</b>
Ppto. Comprometido	28,353,139.04	1,954,324.20	0.00	<b>30,307,463.24</b>
Planeado - Codificado (2015)		-3,972,490.65		
Programado a Devengar	101,796,151.11	27,343,581.92	0.00	<b>129,139,733.03</b>
Ppto. Devengado	85,683,825.93	611,931.78	0.00	<b>86,295,757.71</b>
Estimado a fin de año	* 85,683,825.93	6,444,762.37	0.00	<b>92,128,588.30</b>
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	16,112,325.18	20,898,819.55	0.00	<b>37,011,144.73</b>
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 84.17 %	2.24 %	0.00 %	<b>66.82 %</b>
Ppto. Codificado 998	815,544.38	3,825,396.14	0.00	<b>4,640,940.52</b>
Ppto. Devengado 998	336,000.00	0.00	0.00	<b>336,000.00</b>

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015**

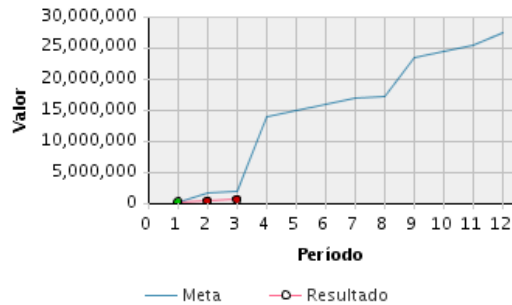

**Presupuesto Mensual 2015**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	138,494.84	138,494.84	138,494.84	138,494.84	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	0.51 %

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	1,535,149.26	234,751.45	1,673,644.10	373,246.29	22.30 %		1.37 %
Mar	260,564.35	238,685.49	1,934,208.45	611,931.78	31.64 %		2.24 %
Abr	11,960,462.09		13,894,670.54				
May	966,847.30		14,861,517.84				
Jun	963,664.16		15,825,182.00				
Jul	1,074,946.65		16,900,128.65				
Ago	255,356.77		17,155,485.42				
Sep	6,168,745.58		23,324,231.00				
Oct	1,040,927.13		24,365,158.13				
Nov	979,744.14		25,344,902.27				
Dic	1,998,679.65		27,343,581.92				
<b>Total</b>	<b>27,343,581.92</b>	<b>611,931.78</b>					

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
3	Disminuir el porcentaje de cupos rechazados en el proceso de asignación y reasignación de cupos MEDIANTE el diseño de estrategias de comunicación dirigida hacia los usuarios/as del Sistema a fin de difundir y ampliar el conocimiento de las herramientas del SNNA en relación a la oferta académica vigente de las IES
4	Incrementar la eficiencia del Sistema Nacional de Nivelación MEDIANTE la habilitación y perfeccionamiento docente; diseño curricular y pedagógico del curso de nivelación; diseño y gestión de la supervisión educativa a las Instituciones de Educación Superior que impartirán los cursos de nivelación; diseño e implementación de instrumentos de evaluación docente; y gestión de convenios y contratos con las Instituciones de Educación Superior.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1.ASOCIACION HITO 1.- Documento de Proyecto del SNNA	A.1.pdf	28/05/2014
2	A.2.ASOCIACION HITO 2.- Dictamen de prioridad del proyecto SNNA	A.2.pdf	28/05/2014
3	A.3.ASOCIACION HITO 3.- Entrega del material noviembre 2012	A.3.pdf	22/11/2013
4	A.4.ASOCIACION HITO 3.- Contrato con la brigada logística para distribución del enes a los recintos académicos para su aplicación	A.4.pdf	22/11/2013
5	A.5.ASOCIACION HITO 4.-Convocatoria para la aplicación del ENES 24 de noviembre	A.5.pdf	25/11/2013
6	A.6.ASOCIACION HITO 5.- Nóminas de postulantes registrados al IGM para reproducción entregadas	A.6.pdf	26/11/2013
7	A.7.ASOCIACION HITO 6.- Reproducción y distribución del ENES a Recintos académicos realizada.	A.7.pdf	26/11/2013
8	A.8.ASOCIACION HITO 7.- Informe ejecución febrero 2012	A.8.pdf	26/11/2013
9	A.9.ASOCIACION HITO 9.- Resultados ENES mayo 2012 publicados	A.9.pdf	05/12/2013
10	B.1.ASOCIACION HITO 11 .- TDR habilitación y perfeccionamiento docente	B.1.pdf	05/12/2013
11	B.2.ASOCIACION HITO 12.- Plataforma Informática	B.2.pdf	05/12/2013
12	B.3.ASOCIACION HITO 14.- Difusión docentes habilitados	B.3.pdf	05/12/2013
13	B.4.ASOCIACION HITO 15 .- Convocatoria capacitación para habilitación docente	B.4.pdf	05/12/2013

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
14	B.5.ASOCIACION HITO 18.- Cronograma de habilitación docente	B.5.pdf	05/12/2013
15	B.6.ASOCIACION HITO 19.-Programación curso habilitación docente	B.6.pdf	05/12/2013
16	B.7.ASOCIACION HITO 20.- Contratación pública proceso de nivelación a nivel nacional	B.7.pdf	08/12/2013
17	B8.ASOCIACION HITO 20.- Actualización del hito Proceso de contratación pública para la implementación del curso de nivelación general en el país	B8.pdf	14/01/2014
18	B9.ASOCIACION HITO 22.- Nominas de postulantes registrados entregadas a IGM	B9.pdf	14/01/2014
19	C.1.ASOCIACION HITO 25.- ENES aplicado	C.1.pdf	14/01/2014
20	C.2.ASOCIACION HITO 27.- Informe parcial de aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior del mes de noviembre 2012	C.2.pdf	14/01/2014
21	C.3.ASOCIACIÓN HITO 30.- Curso de perfeccionamiento docente (48 horas) ejecutado	C.3.pdf	14/01/2014
22	C.4.ASOCIACIÓN HITO 31.- resultado de asignación de cupos publicados	C.4.pdf	14/01/2014
23	C.5.ASOCIACION HITO 32 .- Resultados finales del ENES publicados	C.5.pdf	14/01/2014
24	C.6.ASOCIACIÓN HITO 33.- Proceso de repostulación realizado	C.6.pdf	14/01/2014
25	C.7.ASOCIACION HITO 34.- Informe nivelación GAR, iniciado del 5 junio al 20 diciembre 2013	C.7.pdf	14/01/2014
26	C.8.ASOCIACION HITO 35.- Informe final asignación de cupos enes 20 abril 2013	C.8.pdf	14/01/2014
27	C.9.ASOCIACION HITO 37.- Informe inscritos ENES primer semestre 2014	C.9.pdf	14/01/2014
28	D.1.ASOCIACION HITO 36.- Informe nivelación carrera y general iniciada	D.1.pdf	14/01/2014
29	D.2.ASOCIACIÓN HITO 38.- EXONERA aplicado	D.2.pdf	14/01/2014
30	D.3.ASOCIACIÓN HITO 39.- Formas para ENES primer semestre 2014	D.3.pdf	14/01/2014
31	D.4.ASOCIACION HITO 40.- Proceso de nivelación general y carrera agosto 2013-enero 2014 iniciado	D.4.pdf	14/01/2014
32	D.5.ASOCIACION HITO 41.- Aplicación ENES primer semestre 2014 realizada	D.5.pdf	14/01/2014
33	D.6.ASOCIACIÓN HITO 42.- Habilitación docente	D.6.pdf	14/01/2014
34	D.7.ASOCIACION HITO 43 .- Proceso de postulación finalizado	D.7.pdf	14/01/2014
35	D.8.ASOCIACION HITO 44.- Proceso de repostulación primer semestre 2014 finalizado.	D.8.pdf	14/01/2014
36	D.9.ASOCIACION HITO 45.- Nivelación genera y de carrera finalizada	D.9.pdf	14/01/2014
37	E.1.ASOCIACION HITOS 43 Y 44 .- Justificativo retraso hitos 43, 44	E.1.pdf	14/01/2014
38	E.2.ASOCIACION HITO 46 .- Nivelación primer semestre 2013 finalizado	E.2.pdf	14/01/2014
39	E.3.ASOCIACION HITO 47 .- Resultados finales primer semestre 2014 publicados	E.3.pdf	14/01/2014
40	E.4.ASOCIACION HITO 48 .- Resultados del EXONERA primer semestre 2014	E.4.pdf	14/01/2014
41	E.5. Ilustración del proceso del SNNA	E.5.pdf	14/01/2014



**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
42	E.6.ASOCIADO AL HITO 48.- Informe del proceso ENES septiembre 2013 con resultados comparativos de asignación y aceptación de cupos	E.6.pdf	05/02/2014
43	E.7.ASOCIACION HITO 49.- Informe del proceso de inscripción al ENES marzo 2014	E.7.pdf	20/02/2014
44	E.8.ASOCIACION HITO 50 - Informe de la supervisión de la Instituciones de Educación Superior que imparten los cursos de nivelación	E.8.pdf	20/02/2014
45	E.9.ASOCIACION HITO 51 - Informe de los talleres de elaboración y validación de Items	E.9.pdf	20/02/2014
46	F.1. ASOCIADO AL HITO 52.- Informe del proceso de inscripción al Examen Nacional para la Educación Superior	F.1.pdf	06/03/2014
47	F.2.ASOCIACIÓN HITO 53: Número de recintos habilitados a escala nacional para el proceso de aplicación del ENES Realizado	F.2.pdf	25/03/2014
48	F.3.ASOCIACIÓN HITO 54: Presentación de formas para la aplicación del ENES marzo 2014 Realizado	F.3.pdf	25/03/2014
49	F.4. Reporte e-SIGEF febrero 2014	F.4.pdf	25/03/2014
50	F.5.ASOCIACIÓN HITO 55: Capacitación a coordinadores nacionales, territoriales, de recinto Realizado	F.5.pdf	26/03/2014
51	F.6. Reporte e-SIGEF marzo 2014	F.6.pdf	07/04/2014
52	F.7.ASOCIACIÓN HITO 56: Aplicación del ENES 2014 Realizado	F.7.pdf	16/04/2014
53	F.8.ASOCIACIÓN HITO 57: Publicación de resultados del ENES marzo 2014 Realizado	F.8.pdf	05/05/2014
54	F.9. Reporte e-SIGEF abril 2014	F.9.pdf	14/05/2014
55	G.1. Reporte e-sigef mes de mayo 2014	G.1.pdf	05/06/2014
56	G.2.ASOCIACIÓN HITO 58: Curso de nivelación primer semestre 2014 Iniciado	G.2.pdf	05/06/2014
57	G.3.ASOCIACIÓN HITO 59: Proceso de postulación Realizado	G.3.pdf	05/06/2014
58	G.4.ASOCIACIÓN HITO 60: Proceso de asignación del ENES marzo 2014 Realizado	G.4.pdf	26/06/2014
59	G.5.ASOCIACIÓN HITO 61: Número de postulantes que han aceptado rendir el EXONERA Realizado	G.5.pdf	26/06/2014
60	G.6.ASOCIACIÓN HITO 62: Aplicación del examen de exoneración Exonera primer semestre 2014 Realizado	G.6.pdf	31/07/2014
61	G.7.ASOCIACIÓN HITO 63: Inicio del proceso de inscripción al ENES septiembre 2014 Realizado	G.7.pdf	31/07/2014
62	G.8. Reporte e-sigef mes de junio 2014	G.8.pdf	31/07/2014
63	G.9. Reporte e-sigef mes de Julio 2014	G.9.pdf	31/07/2014
64	H.1 ASOCIACIÓN HITO 64: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten la Nivelación Realizado	H.1.pdf	02/09/2014
65	H.2. Reporte e-sigef mes de Agosto 2014	H.2.pdf	02/09/2014
66	H.3 ASOCIACIÓN HITO 65: Publicación de los resultados del examen de exoneración EXONERA primer semestre 2014 Realizado	H.3.pdf	05/09/2014
67	H.4 ASOCIACIÓN HITO 66: Presentación de formas para la aplicación del ENES septiembre 2014 Realizado	H.4.pdf	19/09/2014
68	H5. Reporte e-sigef mes de Septiembre 2014	H5..pdf	02/10/2014
69	H6. ASOCIACIÓN HITO 67: Aplicación del ENES Septiembre 2014 Realizado	H6.pdf	03/10/2014

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
70	H7. ASOCIACIÓN HITO 68: Número de estudiantes registrados a rendir el ENES septiembre 2014 Realizado	H7.pdf	03/10/2014
71	H8. ASOCIACIÓN HITO 69: Curso de nivelación segundo semestre 2014 Realizado	H8.pdf	03/10/2014
72	H9. ASOCIACIÓN HITO 70: Publicación de resultados del ENES septiembre 2014 Realizado	H9.pdf	03/10/2014
73	I1. Reporte e-sigef mes de octubre 2014	I1..pdf	04/11/2014
74	I2. ASOCIACIÓN HITO 71: Proceso de postulación Iniciado	I2.pdf	11/11/2014
75	I3 Reporte e-sigef mes de Noviembre 2014	I3.pdf	03/12/2014
76	I4. ASOCIACIÓN HITO 72: Publicación de resultados de asignación del ENES septiembre 2014 Realizado	I4.pdf	08/12/2014
77	I5. Reporte e-sigef mes de Diciembre 2014	I5..pdf	05/01/2015
78	I6. ASOCIACIÓN HITO 73:Número de postulantes que han aceptado rendir el EXONERA Realizado	I6.pdf	12/01/2015
79	I7. ASOCIACIÓN HITO 75: Convocatoria a docentes que desean participar en el proceso de nivelación Iniciado	I7.pdf	30/01/2015
80	I8. ASOCIACIÓN HITO 76: Publicación de resultados de asignación en tercera postulación del ENES II Semestre 2014 Realizado	I8.pdf	30/01/2015
81	I9. ASOCIACIÓN HITO 77: Proceso de inscripción al ENES I Semestre 2015 Realizado	I9.pdf	30/01/2015
82	J1. ASOCIACIÓN HITO 78: Plataforma informática para la recopilación de la información de los docentes que impartirán los cursos de nivelación implementada Iniciado	J1.pdf	30/01/2015
83	J2. ASOCIACIÓN HITO 79: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten la Nivelación Realizado	J2.pdf	30/01/2015
84	J3. ASOCIACIÓN HITO 80: Aplicación del ENES Docente Realizado	J3.pdf	30/01/2015
85	J4. Reporte e-SIGEF enero 2015	J4..pdf	05/02/2015
86	J5. ASOCIACIÓN HITO 74: Aplicación del examen de exoneración exonera segundo semestre 2014 Realizado	J5.pdf	09/02/2015
87	J6. ASOCIACIÓN HITO 81: Número de estudiantes registrados a rendir el ENES I Semestre 2015 Realizado	J6.pdf	10/02/2015
88	J7. ASOCIACIÓN HITO 82: Convocatoria a docentes que desean participar en el proceso de nivelación Iniciado	J7.pdf	11/02/2015
89	J8. ASOCIACION HITO 83: Calificación y publicación de resultados de proceso de habilitación docente desarrollado Realizado	J8.pdf	18/02/2015
90	J9. Reporte e-SIGEF Febrero 2015	J9.pdf	27/02/2015
91	K1. ASOCIACIÓN HITO 85: Socialización de información con las IES para racionalización de la oferta Realizado	K1.pdf	06/03/2015
92	K2.ASOCIACIÓN HITO 84: Publicación de los resultados del examen de exoneración EXONERA I Semestre 2015 Realizado	K2.pdf	10/03/2015
93	K3. ASOCIACIÓN HITO 86: Aplicación del ENES Docente Realizado	K3.pdf	10/03/2015
94	K4. ASOCIACIÓN HITO 87: Capacitación a coordinadores nacionales, territoriales, de recinto Realizado	K4.pdf	16/03/2015
95	K5. ASOCIACIÓN HITO 88: Aplicación del ENES I Semestre 2015 Realizado	K5.pdf	23/03/2015
96	K6. Reporte e-SIGEF Marzo 2015	K6.pdf	30/03/2015

**LIGAS EXTERNAS**

Dirección (URL)	
1	www.sнна.gob.ec
	http://www.sнна.gob.ec

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol
Araujo, Lorena	Asesora Coordinadora del SNNa
Bayas, Pablo	Coordinador del Componente
Garzón, Viviana	Analista del Componente
