

SENESCYT - Secretaría Nacional De Educación Superior, Ciencia, Tecnología E Innovación
PROMETEO

PROYECTO: K001 SENESCYT - PROMETEO

Líder del Proyecto:	Coronel Zuñiga, Cristian Ricardo (ccoronel@senescyt.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Pazos Padilla, Rina Catalina	Programas Relacionados:	PROMETEO, Provincia - Azuay, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Pastaza, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Tungurahua
Titular:	Coronel Zuñiga, Cristian Ricardo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Brainware - Talento Humano	Retorno Económico:	0.00
CUP:	091590000.0000.372804	TIR:	28.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	26,186,273.49
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	13,620,757.62
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/02/2011 - 31/12/2015
Fecha de última actualización:	28/09/2015	Fecha de Fin Base:	31/12/2015
Modificado por:	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	Fecha del siguiente Hito:	30/09/2015

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto Prometeo está dirigido a universidades, escuelas politécnicas, públicas o privadas, institutos de investigación, instituciones públicas y clústeres productivos vinculados a la investigación científica, a la innovación y al desarrollo tecnológico.

PRODUCTO: Transferencia de conocimiento

LÍNEA BASE: De acuerdo al PNBV, la educación debe ser fortalecida desde una perspectiva estratégica, en este sentido el estado cumple con un rol fundamental ya que garantiza que éstas se cumplan a través de la generación de políticas. Con estos antecedentes, se implementó el Proyecto Prometeo el cual tiene como objetivo la incorporación de investigadores/expertos de alto nivel en temas estratégicos siendo investigación, innovación, transferencia tecnológica.

OBJETIVO GENERAL: Fomentar y fortalecer la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico en áreas estratégicas del país, a través de la incorporación de científicos y expertos de alto nivel, nacionales y extranjeros

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Vincular a investigadores/as de alto nivel nacionales y extranjeros que estén viviendo en el exterior a: proyectos de investigación financiados por Senescyt, universidades, escuelas politécnicas, institutos de investigación, instituciones públicas ecuatorianas.
- Incrementar las capacidades de investigación científica e innovación tecnológica de:
 - Universidades y escuelas politécnicas
 - Institutos de investigación
 - Instituciones públicas que realizan actividades de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales.
- Apoyar a equipos nacionales en el diseño, evaluación y desarrollo de proyectos de investigación y en su capacitación en mejores prácticas.
- Vincular expertos de alto nivel a proyectos nacionales de incidencia y que estén vinculados a líneas estratégicas de desarrollo productivo nacional y regional.

Beneficios Cualitativos

El proyecto contribuye a transformar el patrón de especialización nacional actual, caracterizada por ser extractivista y exportador de commodities, por uno conducente hacia la producción de bienes y servicios ricos en innovación y conocimiento, con alto valor agregado en los cuales el país obtenga ventajas comparativas.

Con este fin, el proyecto promueve el fortalecimiento de las capacidades de investigación de los IPIS, IES e Instituciones Públicas y de formación de investigadores, docentes investigadores y estudiantes a través de la incorporación de investigadores de alto nivel residentes en el exterior.

Tipo de Beneficiario

Universidades y escuelas politécnicas públicas, institutos de investigación, instituciones públicas en general vinculados a la investigación en general, a la innovación y al desarrollo tecnológico, y a la consecución de los objetivos constitucionales y del Plan Nacional de Buen Vivir.

Estudiantes, Docentes, Investigadores técnicos.

Restricciones

TIEMPO: Ejecucion del proyecto hasta el 2014

COSTO: \$41.800.000


ALCANCE: Nacional

RECURSOS: Humanos, materiales y equipos que son limitados por el presupuesto.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 94.76 %
 Fecha de Inicio: 01/02/2011 Fecha de Fin: 31/12/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

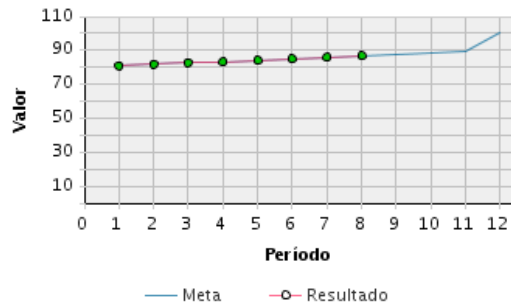

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	81 %	82 %	83 %	83 %	84 %	85 %	86 %	87 %	88 %	88 %	89 %	100 %
	Avance real acumulado											
	81 %	82 %	83 %	83 %	84 %	85 %	86 %	87 %				
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●				

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Prometeo.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	10/09/2015 - 05:08 PM
JUNIO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Prometeo.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	05/07/2015 - 09:02 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Prometeo.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	05/06/2015 - 04:13 PM
ABRIL 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Prometeo.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	05/06/2015 - 04:12 PM
MARZO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Prometeo.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	05/05/2015 - 12:07 PM
FEBRERO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Prometeo.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	05/05/2015 - 12:05 PM
ENERO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Prometeo.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	05/05/2015 - 12:04 PM
DICIEMBRE 2014: 1. Se adjunta informe de cierre de proyecto Prometeo Viejos Sabios (Hito relacionado 36) 2. Se realizó el informe de pago a los prometeos que cumplieron con los requerimientos para el pago mensual (Hito relacionado 37). 3. No se realizaron transferencias en el mes de diciembre	Castillo Campos, Linda Lesly	06/01/2015 - 11:57 AM
NOVIEMBRE 2014: 1. Se realizó el informe de pago a los prometeos que cumplieron con los requerimientos para el pago mensual (Hito relacionado 35). 2. No se realizaron transferencias en el mes de noviembre	Castillo Campos, Linda Lesly	02/12/2014 - 04:13 PM
OCTUBRE 2014: 1. Se realizó el informe de pago a los prometeos que cumplieron con los requerimientos para el pago mensual (Hito relacionado 34). 2. No se realizaron transferencias en el mes de octubre	Castillo Campos, Linda Lesly	04/11/2014 - 04:19 PM
SEPTIEMBRE 2014: 1. Se realizó el informe de pago a los prometeos que cumplieron con los requerimientos para el pago mensual (Hito relacionado 33). 2. No se realizaron transferencias en el mes de septiembre.	Castillo Campos, Linda Lesly	01/10/2014 - 04:39 PM
AGOSTO 2014: 1. Se realizó el informe de pago a los prometeos que cumplieron con los requerimientos para el pago mensual (Hito relacionado 32). 2. No se realizaron transferencias en el mes de agosto.	Castillo Campos, Linda Lesly	03/09/2014 - 12:54 PM
JULIO 2014: 1. Se realizó el informe de pago a los prometeos que cumplieron con los requerimientos para el pago mensual (Hito relacionado 31). 2. No se realizaron transferencias en el mes de julio.	Solano, María José	01/08/2014 - 12:35 PM
JUNIO 2014: 1. Se realizó el informe de pago a los prometeos que cumplieron con los requerimientos para el pago mensual (Hito relacionado 30). 2. No se realizaron transferencias en el mes de junio.	Solano, María José	03/07/2014 - 12:26 PM
MAYO 2014: 1. Se realizó el informe de pago a los prometeos que cumplieron con los requerimientos para el pago mensual (Hito relacionado 29). 2. No se realizaron transferencias en el mes de mayo.	Solano, María José	05/06/2014 - 04:13 PM
ABRIL 2014: 1. Se realizó el informe de pago a los prometeos que cumplieron con los requerimientos para el pago mensual (Hito relacionado 28). 2. No se realizaron transferencias en el mes de abril.	Solano, María José	05/05/2014 - 03:45 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2014:</p> <p>1. Se realizó el informe de pago a los prometeos que cumplieron con los requerimientos para el pago mensual (Hito relacionado 27). 2. No se realizaron transferencias en el mes de marzo.</p>	Solano, María José	04/04/2014 - 05:25 PM
<p>MARZO 2014:</p> <p>Se realizó el informe de pago a los prometeos que cumplieron con los requerimientos para el pago mensual.</p>	Solano, María José	31/03/2014 - 01:40 PM
<p>FEBRERO2014:</p> <p>Se realizó el informe de pago a los prometeos que cumplieron con los requerimientos para el pago mensual</p>	Solano, María José	05/03/2014 - 09:13 PM
<p>ENERO 2014:</p> <p>Se realizó el informe de pago a los prometeos que cumplieron con los requerimientos para el pago mensual.</p>	Solano, María José	05/02/2014 - 11:29 AM
<p>DICIEMBRE 2013:</p> <p>Se realizó el informe de pago a los prometeos que cumplieron con los requerimientos para el pago mensual. (HITO 24)</p>	Paredes del Castillo, Grace Paulina	06/01/2014 - 08:48 AM
<p>NOVIEMBRE 2013:</p> <p>Se realizó el informe de pago a los prometeos que cumplieron con los requerimientos para el pago mensual. (HITO 23)</p>	Paredes del Castillo, Grace Paulina	05/12/2013 - 11:20 AM
<p>OCTUBRE 2013: En el mes de octubre se realizaron 2 Comités Ejecutivos del Proyecto Becas Prometeo. Se procesaron 204 postulaciones manuales con los nuevos baremos del Proyecto. El día martes 22 de octubre se llevó a cabo el Taller de Zonales con el objetivo de dar a conocer los procesos de postulación, selección y vinculación de Prometeos a las diferentes instituciones de acogida dentro del marco del Proyecto Becas Prometeo. El día jueves 24 de octubre de 2013 se organizó dos talleres, uno en Quito y otro en Guayaquil, con las contrapartes de las instituciones y universidades, con el objetivo de informar a las instituciones sobre los cambios y mejoras en los procesos técnicos del Proyecto Becas Prometeo. Un total de 50 instituciones fueron capacitadas cumpliendo el objetivo de los talleres.</p>	Paredes del Castillo, Grace Paulina	01/11/2013 - 12:58 PM
<p>SEPTIEMBRE 2013: En el mes de septiembre se realizaron 2 Comités Ejecutivo del Proyecto Becas Prometeo. Se procesaron 135 postulaciones manuales con los nuevos baremos del Proyecto. El jueves 19 de septiembre se llevó a cabo el taller en el INER con el objetivo de obtener necesidades específicas conforme a los proyectos de investigación que se desarrollan actualmente. El martes 24 y miércoles 25 de septiembre se realizó el taller de presentación del Proyecto Prometeo en la Universidad Técnica de Machala a los docentes, decanos, subdecanos y vicerrectores con el fin de esclarecer dudas y levantar necesidades.</p>	Paredes del Castillo, Grace Paulina	02/10/2013 - 02:11 PM
<p>En el mes de agosto se ratificaron las bases de postulación y los baremos del nuevo Proyecto Becas Prometeo. Se realizaron 2 Comisiones de Selección extraordinarias y el primer Comité Ejecutivo del Proyecto Becas Prometeo. Se procesaron 151 postulaciones manuales con los nuevos baremos del Proyecto. Así también durante el mes de agosto del 2013 se realizó difusión del Proyecto Prometeo entre los becarios de la Convocatoria Abierta 2013 que saldrán fuera del país para especializarse en diferentes áreas del conocimiento, con el fin de que puedan ser nuestros embajadores y principales gestores del Proyecto en el exterior y en sus universidades de acogida. Las inducciones se llevaron a cabo el 17 de agosto en Loja y Portoviejo, el 19 de agosto en Guayaquil y el 20 de agosto en Quito y Cuenca.</p>	Paredes del Castillo, Grace Paulina	02/09/2013 - 03:09 PM
<p>JULIO 2013: El 31 de julio de 2013 se realizó la Comisión de Selección del Proyecto Prometeo aprobándose la recomendación al Secretario Nacional de la vinculación de 38 investigadores en ciencias exactas, 1 cambio de categoría y 2 cambios de institución de Prometeos previamente aprobados. En el mes de julio 2013 se procesaron 270 postulaciones. El jueves 25 de Julio de 2013 se llevó a cabo el "I Taller de Políticas de investigación y modelos universitarios en el Ecuador" en la ciudad de Manta, cuyo objetivo principal fue el de generar espacios multidisciplinarios de discusión, generando recomendaciones y conclusiones sobre las acciones emprendidas por el gobierno ecuatoriano para fortalecer el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.</p>	Paredes del Castillo, Grace Paulina	02/08/2013 - 09:47 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JUNIO 2013: El 26 de junio de 2013 se realizó la Comisión de Selección del Proyecto Prometeo aprobándose la recomendación al Secretario Nacional de la vinculación de 40 investigadores y 1 cambio de categoría de Prometeos previamente aprobados. Así también se realizó una convocatoria para una Comisión Extraordinaria para el día viernes 28. En el mes de junio 2013 se procesaron 191 postulaciones. El jueves 13 de junio se visitó la Universidad de Guayaquil para la revisión de las condiciones de la universidad al recibir a los Prometeos (físicas, logísticas, académicas), así también se realizó el levantamiento de necesidades y monitoreo del trabajo de los Prometeos. El miércoles 25 de junio se realizó una reunión en las instalaciones de FÁBRICA IMBABURA en donde se presentó el Proyecto Prometeo y se realiza levantamiento de necesidades. Del 27 al 29 de junio se difundió el Proyecto Prometeo en el 6to Encuentro de Ecuatorianistas realizado en la ciudad de Cuenca.</p>	<p>Paredes del Castillo, Grace Paulina</p>	<p>01/07/2013 - 05:35 PM</p>
<p>MAYO 2013: El 29 de mayo de 2013 se realizó la Comisión de Selección del Proyecto Prometeo aprobándose la recomendación al Secretario Nacional de la vinculación de 48 investigadores, 2 cambios de categoría y 1 cambio de institución de Prometeos previamente aprobados. En el mes de mayo 2013 se procesó 277 postulaciones. El 01 de mayo de 2013 se realizó un levantamiento de necesidades y capacitación de los procesos de Prometeo a los funcionarios del INP a cargo de Gabriela Jaramillo, Gerente del Proyecto. El 08 y 09 de mayo se presentó en Proyecto Prometeo en la empresa pública ETAPA y se visitó el museo Pumapungo para conocer sobre sus necesidades. El 22 de mayo se realizó un taller con las autoridades de la prefectura de Manabí. El día 28 de mayo de 2013 se llevó a cabo el Taller de difusión del Proyecto Prometeo para todas las Instituciones públicas de Imbabura y el 30 de mayo de 2013 se presentó el Proyecto Prometeo a las autoridades de la Universidad Central del Ecuador.</p>	<p>Paredes del Castillo, Grace Paulina</p>	<p>03/06/2013 - 05:53 PM</p>
<p>ABRIL 2013: El 26 de abril de 2013 se realizó la Comisión de Selección del Proyecto Prometeo aprobándose la recomendación al Secretario Nacional de la vinculación de 36 investigadores y 3 cambios de categoría de Prometeos previamente aprobados. El mes de abril 2013 se procesaron 150 postulaciones. El jueves 11 de abril de 2013 la Gerente del Proyecto, Gabriela Jaramillo, participó en una entrevista en vivo en el programa "El Ciudadano Radio", de Radio Universal. Por otro lado, también participó en una entrevista con Olga Velasco, de Ecuador Tv, para un reportaje en el que se recogieron puntos de vista de varios investigadores, sobre el Proyecto. El 30 de abril de 2013 la Gerente del Proyecto sostuvo un taller con las altas autoridades del Instituto Nacional de Pesca en Guayaquil y mantuvo dos reuniones oficiales de manera personal exclusivamente con el Rector de la ESPOL por un lado y con el Rector de la Universidad de Guayaquil por otro lado.</p>	<p>Paredes del Castillo, Grace Paulina</p>	<p>02/05/2013 - 05:30 PM</p>
<p>MARZO 2013: El 27 de marzo, 2013 se realizó la Comisión de Selección del Proyecto aprobándose la vinculación de 30 investigadores. El 13 y 14 de marzo, el Proyecto participó con un stand y charlas informativas en la "Feria Internacional de Reclutamiento" celebrada en Madrid- España, con el fin de promover la iniciativa y atraer candidatos idóneos. Entre las actividades de promoción local, la Gerente del Proyecto, realizó entrevistas en medios de prensa como: El Comercio, ECTV (noticiero de la mañana), Radio Quito (Regresando con Andrés Carrión). Se receptaron y evaluaron 117 aplicaciones.</p>	<p>Ulloa Hurtado, Gina Dolores</p>	<p>01/04/2013 - 12:22 PM</p>
<p>FEBRERO 2013: La Comisión de Selección del Proyecto Prometeo se efectuó en febrero 27, 2013 aprobándose la vinculación de 20 investigadores. Se realizó el evento de Promoción del Proyecto entre las instituciones públicas, universidades y municipalidades de Cuenca, Guayaquil, Macas (feb 19, 20, 28) y Direcciones Provinciales del MAE, a fin de establecer contactos y necesidades para futuras vinculaciones. Adicionalmente se capacitó al personal Senescyt de la Zonal Cuenca, Zonal Guayaquil y Servicio a la Ciudadanía Quito, sobre el alcance y beneficios del Proyecto. Se puso en producción el nuevo sistema de postulaciones en línea, lográndose finalizar aplicaciones que estaban incompletas por parte de los postulantes. Se recibieron 123 aplicaciones.</p>	<p>Ulloa Hurtado, Gina Dolores</p>	<p>28/02/2013 - 07:18 PM</p>
<p>FEBRERO 2013: La Comisión de Selección del Proyecto Prometeo se efectuó en febrero 27, 2013 aprobándose la vinculación de 20 investigadores. Se realizó el evento de Promoción del Proyecto entre las instituciones públicas, universidades y municipalidades de Cuenca, Guayaquil, Macas (feb 19, 20, 28) y Direcciones Provinciales del MAE, a fin de establecer contactos y necesidades para futuras vinculaciones. Adicionalmente se capacitó al personal Senescyt de la Zonal Cuenca, Zonal Guayaquil y Servicio a la Ciudadanía Quito, sobre el alcance y beneficios del Proyecto. Se puso en producción el nuevo sistema de postulaciones en línea, lográndose finalizar aplicaciones que estaban incompletas por parte de los postulantes. Se procesaron 80 postulaciones de un total recibido de 123 aplicaciones.</p>	<p>Ulloa Hurtado, Gina Dolores</p>	<p>28/02/2013 - 07:05 PM</p>
<p>ENERO 2013: En la Comisión de Selección del Proyecto Prometeo celebrada en enero 17, 2013 se aprobó la vinculación de 17 investigadores. Se realizó el evento de Promoción del Proyecto en el II Foro de Estudiantes Ecuatorianos en Europa y el Taller con Embajadores del Ecuador, llevados a cabo en Milán. Se realizaron varias reuniones en España, donde se presentó el Proyecto a universidades en Barcelona y Madrid a fin de lograr acuerdos para la vinculación de investigadores. Se procesaron el total de las postulaciones recibidas en enero, llegando a 60 aplicaciones.</p>	<p>Ulloa Hurtado, Gina Dolores</p>	<p>01/02/2013 - 09:20 AM</p>

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 0

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Carchi > Toda la Provincia del Carchi
2	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas
3	Zona 1 - Norte > Imbabura > Toda la Provincia de Imbabura
4	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios
5	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Toda la Provincia de Napo
6	Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Toda la Provincia de Orellana
7	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha
8	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo
9	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Toda la Provincia de Cotopaxi
10	Zona 3 - Centro > Pastaza > Toda la Provincia de Pastaza
11	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Toda la Provincia de Tungurahua
12	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí
13	Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Toda la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas
14	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Toda la Provincia de Bolívar
15	Zona 5 - Litoral > Galápagos > Toda la Provincia de Galapagos
16	Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas
17	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Toda la Provincia de Los Ríos
18	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Toda la Provincia de Santa Elena
19	Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay
20	Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar
21	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago
22	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro
23	Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja
24	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipec > Toda la Provincia de Zamora Chinchipe

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Avance físico 2011	5-Entregables Intermedios	31/12/2011		31/12/2011		Sí	11.0
2	EJECUCIÓN: Avance físico 2012	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	15.0
3	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en comisión de selección.	5-Entregables Intermedios	18/01/2013		18/01/2013		Sí	3.87
4	EJECUCIÓN: Reporte de resultados sobre la ejecución de la actividad de Promoción del Proyecto, entregado.	1-Solicitud de Información	24/01/2013		24/01/2013		Sí	1.6
5	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en comisión de selección.	1-Solicitud de Información	15/02/2013		15/02/2013		Sí	1.0
6	EJECUCIÓN: Reporte de resultados sobre la ejecución de la actividad de Promoción del Proyecto, entregado	1-Solicitud de Información	28/02/2013		20/02/2013		Sí	1.6

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
7	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en comisión de selección.	1-Solicitud de Información	15/03/2013		27/03/2013		Sí	1.0
8	EJECUCIÓN: Reporte de resultados sobre la ejecución de la actividad de Promoción del Proyecto, entregado	1-Solicitud de Información	30/03/2013		30/03/2013		Sí	1.6
9	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en comisión de selección.	1-Solicitud de Información	30/04/2013		30/04/2013		Sí	3.0
10	EJECUCIÓN: Reporte de resultados sobre la ejecución de la actividad de Promoción del Proyecto, entregado.	1-Solicitud de Información	30/04/2013		30/04/2013		Sí	1.6
11	EJECUCIÓN: Análisis de ejecución y re-programación del presupuesto, realizado.	1-Solicitud de Información	20/05/2013		20/05/2013		Sí	2.0
12	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en comisión de selección.	1-Solicitud de Información	30/05/2013		30/05/2013		Sí	3.0
13	EJECUCIÓN: Reporte de resultados del taller con Prometeos, entregado.	1-Solicitud de Información	30/05/2013		30/05/2013		Sí	3.0
14	EJECUCIÓN: Reporte de resultados sobre la ejecución de la EJECUCIÓN: actividad de Promoción del Proyecto, entregado.	1-Solicitud de Información	30/05/2013		30/05/2013		Sí	2.6
15	EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución.	1-Solicitud de Información	30/06/2013		30/06/2013		Sí	1.6
16	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en comisión de selección.	1-Solicitud de Información	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0
17	EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución.	1-Solicitud de Información	30/07/2013		30/07/2013		Sí	1.6
18	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en comisión de selección.	1-Solicitud de Información	30/07/2013		30/07/2013		Sí	2.0
19	EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución.	1-Solicitud de Información	30/08/2013		30/08/2013		Sí	1.6
20	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comisión de selección.	1-Solicitud de Información	30/08/2013		30/08/2013		Sí	2.0
21	EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado septiembre.	1-Solicitud de Información	30/09/2013		30/09/2013		Sí	0.6
22	EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado octubre.	1-Solicitud de Información	30/10/2013		30/10/2013		Sí	2.0
23	EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado noviembre	1-Solicitud de Información	30/11/2013		30/11/2013		Sí	1.6

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
24	EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado diciembre.	1-Solicitud de Información	18/12/2013		18/12/2013		Sí	2.0
25	EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado enero.	1-Solicitud de Información	31/01/2014		31/01/2014		Sí	0.73
26	EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado febrero.	1-Solicitud de Información	28/02/2014		28/02/2014		Sí	0.73
27	EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado marzo.	1-Solicitud de Información	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.73
28	EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado abril.	1-Solicitud de Información	30/04/2014		30/04/2014		Sí	0.73
29	EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado mayo.	1-Solicitud de Información	31/05/2014		31/05/2014		Sí	0.73
30	EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado junio.	1-Solicitud de Información	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.73
31	EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado julio.	1-Solicitud de Información	31/07/2014		31/07/2014		Sí	0.73
32	EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado agosto.	1-Solicitud de Información	31/08/2014		29/08/2014		Sí	0.73
33	EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado septiembre.	1-Solicitud de Información	30/09/2014		30/09/2014		Sí	0.74
34	EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado octubre.	1-Solicitud de Información	31/10/2014		31/10/2014		Sí	0.74
35	EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado noviembre.	1-Solicitud de Información	30/11/2014		30/11/2014		Sí	0.84
36	EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado diciembre.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2014		31/12/2014		Sí	3.0
37	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto enero realizado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.84
38	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto febrero realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.83
39	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto marzo realizado.	5-Entregables Intermedios	30/03/2015		30/03/2015		Sí	0.83
40	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto abril realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.83
41	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto mayo realizado.	5-Entregables Intermedios	30/05/2015		30/05/2015		Sí	0.83
42	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto junio realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.83
43	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto julio realizado.	5-Entregables Intermedios	30/07/2015		30/07/2015		Sí	0.83
44	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto agosto realizado.	5-Entregables Intermedios	30/08/2015		30/08/2015		Sí	0.83
45	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto septiembre realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2015	30/09/2015			No	0.83

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
46	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto octubre realizado.	5-Entregables Intermedios	30/10/2015	30/10/2015			No	0.83
47	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto noviembre realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2015	30/11/2015			No	0.83
48	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto diciembre realizado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2015	30/12/2015			No	0.83
49	CIERRE: Informe de cierre	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2015	31/12/2015			No	10.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Supervisión al positiva al cumplimiento del Hito planificado para este mes	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	28/09/2015
2	VERIFICAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y EL NUMERO DE PROMETEOS VINCULADOS EN LAS INSTITUCIONES DE ACOGIDA EN LA PROVINCIA DE EL ORO	Granda Dávila, Pablo Esteban	{PR} - Provincia - EL ORO	20/08/2014
3	VERIFICACIÓN DE PROYECTO	Ojeda Valarezo, Tania Verónica	{PR} - Provincia - LOJA	22/04/2014
4	Supervisión del Proyecto	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	18/03/2014
5	Visita del 09 de Diciembre del 2013	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	10/12/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	13,620,757.62 **
Costo Total:	41,800,000.00
Total Devengado:	13,582,918.58
% Costo Total Devengado:	32.50 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 32.50 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	7,374,961.96	55,151.24	0.00	7,430,113.20
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	39,306,771.41	0.00	0.00	39,306,771.41
Ppto. Codificado	14,895,072.48	17,416.00	0.00	14,912,488.48
Ppto. Comprometido	3,365,245.57	17,312.20	0.00	3,382,557.77
Planeado - Codificado (2015)		37,735.24		
Programado a Devengar	14,206,012.14	55,151.24	0.00	14,261,163.38
Ppto. Devengado	13,565,606.38	17,312.20	0.00	13,582,918.58
Estimado a fin de año	* 13,565,606.38	0.00	0.00	13,565,606.38
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	640,405.76	55,151.24	0.00	695,557.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 95.49 %	31.39 %	0.00 %	95.24 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015

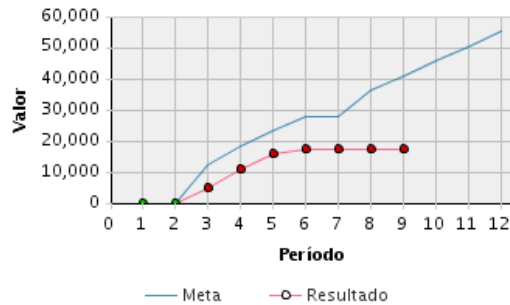

Presupuesto Mensual 2015

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	12,421.53	4,994.47	12,421.53	4,994.47	40.21 %		9.06 %
Abr	5,988.18	5,988.18	18,409.71	10,982.65	59.66 %		19.91 %
May	4,838.40	4,838.40	23,248.11	15,821.05	68.05 %		28.69 %
Jun	4,747.75	1,491.15	27,995.86	17,312.20	61.84 %		31.39 %
Jul	0.00	0.00	27,995.86	17,312.20	61.84 %		31.39 %
Ago	8,004.35	0.00	36,000.21	17,312.20	48.09 %		31.39 %
Sep	4,998.47	0.00	40,998.68	17,312.20	42.23 %		31.39 %
Oct	4,747.75		45,746.43				
Nov	4,747.75		50,494.18				
Dic	4,657.06		55,151.24				
Total	55,151.24	17,312.20					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
2	Incrementar el número de vinculaciones de expertos de alto nivel residentes en el exterior a instituciones de acogida MEDIANTE la búsqueda de perfiles a nivel mundial, su evaluación, aprobación e incorporación de dichos profesionales.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	DICTAMEN DE PRIORIDAD	A.1.pdf	21/11/2013
2	FORMATO SENPLADES PROYECTO PROMETEO	A.2.pdf	25/11/2013
3	A.3.ASOCIACIÓN HITO 1.- Avance físico 2011	A.3.pdf	25/11/2013
4	A.4.ASOCIACIÓN HITO 2.- Avance físico 2012	A.4.pdf	25/11/2013
5	A.5.ASOCIACIÓN HITO 3.- Prometeos aprobados en comisión de selección, enero 2013	A.5.pdf	25/11/2013
6	A.6.ASOCIACIÓN HITO 4.- Resultados sobre la ejecución de la actividad de promoción del Proyecto, enero 2013	A.6.pdf	25/11/2013
7	A.7.ASOCIACIÓN HITO 5.- Prometeos aprobados en comisión de selección, febrero 2013	A.7.pdf	25/11/2013
8	A.8.ASOCIACIÓN HITO 6.- Resultados sobre la ejecución de la actividad de promoción del Proyecto, febrero 2013	A.8.pdf	25/11/2013
9	A.9.ASOCIACIÓN HITO 7.- Prometeos aprobados en comisión de selección, marzo 2013	A.9.pdf	25/11/2013
10	B.1.ASOCIACIÓN HITO 8.- Resultados sobre la ejecución de la actividad de promoción del Proyecto, marzo 2013	B.1.pdf	25/11/2013
11	B.2.ASOCIACIÓN HITO 9.- Prometeos aprobados en comisión de selección, abril 2013	B.2.pdf	25/11/2013
12	B.3.ASOCIACIÓN HITO 10.- Resultados sobre la ejecución de la actividad de promoción del Proyecto, abril 2013	B.3.pdf	25/11/2013
13	B.4.ASOCIACIÓN HITO 11.- Análisis de ejecución y re-programación del presupuesto	B.4.pdf	25/11/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
14	B.5.ASOCIACIÓN HITO 12.- Prometeos aprobados en comisión de selección, mayo 2013	B.5.pdf	25/11/2013
15	B.6.ASOCIACIÓN HITO 14.- Resultados sobre la ejecución de la actividad de promoción del Proyecto, mayo 2013	B.6.pdf	02/09/2014
16	B.7.ASOCIACIÓN HITO 15.- Perfiles disponibles de investigadores, junio 2013	B.7.pdf	02/09/2014
17	B.8.ASOCIACIÓN HITO 16.- Prometeos aprobados en comisión de selección, junio 2013	B.8.pdf	02/09/2014
18	B.9.ASOCIACIÓN HITO 17.- Perfiles disponibles de investigadores, julio 2013	B.9.pdf	02/09/2014
19	C.1.ASOCIACIÓN HITO 18.- Prometeos aprobados en comisión de selección, julio 2013	C.1.pdf	02/09/2014
20	C.2.ASOCIACIÓN HITO 19.- Perfiles disponibles de investigadores, agosto 2013	C.2.pdf	02/09/2014
21	C.3.ASOCIACIÓN HITO 20.- Prometeos aprobados en comisión de selección, agosto 2013	C.3.pdf	02/09/2014
22	C.4.ASOCIACIÓN HITO 21: Informe de pago prometeos vinculados realizado septiembre.	C.4.pdf	02/09/2014
23	C.5.ASOCIACIÓN HITO 22: Informe de pago prometeos vinculados realizado octubre.	C.5.pdf	02/09/2014
24	C.6.ASOCIACIÓN HITO 23: Informe de pago prometeos vinculados realizado noviembre.	C.6.pdf	02/09/2014
25	C.7.ASOCIACIÓN HITO 24: Informe de pago prometeos vinculados realizado diciembre	C.7.docx	02/09/2014
26	C.8.ASOCIACIÓN HITO 25: Informe de pago prometeos vinculados realizado enero	C.8.pdf	02/09/2014
27	C.9.ASOCIACIÓN HITO 26: Informe de pago prometeos febrero	C.9.pdf	02/09/2014
28	D.1 Reporte e-SIGEF febrero 2014	D.1..pdf	02/09/2014
29	D.2.ASOCIACIÓN HITO 27: Informe de pago prometeos vinculados realizado marzo	D.2.pdf	02/09/2014
30	D.3. Reporte e-SIGEF marzo 2014	D.3.pdf	02/09/2014
31	D.5. Reporte e-sigef mes de mayo 2014	D.5.pdf	02/09/2014
32	D.8. Reporte e-sigef mes de junio 2014	D.8.pdf	02/09/2014
33	D4.ASOCIACIÓN HITO 28: Informe de pago prometeos vinculados realizado abril	D.4.pdf	02/09/2014
34	D6.ASOCIACIÓN HITO 29: Informe de pago prometeos vinculados realizado mayo.	D.6.pdf	02/09/2014
35	D7.ASOCIACIÓN HITO 30: Informe de pago prometeos vinculados realizado junio.	D.7.pdf	02/09/2014
36	D9.ASOCIACIÓN HITO 31.- Informe de pago prometeos vinculados realizado julio.	D9.pdf	02/09/2014
37	E.1. Reporte e-sigef mes de Julio 2014	E.1.pdf	31/07/2014
38	E.2. Reporte e-sigef mes de Agosto 2014	E.2.pdf	02/09/2014
39	E.3.ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe de pago prometeos vinculados realizado agosto.	E3.pdf	02/09/2014
40	E.4.ASOCIACIÓN HITO 33.- Informe de pago prometeos vinculados realizado septiembre.	E4.pdf	01/10/2014
41	E.5. Reporte e-sigef mes de septiembre 2014	E5.pdf	02/10/2014
42	E.6. Reporte e-sigef mes de octubre 2014	E6..pdf	04/11/2014
43	E.7.ASOCIACIÓN HITO 34.- Informe de pago prometeos vinculados realizado octubre.	E7.pdf	04/11/2014
44	E.8 Reporte e-sigef mes de Noviembre 2014	E.8.pdf	01/12/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
45	E.9.ASOCIACIÓN HITO 35.- Informe de pago prometeos vinculados realizado noviembre.	E9.PDF	02/12/2014
46	F.1. Reporte e-sigef mes de Diciembre 2014	F1..pdf	05/01/2015
47	F.2.ASOCIACIÓN HITO 36.- Informe de pago cierre	F2.pdf	06/01/2015
48	F.3.ASOCIACIÓN HITO 37.- Informe de pago prometeos vinculados realizado diciembre.	F3.pdf	06/01/2015
49	F.4. Reporte e-sigef mes de Marzo 2015	F4.pdf	07/04/2015
50	F5. Reporte e-sigef mes de Abril 2015	F5.pdf	30/04/2015
51	F6. Reporte e-sigef mes de Mayo 2015	F6.pdf	05/06/2015

LIGAS EXTERNAS

Dirección (URL)

1	http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/Prometeo/inicio.do
	http://9 de Octubre y Ramírez Dávalos

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico
Coronel Zuñiga, Cristian Ricardo	Lider del proyecto	Gerente Proyecto Prometeo	ccoronel@senescyt.gob.ec
Páez Echeverría, Viviana Priscila	Analista a cargo	Coordinadora de Planificación Estratégica y Punto de Atención al Prometeo	vpaez@senescyt.gob.ec
Solano, María José	Analista apoyo		msolano@senescyt.gob.ec
