

SENESCYT - Secretaría Nacional De Educación Superior, Ciencia, Tecnología E Innovación
Subsecretaría de Investigación Científica

PROYECTO: K003 SENESCYT - PROYECTOS de I+D+i CONVOCATORIA SENACYT - 2010

Líder del Proyecto:	Cordero Paez, Laura Cristina (lccordero@senescyt.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Pazos Padilla, Rina Catalina	Programas Relacionados:	Provincia - Azuay, Provincia - Bolívar, Provincia - Carchi, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Napo, Provincia - Orellana, Provincia - Pastaza, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Sucumbíos, Provincia - Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe, PROYECTOS DE I +D+I
Titular:	Medina Sotomayor, Jaime Felipe	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Tecnología	Retorno Económico:	0.00
CUP:	91510000.1484.6234	TIR:	13.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	2,046,820.27
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	64,274,070.58
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2010 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	05/10/2015	Fecha de Fin Base:	31/12/2014
Modificado por:	Gordillo Salinas, Mario Andrés	Fecha del siguiente Hito:	30/10/2015

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Considerando que el Ecuador ha entrado en un nuevo proceso de desarrollo, en el que utiliza el conocimiento generado por la investigación y la tecnología para promover el buen vivir de los ecuatorianos, se requiere impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país a través del fomento de la ciencia y tecnología, a fin de contribuir con el desarrollo sostenible del país y específicamente a los actores de ciencia y tecnología del país.

PRODUCTO: Informe sobre las investigaciones científicas y tecnológicas desarrolladas durante la ejecución del proyecto.

LÍNEA BASE: En 1994 la FUNDACYT, recibió un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo orientada únicamente a la oferta de universidades e institutos de investigación, mismo que fue ejecutado en 7 años, con una ejecución real de 21 millones de dólares y un promedio de tres millones anuales.

En la Constitución de 2008, Artículo 385 se estipula que la SENACYT "establecerá los objetivos y políticas del conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman"

La inversión que se ha dado para el desarrollo de la Ciencia y Tecnología en estas áreas se ha incrementado en los últimos años. Por ejemplo: en el año 2006 se invirtieron USD\$ 616.732,73 para programas y proyectos, mientras que en 2008 y 2009 se destina una inversión de USD\$ 35'942.533,13 .

OBJETIVO GENERAL:


DATOS GENERALES

Descripción
Impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país, a través del financiamiento de proyectos y programas de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica I+D+i, en concordancia con el Plan Nacional para el Buen Vivir.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Priorizar y financiar la ejecución de proyectos de I+D+i mediante, cuyos objetivos estén orientados a la obtención de productos, procesos o servicios, nuevos o mejorados para solucionar problemas de la comunidad ecuatoriana.
2. Impulsar programas de I+D+i nacionales estratégicos de ciencia y tecnología, vinculados al desarrollo del país.
Beneficios Cualitativos
Contribuir al desarrollo sostenible del país a través del impulso de la ciencia y la tecnología
Tipo de Beneficiario
DIRECTOS: Actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes
INDIRECTOS: La población del Ecuador.
Restricciones
TIEMPO: El proyecto está vigente hasta el 31 de diciembre de 2014.
COSTO: US\$70.000.000,00
ALCANCE: Los institutos públicos de investigación deben contar con la capacidad de realizar investigación de alto nivel
RECURSOS:
1. Humanos: falta de personal científico - técnico y alta rotación. Falta de incentivos financieros.
2. Equipos: oferta inexistente de equipo especializado en el país
3. Materiales y suministros: oferta inexistente de materiales y suministros para operar equipo especializado en el país
4. El sistema fiscal es incompatible con procesos investigativos.
5. Los procedimientos para utilizar el sistema de compras públicas crean restricciones para la realización de investigación científica en el país.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 64.65 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2010 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

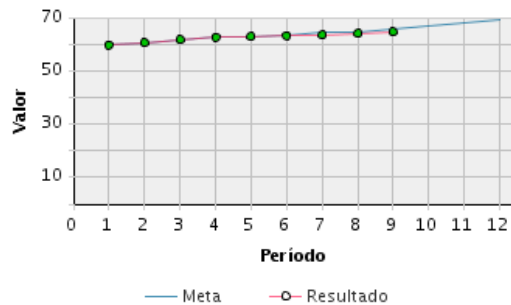

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	60 %	61 %	62 %	63 %	63 %	64 %	64 %	65 %	66 %	67 %	68 %	69 %
	Avance real acumulado											
	60 %	61 %	62 %	63 %	63 %	63 %	63 %	64 %	65 %			
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2015 Mediante Acta No. CEPPID-SDIC-017- 2015, de fecha 09 de marzo de 2015, discutió y aprobó las Bases Específicas de Aplicación para la "CONVOCATORIA ESPECIFICA PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR", y sus anexos. En respuesta a la "CONVOCATORIA ESPECIFICA PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR", y sus anexos., se han receptado un total de 135 propuestas, las que se encuentran distribuidas a nivel nacional por IES La Subsecretaría de Investigación científica, mediante Acta Nro. CEPPID-SDIC-014-2014, de fecha, 30 de Diciembre del 2014, seleccionó y adjudico las siguientes propuestas de investigación: 1. Mejora de la cadena productiva del chocho (Lupinus mutabilis) en Ecuador, presentado por la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), con un monto de \$697.200.00 a ser financiado. 2. Análisis integrado de los flujos de carbono en cuencas de los Andes Australes Interacciones entre la vegetación terrestre, el suelo y las masas de agua, presentado por la Universidad de Cuenca, con un monto de \$ 1.351.890,10 a ser financiado. Por otra parte, se encuentran 4 propuestas en espera del informe de pertinencia para su selección y adjudicación, Por lo antes expuesto, la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación con la selección y adjudicación de las propuestas que han superado los criterios de evaluación técnica, da cumplimiento al Hito Nro. 86. En el mes de Septiembre del 2015 se realizaron transferencias por un valor de \$ 10.535.839,88.</p>	<p>Pineda González, Leonardo Fabián</p>	<p>05/10/2015 - 10:37 AM</p>
<p>AGOSTO 2015 La Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de sus canales oficiales de comunicación realizó la difusión de la convocatoria abierta desde el 28 de abril al 15 de Julio de 2015, y empezó con la Feria Galardones 2015 en la Ciudad de Guayaquil con fecha 27 de Agosto 2015, donde se obtuvieron los siguientes resultados: 1. En total para esta feria se consideraron 183 proyectos dentro de 9 de las 10 áreas del conocimiento. 2. El total de estudiantes que participaron en la primera feria realizada en la ciudad de Guayaquil fue de 340 de 14 universidades. 3. Las áreas del conocimiento se incrementaron de cuatro en el 2013 a diez en el 2015: Artes, Educación, Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística, Tecnologías de la Información y Comunicación, Ingeniería e Industria; Ingeniería Civil, Arquitectura y Construcción; Agricultura, Silvicultura y Veterinaria; Salud y Bienestar, Recursos Marinos y Pesca. 4. Ingeniería e Industria, Salud y Bienestar son las áreas con mayor participación. 5. En esta primera Feria Zonal se evaluaron tanto los proyectos de investigación científica como aquellos proyectos que presenten componentes de Innovación y Saberes Ancestrales. 6. Los proyectos con una calificación mayor a 80/100 pasarán a ser evaluados finalmente en la feria nacional, se preseleccionará una propuesta por cada área de investigación de conformidad con lo señalado en las bases de la convocatoria, la Secretaría de Investigación Científica. Por lo antes expuesto, la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación con las actividades relacionadas al concurso GALARDONES 2015 detalladas anteriormente, da cumplimiento al Hito Nro. 83. La Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de sus canales oficiales de comunicación realizó la difusión de las convocatorias abiertas y permanentes, para la presentación de programas y/o proyectos en diversas áreas en las que se han recibido las siguientes propuestas: 1. La Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación a partir de la aprobación de las bases para la convocatoria de Instituciones de Educación Superior IES, con fecha 09 de Marzo del 2015 ha recibido un total de 35 proyectos hasta el 30 de Agosto de 2015. 2. Con la aprobación de las bases para la convocatoria a Los Institutos Públicos de Investigación IPI's de fecha 16 de Abril de 2015, presentaron un total de 21 proyectos de investigación hasta el 30 de Agosto de 2015 con la finalidad de obtener financiamiento para su ejecución. 3. En el periodo que va del 03 de Febrero de 2015, fecha en que se aprobaron las bases para la convocatoria de Biodiversidad hasta el 30 de Agosto de 2015, se han presentaron 2 proyectos de investigación científica orientados al estudio de la biodiversidad del Ecuador con énfasis en bioprospección, mediante la promoción de investigación básica y/o aplicada, acorde a los objetivos de desarrollo del Plan Nacional del Buen Vivir. Por lo antes expuesto, la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación recibió un total de 58 proyectos de todas las convocatorias específicas, cumpliendo con lo planteado en el Hito Nro. 84. En el mes de Agosto se realizaron transferencias por el valor de \$703095.60</p>	<p>Pineda González, Leonardo Fabián</p>	<p>04/09/2015 - 05:26 PM</p>
<p>JULIO 2015 Con el objetivo de dar a conocer las normas que regulan los procesos de las convocatorias realizadas por la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación para el financiamiento de los programas y/o proyectos de investigación científica y Desarrollo tecnológico dirigidas a los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes</p>	<p>Pineda González, Leonardo Fabián</p>	<p>06/08/2015 - 11:52 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Ancestrales, del Ecuador, acorde a los objetivos de desarrollo del Plan Nacional del Buen Vivir, se realiza la difusión de las bases para convocatorias a Institutos de Investigación, Institutos de Educación Superior y Escuelas Politécnicas, Biodiversidad, Becarios y ex becarios. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación realizó la difusión de las convocatorias a través de diversos comunicados como se detalla a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. -En los meses de enero y febrero del 2015, se realizó la difusión de la convocatoria para el Programa Regional STIC-Amsud" y la "8ª Convocatoria del Programa Regional MATH-Amsud". Estas son iniciativas de la Cooperación Francesa y sus contrapartes en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela orientada a promover y fortalecer la colaboración y la creación de redes de investigación-desarrollo en los ámbitos de las ciencias, tecnologías de la información y las comunicaciones (STIC), y de las matemáticas (MATH) a través de la realización de proyectos conjuntos. 2. -Se realizó la difusión de la convocatoria para Instituciones de Educación Superior y Escuelas Politécnicas, para presentar proyectos de investigación en el área de la construcción y vivienda con materiales alternativos y de bajo costo que contribuyan al Plan Nacional de Desarrollo y fortalezcan el rol del conocimiento, a través del portal web y los canales de difusión oficial de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 3. -Con el afán de promover y estimular la iniciativa y creatividad científico - tecnológica en los estudiantes que están cursando el último año de carrera o se graduaron desde Junio del 2014 en las Universidades y Escuelas Politécnicas tanto públicas como privadas del país. En los meses de Mayo y Junio del 2015 como parte del proceso de socialización del Concursos Galardones 2015, se realizó la difusión del mismo cumpliendo con un cronograma de visitas a un total de 51 Universidades en todo el Ecuador así como también, se publicaron las bases del concurso en el portal web y los canales de difusión oficial de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 4. -Se realizó la invitación y difusión de las bases específicas para convocatorias orientadas a los 12 Institutos Públicos de Investigación y sus anexos respectivos, de igual forma estas se encuentran publicadas permanentemente en el portal web de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, particularmente en el siguiente link: http://www.educacionsuperior.gob.ec/bases-marco-de-aplicacion-para-la-presentacion-de-programas-y-proyectos-de-inevestigacion-cientifica-y-desarrollo-tecnologico-en-el-ecuador/. 5. -Se difundieron las bases específicas para convocatorias orientadas a Becarios y Ex becarios en el portal web, en eventos institucionales y en los canales de difusión oficial de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Las mencionadas bases pueden ser encontradas en el siguiente link: http://www.educacionsuperior.gob.ec/bases-marco-de-aplicacion-para-la-presentacion-de-programas-yo-proyectos-de-inevestigacion-cientifica-y-desarrollo-tecnologico-en-el-ecuador/ <p>Por lo antes expuesto, la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación con la aprobación de la difusión de las Bases de Convocatoria detalladas anteriormente, da cumplimiento al Hito Nro. 82.</p> <p>En el mes de Julio se realizaron transferencias por un total de \$140403.83</p>		
<p>JUNIO 2015</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con el objetivo de establecer las normas que regulen los procesos de las convocatorias de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, para el financiamiento de los programas y/o proyectos de investigación científica y Desarrollo tecnológico, dirigidas a los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, del Ecuador, acorde a los objetivos de desarrollo del Plan Nacional del Buen Vivir. En tal virtud, la Comisión Ejecutiva de Programas y/o Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (I+D) por delegación del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; mediante acta Nro. CEPPID-SDIC-020-2015, aprobó las bases específicas para las convocatorias dirigidas a Institutos de Investigación, del mismo modo, mediante acta Nro. CEPPID-SDIC-020-2015, aprobó las bases específicas para las convocatorias dirigidas a becarios y ex becarios. Adicionalmente mediante acuerdo Nro. 2015-016, se aprobó las bases de aplicación para la convocatoria para la presentación de Proyectos de Investigación Científica en Biodiversidad, dando cumplimiento al Hito Nro. 79. 2. Se fortalece la investigación científica en los Institutos Públicos de Investigación (IPIs). La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la Subsecretaría de Investigación Científica, llevó a cabo los días martes 02 y miércoles 03 de junio del presente año, en la ciudad de Guayaquil, el taller "Planificación y redacción de programas y/o proyectos de investigación científica dentro del formato gestión basada en resultados (RBM)", con el objetivo de fortalecer el proceso en la presentación de proyectos de investigación. El taller estuvo dirigido a los investigadores de los distintos Institutos Públicos de Investigación (IPIs) y se trataron temas como la descripción de herramientas y procesos involucrados en la planificación e implementación del modelo de gestión de proyectos de investigación basado en resultados (RBM); introducción para la presentación de notas conceptuales y la realización de ejemplos prácticos y métodos apropiados para completar de forma correcta todas las secciones de las notas conceptuales. 	<p>Pineda González, Leonardo Fabián</p>	<p>03/07/2015 - 03:31 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3. De acuerdo al cronograma previsto, durante el mes de junio se realizaron socializaciones del III Concurso Galardones Nacionales 2015 en las siguientes universidades: Escuela Politécnica Nacional, Universidad SEK, Universidad Tecnológica Equinoccial, Universidad San Francisco de Quito, Universidad Politécnica Salesiana, Universidad Tecnológica Israel, Universidad de los Hemisferios, Universidad Internacional del Ecuador, Universidad de las Américas.</p> <p>Adicionalmente, se mantuvieron reuniones con los vicerrectores académicos de la Universidad Central, Escuela Politécnica Nacional y Universidad Metropolitana para asegurar una mejor difusión del concurso. Mediante el desarrollo de estas actividades, se asegura la participación de la mayor cantidad de estudiantes en el III Concurso Galardones Nacionales 2015.</p> <p>4. Se realizaron en el mes de junio transferencias a institutos de investigación con un valor de \$9.728.201.41.</p>		
<p>ABRIL 2015</p> <p>1. Mediante Comisión Ejecutiva de Programas y Proyectos de Investigación Científica, llevada a cabo el 22 de abril de 2015, se aprobaron las "CONVOCATORIA ESPECÍFICA PARA INSTITUTOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN", mediante las cuales los INSTITUTOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN pueden postular programas y/o proyectos de investigación científica, de acuerdo a las Bases Marco de aplicación para la presentación de programas y/o proyectos de investigación científica y desarrollo en el Ecuador., que entra en vigencia desde el 16 de Abril del 2015, esta actividad está relacionada al Hito 75.</p> <p>2. En el marco del Convenio CYTED, programa intergubernamental de cooperación multilateral en Ciencia y Tecnología, se fija una cuota para el Ecuador correspondiente a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.000,00), los cuales serán aportados anualmente, por lo antes expuesto y con la autorización de pago generada con Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-2015-0075-MI, por la Srta. Rina Catalina Pazos Padilla. SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, se autoriza el pago de valores correspondientes a los años 2014 y 2015 relacionado con el hito Nro. 76</p> <p>3. En el mes de Abril no se realizaron transferencias.</p>	<p>Pineda González, Leonardo Fabián</p>	<p>03/05/2015 - 07:34 PM</p>
<p>MARZO 2015.</p> <p>1. Mediante Comisión Ejecutiva de Programas y Proyectos de Investigación Científica, llevada a cabo el 05 de marzo de 2015, se aprobaron las "Bases de Aplicación de la Convocatoria Específica para Instituciones Públicas de Educación Superior", mediante las cuales las Universidades y Escuelas Politécnicas pueden postular programas y/o proyectos de investigación científica, de acuerdo a las Bases Marco de aplicación para la presentación de programas y/o proyectos de investigación científica y desarrollo en el Ecuador. Esta actividad está relacionada al Hito 73.</p> <p>2. En la sesión de Selección y Adjudicación de Programas y/o Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (I+D), financiadas o cofinanciadas por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, celebrada en la ciudad de Quito el Día 30 de diciembre de 2014, se resolvió por unanimidad seleccionar y adjudicar la propuesta de investigación "Mejora de la cadena productiva del chocho (Lupinus mutabilis) en Ecuador", presentado por la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. Esta actividad esta relacionada al Hito 74.</p> <p>3. Mediante Oficio Nro. SENESCYT-DODC-2015-0001-CO, de 06 de enero de 2015, se notificó a la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE que el proyecto fue seleccionado y adjudicado para su ejecución desde el año 2015.</p> <p>4. Se realizó una transferencia por US\$ 500.000,00</p>	<p>Araque Intriago, Eloiza Gabriela</p>	<p>02/04/2015 - 05:13 PM</p>
<p>FEBRERO, 2015</p> <p>1.- Mediante memorando Nro. SENESCYT-SESCT-2015-0015-MI, del 13 de febrero de 2015, se autoriza y se solicita se realice el trámite correspondiente para la transferencia de recursos a los Institutos Públicos de Investigación - IPI's por un valor de USD 6.204.520,49. Cabe recalcar que con el dictamen de prioridad de SENPLADES, la SENESCYT modificó en el sistema esigef del Ministerio de Finanzas, así como los Institutos. Se cumplió esta actividad relacionado al hito 72.</p> <p>2.- Con la sesión de la Comisión celebrada el día martes 03 de marzo de 2015, se da cumplimiento al hito 71.</p> <p>3.- Durante el mes de febrero el total de transferencias es de US\$ 3.184.726,16.</p>	<p>Araque Intriago, Eloiza Gabriela</p>	<p>05/03/2015 - 11:31 AM</p>
<p>ENERO 2015</p> <p>1.- El Proyecto I+D+I se encuentra alineado con el Programa de Gestión de Inversión (PGI)</p> <p>2.- La Coordinación de Planificación de la Subsecretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación socializó el POA 2015 para la Subsecretaría de Investigación Científica, asociado al hito 69.</p> <p>3.- En asociación al hito 70, durante el mes de enero se realizaron los trámites respectivos para realizar la transferencia para los proyectos de investigación en ejecución.</p> <p>4.- No se realizaron transferencias durante el mes de enero 2015.</p>	<p>Araque Intriago, Eloiza Gabriela</p>	<p>09/02/2015 - 03:03 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2014</p> <p>1.- En Alcance al resumen ejecutivo anterior por error involuntario no se detalla la asociación del hito correspondiente.</p> <p>2.- Se menciona que durante el mes de diciembre se presentaron a comisión los proyectos relacionados a la convocatoria abierta, los que cumplieron, a la fecha las dos etapas de evaluación conforme a las bases de la convocatoria. En la sesión de la Comisión de Selección y Adjudicación de Programas y/o Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (I +D), financiados o cofinanciados por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, celebrada en la ciudad de Quito el día 30 de diciembre de 2014, resolvió por unanimidad, aprobar los proyectos de investigación presentados por la Universidad de Cuenca y por la Universidad de las Fuerzas Armadas, el cual se encuentra asociado al Hito 65.</p> <p>3.- De igual manera se notificó a las mencionadas Universidades sobre la resolución de la comisión, asociado al Hito 66.</p> <p>4.- En asociación al hito 67 se presentó a comisión los proyectos presentados de la Convocatoria de FWO (convocatoria cerrada). Resolviendo aprobar los cinco proyectos aprobados por parte de los pares externos.</p> <p>5.- Se presentó a la comisión ejecutiva de programas y/o proyectos I+D el informe de pertinencia, asociación con el hito 68</p> <p>6.- Se cerró el riesgo por el cumplimiento de la fecha, el mismo que se reestructurará para el riesgo 2015, conforme a lo conversado en reuniones mantenidas.</p> <p>7.- Durante el mes de diciembre no se han realizado transferencias.</p>	<p>Araque Intriago, Eloiza Gabriela</p>	<p>05/01/2015 - 04:27 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2014</p> <p>1.- Durante el mes de diciembre se presentaron a comisión los proyectos relacionados a la convocatoria abierta, los que cumplieron, a la fecha las dos etapas de evaluación conforme a las bases de la convocatoria. En la sesión de la Comisión de Selección y Adjudicación de Programas y/o Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (I+D), financiados o cofinanciados por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, celebrada en la ciudad de Quito el día 30 de diciembre de 2014, resolvió por unanimidad, aprobar los proyectos de investigación presentados por la Universidad de Cuenca y por la Universidad de las Fuerzas Armadas. De igual manera se notificó a las mencionadas Universidades sobre la resolución de la comisión.</p> <p>2.- Durante el mes de diciembre no se han realizado transferencias.</p>	<p>Araque Intriago, Eloiza Gabriela</p>	<p>05/01/2015 - 03:06 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2014</p> <p>1.- En relación al compromiso adquirido en la reunión del 17 de noviembre de 2014, debo informar que la Subsecretaría de Investigación Científica no se encuentra alineada al Programa Nacional de Gobierno Electrónico.</p> <p>2.- Se cerró el problema "Acta de adjudicación", asociado al hito No. 61.</p> <p>3.- Se cerró el problema "Ferias zonales de galardones y preselección de proyectos realizados", asociado al Hito No. 59. Adicionalmente se realizó la FERIA NACIONAL DE EXPOSICION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, CORRESPONDIENTES AL II CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA: GALARDONES 2014. Durante el concurso Galardones 2014, se receptaron 273 programas y/o proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, correspondiente a 7 áreas del conocimiento. Se receptaron proyectos provenientes de 12 provincias del país y de 44 universidades del país entre públicas, privadas y cofinanciadas. Se contempló el reconocimiento a proyectos con componentes de innovación y saberes ancestrales.</p> <p>4.- Respecto al compromiso sobre los indicadores mencionados en el marco lógico del proyecto, se puede decir que el indicador "Número de convocatorias para la presentación de programas y proyectos de I+D a los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación"; nos describe el fomento de la investigación a través de llamamientos para la presentación de programas y proyectos de I+D. Sin embargo es necesario detallar el número de proyectos presentados por cada convocatoria.</p> <p>5.- Durante el mes de noviembre no se han realizado transferencias.</p>	<p>Araque Intriago, Eloiza Gabriela</p>	<p>03/12/2014 - 05:51 PM</p>
<p>OCTUBRE 2014</p> <p>1.- Se realizó la adjudicación de la Consultoría contratada, Investigación especializada en la Cuenca del Rio Napo. El plazo de ejecución es a partir del pago del anticipo.</p> <p>2.- Se recibieron 42 perfiles de proyectos de investigación científica, de los cuales 29 proyectos pasaron a Comisión Ejecutiva de Programas y/o Proyectos de I+D de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y los 13 proyectos restantes se encuentran en la etapa de evaluación técnica, financiera y jurídica.</p> <p>Por el mes de octubre se ha realizado un total de US\$ 9.176.978,00 en transferencias.</p>	<p>Araque Intriago, Eloiza Gabriela</p>	<p>05/11/2014 - 11:10 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>De la convocatoria abierta se han recibido hasta el mes de septiembre, 73 notas conceptuales, de los cuales hasta el momento, dos proyectos han superado la etapa de evaluación por pares externos. Se realizó la Feria Nacional del II Concurso de Reconocimiento a la Investigación Universitaria Estudiantil : Galardones Nacionales 2014, mediante el cual participaron 273 proyecto, de los cuales 50 fueron elegidos cumpliendo los parámetros de selección.</p> <p>Por el mes de septiembre 2014, se ha realizado la transferencia de US\$ 18.900,00</p>	Araque Intriago, Eloiza Gabriela	06/10/2014 - 11:35 AM
<p>Agosto 2014</p> <p>1. Para el cumplimiento del Hito Nro. 62, durante los primeros meses de vigencia de la convocatoria para la presentación de programas y/o proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico se han recibido 56 programas y/o proyectos de las diferentes universidades y escuelas politécnicas públicas acreditadas a nivel nacional. Al ser esta convocatoria abierta, se continúa receptando las notas conceptuales correspondientes a las propuestas de investigación y desarrollo tecnológico. Adicionalmente, en este mes se realizó la resolución e inicio de pliegos de la Consultoría a contratar, sin embargo, se requiere un plazo de 30 días, que establece el sistema del compras públicas, por lo que la contratación de la consultoría se realizará los primeros días de octubre.</p> <p>No se han realizado transferencias durante este mes.</p>	Araque Intriago, Eloiza Gabriela	05/09/2014 - 03:42 PM
<p>JULIO 2014:</p> <p>1. Mediante Acuerdo Nro. 2014-052, emitido el 10 de abril de 2014, se reformó el Cronograma emitido el 17 de febrero de 2014 mediante el acuerdo Nro. 2014-024 con las Bases de Aplicación para el "II Concurso de Reconocimiento a la Investigación Universitaria Estudiantil, Galardones Nacionales, Convocatoria 2014". Este cambio se lo realizó debido a la ampliación de plazo de presentación de proyectos, por motivo que las universidades del régimen costa se encontraban en periodo de vacaciones dificultando el proceso de difusión y socialización del concurso que podría llevar a una presentación menor de proyectos de investigación provenientes de esa región, lo cual se puede observar en la prórroga asociada al Hito Nro. 61 (informe que será presentado el día 02 de septiembre de 2014).</p> <p>2. En el mes de Julio se realizó una transferencia de 282 709,37 USD</p>	Gordillo Salinas, Mario Andrés	22/08/2014 - 08:44 AM
<p>JUNIO 2014:</p> <p>1. Mediante Oficio Nro. SENESCYT-SDIC-2014-0276-CO del 30 de junio de 2014, se recordó a los Institutos Públicos de Investigación que la convocatoria para la presentación de Programas y/o Proyectos de Investigación Científica con base al Reglamento de Selección y Adjudicación de Programas y/o Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (I+D) Financiados o Cofinanciados por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación a través del acuerdo N° 2012-009, de 06 de febrero de 2012, es de carácter permanente. Por tal motivo se invitó a los Institutos Públicos de Investigación a seguir presentando programas y/o proyectos de Investigación Científica, acorde a las áreas y Uneas de investigación vigentes. (Relacionado al hito Nro. 60).</p> <p>2. En cumplimiento del indicador trimestral del proyecto de inversión de I+D, se generó el lanzamiento de la convocatoria para la PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, firmado el día 12 de mayo de 2014 en la ciudad de Quito por parte del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. (Relacionado con el indicador trimestral mayo-junio).</p> <p>3. Durante el mes de Junio se realizó la siguiente transferencia: US\$ 376.670,04 en el PROYECTO DE I+D+I</p>	Gordillo Salinas, Mario Andrés	22/08/2014 - 08:41 AM
<p>MAYO 2014:</p> <p>1. El 12 de mayo de 2014 el Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación procedió a suscribir el Acuerdo Nro. 2014-076 a través del cual se expidieron las bases de aplicación para la "Convocatoria para la presentación de programas y/o proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico". (Relacionado al hito Nro. 54).</p> <p>2. El 20 de mayo de 2014 se suscribió el convenio específico para el financiamiento del proyecto "Estudio de incremento de eficiencia energética en plantas termoeléctricas" presentado por el Instituto nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables. (Relacionado al hito Nro. 56).</p> <p>3. El 12 de mayo de 2014 el Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación realizó el lanzamiento de la Convocatoria para la presentación de programas y/o proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, mediante rueda de prensa. (Relacionado al hito Nro. 57).</p> <p>4. Los términos de referencia de la consultoría (investigación especializada en la cuenca del Río Napo) han sufrido modificaciones y retroalimentaciones permanentes debido a que abordará</p>	Campoverde Jami, Mónica Patricia	03/06/2014 - 03:20 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>problemas sensibles desde el punto de vista social y ambiental. Considerando que los TDRs se encuentran validados y en proceso de subirse al portal de compras públicas, se espera que el cumplimiento de este hito sea el 29 de agosto de 2014. (Relacionado al hito Nro. 58).</p> <p>5. Con la finalidad de asegurar una participación masiva y equitativa de estudiantes de diversas instituciones de educación superior, más aun considerando que en el ciclo costa se encuentran en periodo vacacional, se cambió el cronograma del "II Concurso de Reconocimiento a la Investigación Universitaria Estudiantil, Galardones Nacionales, Convocatoria 2014"; por tanto, la actividad relacionada con las ferias zonales de galardones y preselección de proyectos se llevará a cabo el 19 de septiembre de 2014 y el cumplimiento de este hito se lo realizará el 30 de septiembre de 2014. (Relacionado al hito Nro. 59).</p> <p>6. No se registran transferencias en el presente mes.</p>		
<p>ABRIL 2014:</p> <p>1. Las bases de la "Convocatoria Abierta 2014" fueron terminadas y actualmente se encuentran desarrollándose los procesos administrativos y jurídicos respectivos para realizar el lanzamiento de la convocatoria el 22 de mayo de 2014; por ello, el reporte del cumplimiento de este hito se prevé se realice hasta el 30 de mayo de 2014. (Relacionado al hito Nro. 54)</p> <p>2. Se realizó el pago del aporte anual hacia el Instituto Interamericano para la Investigación al Cambio Global -IAI, con el cual se cumplió con las disposiciones financieras del Acuerdo suscrito con esta organización intergubernamental compuesto por 19 países de las Américas que busca la excelencia científica, la cooperación internacional y el intercambio abierto de información científico. (Relacionado al hito Nro. 55).</p> <p>3. Actualmente se encuentra elaborándose el convenio específico para el financiamiento del proyecto "Estudio de incremento de eficiencia energética en plantas termoeléctricas" presentado por el Instituto nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables; por ello el cumplimiento de este hito se prevé realizarlo hasta el 30 de mayo de 2014. (Relacionado al hito Nro. 56).</p> <p>4. No se registran transferencias en el presente mes.</p>	<p>CADENA FUERTES, JOSÉ RUPERTO</p>	<p>05/05/2014 - 05:36 PM</p>
<p>MARZO 2014:</p> <p>1. Se procedió a notificar al Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables, al Instituto Nacional de Investigaciones en Salud Pública, al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural sobre la selección y adjudicación de los proyectos presentados. (Relacionado al hito Nro. 53).</p> <p>2. Se encuentra en etapa de revisión los borradores de las bases de la Convocatoria Abierta 2014 ya que se requiere contar con los aportes de un Prometeo experto en el tema. Por ello, el cumplimiento de este hito se prevé se realice hasta el 30 de abril de 2014. (Relacionado al hito Nro. 54)</p> <p>3. Se encuentra en trámite la transferencia anual que se realiza al Instituto Interamericano para la Investigación al Cambio Global -IAI. Se contempla el cumplimiento de este hito el 30 de abril de 2014 (Relacionado al hito Nro. 55).</p> <p>4. De conformidad con los convenios específicos suscritos entre los Institutos Públicos de Investigación, una empresa pública, una escuela politécnica y esta Secretaría de Estado, se procedió a realizar el desembolso de los valores correspondientes al año 2014 al INIAP por el valor de \$ 29.381,22.</p>	<p>Campoverde Jami, Mónica Patricia</p>	<p>04/04/2014 - 11:56 AM</p>
<p>FEBRERO DE 2014</p> <p>El Director de Orientación, Diseño y Coordinación de la Investigación Científica preparó un informe con componentes técnicos, financieros y legales de las 18 propuestas presentadas por diversas instituciones a fin de que las mismas puedan ser adjudicadas por esta Secretaría de Estado. Este informe fue presentado a la Comisión Ejecutiva de Proyectos I+D+i (Asociación Hito Nro. 50 con retraso).</p> <p>La Comisión anteriormente mencionada se reunió el 14 de febrero de 2014 a fin de analizar las propuestas presentadas por las instituciones, ante lo cual resolvió: aprobar 1 proyecto, solicitar aclaración a 4 proyectos y rechazar 13 proyectos (Asociación Hito Nro. 51).</p> <p>De conformidad con los convenios específicos suscritos entre los Institutos Públicos de Investigación y esta Secretaría de Estado, se procedió a realizar el desembolso de los valores correspondientes al año 2014 (Asociación Hito Nro. 52), mismos que se detallan a continuación:</p> <p>INOCAR: \$ 1.464.946,74 INAMHI: \$ 1.474.475,05 INPC: \$ 1.674.445,64 INIAP: \$ 1.934.389,41 IGM: \$ 143.925,43 IEE: \$ 971.448,39 INER: \$ 610.868,57 INP: \$ 3.619.101,74 INSPI: \$ 2.711.512,58 TOTAL: \$ 14.605.113,55</p>	<p>Campoverde Jami, Mónica Patricia</p>	<p>05/03/2014 - 12:01 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO 2014 Se realizaron los trámites con las instancias pertinentes para la transferencia de fondos correspondientes al año 2014 a los proyectos ejecutados por los Institutos Públicos de Investigación, por el monto total de US\$14.605.113,55</p>	<p>Campoverde Jami, Mónica Patricia</p>	<p>03/02/2014 - 05:45 PM</p>
<p>DICIEMBRE DE 2014 Hito Nro. 48: "Propuesta de Decreto Ejecutivo de Fusión de IPIS acordada interinstitucionalmente, elaborada" Mediante Oficio Nro. SENESCYT-SESCT-2013-1784-CO la SENESCYT envió oficialmente los borradores de las propuestas de decreto de fusión de los Institutos Públicos de Investigación a la SENPLADES a fin de que esta institución emita el respectivo aval. Es preciso indicar que estos documentos fueron trabajados previamente con los delegados de la SENPLADES.</p> <p>Hitos Nro. 49 "Revisión final de pertinencia realizada" y Nro. 50: "Informe para la Comisión Ejecutiva de proyectos I+D+I preparado" Debido a la falta de personal de la Dirección de Orientación, no fue posible realizar la revisión final de pertinencia de los programas y proyectos presentados por las instituciones para el financiamiento por parte de la SENESCYT; por ello, una vez pedida la colaboración del personal de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de proyectos, se prevé que la revisión y por ende el cumplimiento del hito Nro. 49 se la realice hasta finales de enero de 2014; adicionalmente el hito Nro. 50 será cumplido máximo hasta el 05 de febrero de 2014, debido a que requiere de los insumos del hito Nro.49.</p> <p>TRANSFERENCIAS: Con fecha 02 de diciembre de 2013, se realizó el traspaso de fondos a los cinco proyectos a ser ejecutados por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca - ETAPA EP, por el monto de US\$491.842,51</p>	<p>Campoverde Jami, Mónica Patricia</p>	<p>02/01/2014 - 12:22 PM</p>
<p>NOVIEMBRE DE 2013 Hito 47: "REVISIÓN INICIAL DE PERTINENCIA REALIZADA" Una vez receptadas los programas y proyectos presentados por los IPIs para el financiamiento por parte de esta Secretaría de Estado, se procedió a realizar una revisión inicial a los mismos, la cual consistió en identificar el objetivo general y los resultados propuestos en los proyectos; verificar su presentación en físico y digital de los proyectos; revisar el monto total a ser financiado por parte de esta Secretaría de Estado; identificar la zona de impacto, la tipología, el área de investigación y el plazo y finalmente identificar las instituciones co-ejecutoras, el director y el número de investigadores que participarán en el proyecto.</p> <p>TRANSFERENCIAS Con fecha 22 de noviembre se realizó el traspaso de fondos al proyecto a ser ejecutado por: -Instituto Nacional de Patrimonio Cultural por el monto de US\$18.900</p>	<p>Campoverde Jami, Mónica Patricia</p>	<p>02/12/2013 - 03:23 PM</p>
<p>OCTUBRE 2013 Con la finalidad de promover la generación y apropiación del conocimiento entre los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, a través del financiamiento de programas y proyectos de I + D en áreas prioritarias para el país, se procedió a aceptar las propuestas de programas y proyectos presentados por los Institutos Públicos de Investigación y otros actores de Ciencia y Tecnología. Las propuestas están enfocadas en el cambio de matriz productiva y la satisfacción de necesidades básicas de la población, priorizando la articulación de actores como Universidades, Empresas y otras instituciones que desarrollen investigación en el país enmarcados en los objetivos 10 y 11 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. Se aceptaron 14 propuestas las cuales serán analizadas tanto técnica como financieramente, para su posterior aprobación de ser el caso.</p>	<p>Campoverde Jami, Mónica Patricia</p>	<p>01/11/2013 - 09:50 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2013: Con la finalidad de socializar la metodología y los parámetros para la presentación de programas y proyectos I+D, se llevó a cabo un taller que estuvo dirigido a los institutos públicos de investigación e instituciones de educación superior. Durante el taller se brindaron las herramientas metodológicas básicas para que los investigadores presenten propuestas para ser consideradas para el financiamiento por parte de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Por otro lado, con el objetivo de optimizar el aparato administrativo-financiero de los institutos públicos de investigación se ha elaborado una propuesta de fusión la cual fue socializada con todos los ministerios sectoriales relacionados; en este proceso la presencia del MCCTH fue permanente. Esta propuesta fue aprobada por el Señor Presidente en el Gabinete de Talento Humano de 03 de septiembre de 2013.</p>	<p>Campoverde Jami, Mónica Patricia</p>	<p>01/10/2013 - 10:23 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO 2013 El taller para socialización de la metodología de presentación de programas y proyectos de investigación, llevado a cabo en la ciudad de Riobamba, específicamente en la Universidad Nacional de Chimborazo, tuvo la participación de aproximadamente 100 investigadores y docentes. En este encuentro se analizó el formato para la presentación de proyectos I+D, enfatizando los factores a considerarse para realizar el resumen ejecutivo, los procesos para elaborar el estado del arte en el tema de investigación del proyecto, la definición del problema y justificación de la investigación, así como la metodología y los resultados esperados. Por otro lado, el Subsecretario de Investigación Científica encargado nuevamente instó a los Institutos Públicos de Investigación a presentar proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D) para su financiamiento por parte de la SENESCYT, considerando las prioridades de cada uno de los sectores y la política de ciencia y tecnología.</p>	<p>Campoverde Jami, Mónica Patricia</p>	<p>02/09/2013 - 10:43 AM</p>
<p>JULIO 2013: De conformidad con el Reglamento de Selección y Adjudicación de Programas y / o Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (I+D) financiados o cofinanciados por la SENESCYT, se realizó décimo séptima reunión de la Comisión Ejecutiva de proyectos I+D en la que se aprobaron cinco proyectos presentados por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Gestión Ambiental - ETAPA y un proyecto presentado por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología -INMAHI.</p>	<p>Campoverde Jami, Mónica Patricia</p>	<p>01/08/2013 - 10:35 AM</p>
<p>JUNIO 2013: Durante este mes fueron realizadas tres transferencias para el financiamiento de proyectos de investigación y de fortalecimiento institucional a ser ejecutados por el Instituto Espacial Ecuatoriano, el Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico y el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables por un valor total de US\$2.107.591,06.</p>	<p>Campoverde Jami, Mónica Patricia</p>	<p>04/07/2013 - 01:57 PM</p>
<p>MAYO 2013: Se consiguió la firma de los convenios específicos para el financiamiento de varios proyectos de investigación correspondiente a la segunda fase, producto que culminó con el desembolso de valores a todas las instituciones cuyos proyectos fueron aprobados. Por otro lado, se llevó a cabo la Reunión interinstitucional para revisión y /o validación de matriz de competencias y modelo de gestión entre el MAGAP, el INIAP y la SENESCYT, en la cual se solicitó remita un documento que justifique técnicamente la incorporación de un competencia más en la matriz del modelo de gestión y una dirección técnica adicional en la estructura orgánica del nivel central del INIAP.</p>	<p>Campoverde Jami, Mónica Patricia</p>	<p>03/06/2013 - 12:57 PM</p>
<p>ABRIL DE 2013: Se realizó una reunión con los Institutos Públicos de Investigación a fin de estructurar el presupuesto final de los proyectos de investigación que serían puestos en consideración de la Comisión para el financiamiento de las mismas; por otro lado se llevó a cabo la reunión de la Comisión Ejecutiva de proyectos I+D+I y la notificación de sus resultados se realizaron a las instituciones postulantes en los días posteriores.</p>	<p>Campoverde Jami, Mónica Patricia</p>	<p>02/05/2013 - 10:08 PM</p>
<p>MARZO 2013: Reunión interinstitucional llevada a cabo en la cual se revisó y /o validó de matriz de competencias y modelo de gestión que forman parte del Ministerio de Defensa: Instituto Oceanográfico de la Armada, Instituto Geográfico Militar, Instituto Espacial Ecuatoriano y el Instituto Antártico Ecuatoriano. Por otro lado, se realizó la transferencia de fondos a los proyectos aprobados por la Comisión de Programas y Proyectos de I+D. Finalmente, el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP ha finalizado con su diseño institucional, ya que su matriz de competencias y modelo de gestión cumple con los lineamientos establecidos por esa Secretaría de Estado</p>	<p>Campoverde Jami, Mónica Patricia</p>	<p>01/04/2013 - 06:30 PM</p>
<p>FEBRERO: Durante este mes se realizó la notificación sobre los resultados de los proyectos presentados por los Institutos Públicos de Investigación y cuya reunión de selección y adjudicación fue efectuada en el mes de enero 2013. Adicionalmente, se llevó a cabo la XI Reunión de la Comisión Ejecutiva de proyectos I+D+I, cuyos resultados sobre los proyectos adjudicados fueron notificados en el mismo mes a las Instituciones involucradas.</p>	<p>Campoverde Jami, Mónica Patricia</p>	<p>01/03/2013 - 11:27 AM</p>
<p>ENERO DE 2013: Se realizó la notificación a los Institutos Públicos de Investigación sobre los programas y/o proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico que fueron analizados, aprobados y/o negados por la Comisión I+D para la selección y adjudicación. Por otro lado, se realizó una nueva reunión de la Comisión Ejecutiva de proyectos I+D+I en la que se aprobaron proyectos y programas presentados por los IPIs. Es preciso indicar que los presupuestos finales de dichos programas y proyectos fueron estructurados en base a las indicaciones otorgadas por la SENESCYT en reuniones personalizadas.</p>	<p>Campoverde Jami, Mónica Patricia</p>	<p>04/02/2013 - 10:38 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2012: Mediante Memorando Nro. SENESCYT-SDIC-2012-0676-Mi, el Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en su calidad de Patrocinador Ejecutivo del proyecto K003 Proyectos I+D+i, autorizó la modificación de la fecha de cumplimiento del hito Nro. 24: WProgramas y proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico analizados, aprobados y/o negados por la Comisión I+D para la selección y adjudicación de ser el caso", hasta el 31 de enero de 2013, debido a que previo a la reunión de la comisión, es necesario contar el presupuesto para el financiamiento de nuevos proyectos.</p>	<p>Campoverde Jami, Mónica Patricia</p>	<p>28/12/2012 - 06:00 PM</p>
<p>Se brindó apoyo en la organización de los eventos: IV Congreso Ecuatoriano de Ingeniería en Alimentos y las XIII Jornadas de Ciencia y Tecnología en Alimentos y "Cuarto Congreso Nacional de Electricidad y Energías Alternativas & Expo Electricidad Ecuador 2012". Para el primero, se apoyó con un Prometeo y difusión por la página web de la SENESCYT y para el segundo, se colaboró con material impreso, difusión a través de la web institucional y la presencia de un stand de la SENESCYT en el evento.</p>	<p>Campoverde Jami, Mónica Patricia</p>	<p>03/12/2012 - 12:34 PM</p>
<p>NOVIEMBRE: Debido a que la Comisión Permanente del Conocimiento resolvió que se realizará una priorización como paso previo a la selección de proyectos de I+D postulados por los IPI's, los informes de pertinencia de los proyectos presentados en el último llamamiento serán revisados por la Comisión que se reunirá el segundo jueves del mes de diciembre; en este sentido, el hito Nro. 22 denominado: "Informe de pertinencia realizado en base a los programas y/o proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico presentados por los Institutos de Investigación Científica" se lo cumplirá a finales del mes de diciembre de 2012.</p>	<p>Campoverde Jami, Mónica Patricia</p>	<p>30/11/2012 - 06:20 PM</p>
<p>OCTUBRE 2012: Se realizó la propuesta de Decreto Ejecutivo del Instituto Nacional de la Biodiversidad, el cual fue acordado interinstitucionalmente con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio Coordinador del Conocimiento y Talento Humano.</p> <p>SEPTIEMBRE 2012: Se realizó un llamamiento para presentar proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico. Se realizó el segundo desembolso de proyecto de Línea de Financiamiento de Investigaciones del INIAP.</p> <p>AGOSTO 2012: Se conformó el equipo de trabajo y se definió la hoja de ruta para la reforma institucional del INPC, INIGER y los Institutos de la Defensa. Se finalizó el trámite de reforma del INHMT LIP mediante la escisión en el INSPI y la ARCSA, así como el trámite de la expedición del Decreto de Rectoría de la SENESCYT sobre los IPIs.</p> <p>JULIO 2012: La Comisión aprobó cuatro proyectos del INMTH-LIP, tres del INIGEMM y se negó tres proyectos del INMTH-LIP por no cumplir con los requisitos establecidos en la pertinencia establecida en el Reglamento. Se desembolsó los valores correspondientes al proyecto que fuera presentado por el INAE. Se definió la hoja de ruta para la reforma institucional del INP. Se conformó el equipo de trabajo y se definió hoja de ruta para la reforma institucional del INIAP.</p> <p>JUNIO 2012: Se desembolsó los valores correspondientes a dieciocho proyectos del INIAP que fueron adjudicados en abril de 2012, así como los valores correspondientes al proyecto del INOCAR adjudicado en mayo de 2012.</p> <p>MAYO 2012: Se notificó al INIAP e INOCAR sobre Resolución tomada por la Comisión respecto a los proyectos presentados. Se dispuso a la Coordinación de Asesoría Jurídica de la SENESCYT realice la elaboración de los respectivos convenios específicos. Por otro lado se realizó el desembolso al INOCAR por el proyecto adjudicado en el mes de marzo de 2012.</p> <p>ABRIL 2012: La Comisión resolvió aprobar dieciocho proyectos del INIAP, uno del INOCAR y negar doce proyectos del INIAP por no cumplir con el análisis de pertinencia. Adicionalmente, se aprobaron los nuevos formatos para la presentación de los programas y/o proyectos de investigación científica. Por otro lado, se desembolsó los valores correspondientes a los proyectos del INAMHI, INPC, INIGEMM, INOCAR e INP, adjudicados en marzo de 2012.</p> <p>MARZO 2012: La Comisión resolvió adjudicar a los proyectos presentados por los institutos INOCAR, INAMHI, INP, INIGEMM e INPC. Se procedió a notificar sobre este particular a los institutos adjudicatarios y se notificó a la Coordinación de Asesoría Jurídica para la elaboración de los convenios específicos. Por otro lado, se realiza tres desembolsos para financiar proyectos y un auspicio al INIAP.</p> <p>FEBRERO 2012: Se realizó la primera reunión de la Comisión Ejecutiva de Programas y/o de Proyectos I+D, en la cual se aprobaron los nuevos formatos que permitieron realizar el respectivo análisis de pertinencia y aprobación, de ser el caso, de los proyectos presentados. En una segunda reunión, la Comisión solicitó se subsanen los informes de pertinencia de los proyectos presentados por el INIAP, INOCAR, INP, INAMHI, INP e INIGEMM.</p> <p>AÑO 2011: Se realizó el análisis científico, técnico y financiero a fin de seleccionar las mejores propuestas presentadas por las diversas instituciones. Se procedió a notificar y posteriormente a desembolsar los fondos a los proyectos adjudicatarios. Se organizó el Taller para la evaluación de proyectos de investigación científica</p> <p>AÑO 2010: Se preparó y envió a la SENPLADES el Proyecto I+D+i, a fin de obtener el respectivo dictamen de prioridad por parte de la SENPLADES.</p>	<p>Campoverde Jami, Mónica Patricia</p>	<p>28/11/2012 - 04:51 PM</p>

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Adjudicación de Galardones realizada Galardones Nacionales	05/10/2015	Laura Cristina Cordero Paez	10	10	1	0/1
Contratación Consultoría realizada	05/10/2015	Laura Cristina Cordero Paez	10	10	1	0/1
Proceso de contratación de la consultoría	05/10/2015	Laura Cristina Cordero Paez	10	10	1	0/1

Problemas cerrados: 5, Abiertos: 3

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Técnico. La falta de conocimiento de las bases de las convocatorias expedidas CAUSARÍA una disminución en el número de proyectos presentados a la SENESCYT	05/10/2015	Laura Cristina Cordero Paez	40 %	60	24	0/1

Riesgos cerrados: 5, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Carchi > Toda la Provincia del Carchi
2	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas
3	Zona 1 - Norte > Imbabura > Toda la Provincia de Imbabura
4	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios
5	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Toda la Provincia de Napo
6	Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Toda la Provincia de Orellana
7	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha
8	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo
9	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Toda la Provincia de Cotopaxi
10	Zona 3 - Centro > Pastaza > Toda la Provincia de Pastaza
11	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Toda la Provincia de Tungurahua
12	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí
13	Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Toda la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas
14	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Toda la Provincia de Bolívar
15	Zona 5 - Litoral > Galápagos > Toda la Provincia de Galapagos
16	Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas
17	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Toda la Provincia de Los Ríos
18	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Toda la Provincia de Santa Elena
19	Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay
20	Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar
21	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago
22	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro
23	Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja
24	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipec > Toda la Provincia de Zamora Chinchipe

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Análisis científico, técnico y financiero realizado para financiar proyectos	4-Inicio de Trabajo	30/06/2010		30/06/2010		Sí	10.0
2	PLANEACIÓN: Proyecto I+D +i enviado a la SENPLADES para obtener el dictamen de prioridad	5-Entregables Intermedios	01/10/2010		01/10/2010		Sí	10.0
3	EJECUCIÓN: Formatos aprobados por la Comisión I +D para la presentación de Programas y/o proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico	9-Entregables Formales	24/02/2012		24/02/2012		Sí	1.03
4	EJECUCIÓN: Programas y/o proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico analizados, aprobados y/o negados por la Comisión I+D para la selección y adjudicación, de ser el caso.	5-Entregables Intermedios	01/03/2012		01/03/2012		Sí	1.2
5	EJECUCIÓN: Trámite de desembolso finalizado para financiamiento de Programas y/o proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico presentados por Institutos	3-Adjudicación	24/04/2012		24/04/2012		Sí	1.2
6	EJECUCIÓN: Programas y/o proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico analizados, aprobados y/o negados por la Comisión I+D para la selección y adjudicación, de ser el caso.	5-Entregables Intermedios	26/04/2012		26/04/2012		Sí	1.2
7	EJECUCIÓN: Trámite de desembolso finalizado para financiamiento de Programas y/o proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico presentados por Institutos	3-Adjudicación	08/05/2012		08/05/2012		Sí	1.2
8	EJECUCIÓN: Instituciones notificadas sobre la resolución tomada por el Comité de I+D en cuando a los programas y/o proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico presentados	5-Entregables Intermedios	11/05/2012		11/05/2012		Sí	1.2
9	EJECUCIÓN: Trámite de desembolso finalizado para financiamiento de Programas y/o proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico presentados por Institutos	9-Entregables Formales	22/06/2012		22/06/2012		Sí	1.2
10	EJECUCIÓN: Hoja de ruta definida para la reforma institucional del INP	4-Inicio de Trabajo	05/07/2012		05/07/2012		Sí	1.03
11	EJECUCIÓN: Programas y/o proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico analizados,	5-Entregables Intermedios	10/07/2012		10/07/2012		Sí	1.2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	aprobados y/o negados por la Comisión I+D para la selección y adjudicación, de ser el caso.							
12	EJECUCIÓN: Equipo de trabajo conformado y hoja de ruta definida para la reforma institucional del INIAP	5-Entregables Intermedios	19/07/2012		19/07/2012		Sí	1.03
13	EJECUCIÓN: Trámite de desembolso finalizado para financiamiento de Programas y/o proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico presentados por Institutos	3-Adjudicación	19/07/2012		19/07/2012		Sí	1.2
14	EJECUCIÓN: Equipo de trabajo conformado y hoja de ruta definida para la reforma institucional del INPC	5-Entregables Intermedios	03/08/2012		03/08/2012		Sí	0.25
15	EJECUCIÓN: Equipo de trabajo conformado y hoja de ruta definida para la reforma institucional del INIGER	5-Entregables Intermedios	07/08/2012		07/08/2012		Sí	0.25
16	EJECUCIÓN: Equipo de trabajo conformado y hoja de ruta definida Para la reforma institucional de los Institutos de la Defensa	5-Entregables Intermedios	27/08/2012		27/08/2012		Sí	1.03
17	EJECUCIÓN: Trámite de expedición del Decreto de Rectoría de la SENESCYT sobre los institutos públicos de investigación finalizado.	9-Entregables Formales	30/08/2012		30/08/2012		Sí	0.25
18	EJECUCIÓN: Trámite de reforma del INHMT LIP mediante la escisión en el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigaciones - INSPI y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria -ARCSA finalizado.	5-Entregables Intermedios	30/08/2012		30/08/2012		Sí	0.25
19	EJECUCIÓN: Llamamiento realizado para que los Institutos presenten proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico.	4-Inicio de Trabajo	19/09/2012		19/09/2012		Sí	0.25
20	EJECUCIÓN: Una propuesta de Decreto Ejecutivo de un Instituto Público de Investigación acordado interinstitucionalmente	9-Entregables Formales	25/10/2012		25/10/2012		Sí	0.25
21	EJECUCIÓN: Homologación de Directorios de cuatro Institutos Públicos de Investigación realizado conforme Decreto Ejecutivo 1285	5-Entregables Intermedios	23/11/2012		21/11/2012		Sí	0.25
22	EJECUCIÓN: Informe de pertinencia realizado en base a los de programas y/o proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico	5-Entregables Intermedios	30/11/2012		30/11/2012		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	presentados por los Institutos de Investigación Científica							
23	EJECUCIÓN: Tres Institutos Públicos de Investigación reformados	9-Entregables Formales	25/12/2012		21/12/2012		Sí	0.5
24	EJECUCIÓN: Reunión realizada con IPIs para la estructuración final de los presupuestos de proyectos fase 1	5-Entregables Intermedios	22/01/2013		17/01/2013		Sí	0.35
25	EJECUCIÓN: Programas y/o proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico analizados, aprobados y/o negados por la Comisión I+D para la selección y adjudicación, de ser el caso.	5-Entregables Intermedios	30/01/2013		22/01/2013		Sí	0.5
26	EJECUCIÓN: Reunión de la Comisión Ejecutiva de proyectos I+D+I realizada	5-Entregables Intermedios	31/01/2013		31/01/2013		Sí	0.25
27	EJECUCIÓN: Notificación de resultados a instituciones postulantes realizada	5-Entregables Intermedios	04/02/2013		04/02/2013		Sí	0.5
28	EJECUCIÓN: Reunión de la Comisión Ejecutiva de proyectos I+D+I realizada	5-Entregables Intermedios	28/02/2013		22/02/2013		Sí	0.35
29	EJECUCIÓN: Convenios específicos firmados para el financiamiento de proyectos fase 1	9-Entregables Formales	04/03/2013		01/03/2013		Sí	0.35
30	EJECUCIÓN: Notificación de resultados a instituciones postulantes realizada	5-Entregables Intermedios	04/03/2013		28/02/2013		Sí	0.5
31	EJECUCIÓN: Reunión interinstitucional para revisión y/o validación de matriz de competencias y modelo de gestión	9-Entregables Formales	05/03/2013		01/03/2013		Sí	0.35
32	EJECUCIÓN: Transferencia de fondos realizada a proyectos aprobados	3-Adjudicación	28/03/2013		18/03/2013		Sí	0.25
33	EJECUCIÓN: Un instituto público de investigación reformado	9-Entregables Formales	28/03/2013		26/03/2013		Sí	0.25
34	EJECUCIÓN: Reunión realizada con IPIs para la estructuración final de los presupuestos de proyectos fase 2	5-Entregables Intermedios	01/04/2013		01/04/2013		Sí	0.25
35	EJECUCIÓN: Reunión de la Comisión Ejecutiva de proyectos I+D+I realizada	5-Entregables Intermedios	08/04/2013		08/04/2013		Sí	0.25
36	EJECUCIÓN: Notificación de resultados a instituciones postulantes realizada	5-Entregables Intermedios	10/04/2013		09/04/2013		Sí	0.25
37	EJECUCIÓN: Convenios específicos firmados para el financiamiento de proyectos fase 2	9-Entregables Formales	02/05/2013		02/05/2013		Sí	0.25
38	EJECUCIÓN: Reunión interinstitucional para revisión	5-Entregables Intermedios	10/05/2013		08/05/2013		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	y/o validación de matriz de competencias y modelo de gestión							
39	EJECUCIÓN: Transferencia de fondos realizada a proyectos aprobados	3-Adjudicación	17/05/2013		17/05/2013		Sí	0.25
40	EJECUCIÓN: Bases para nuevo llamamiento elaboradas	4-Inicio de Trabajo	12/07/2013		12/07/2013		Sí	0.35
41	EJECUCIÓN: Reunión de la Comisión Ejecutiva de proyectos I+D+I realizada	5-Entregables Intermedios	31/07/2013		31/07/2013		Sí	1.25
42	EJECUCIÓN: Llamamiento para la presentación de nuevos proyectos realizada	4-Inicio de Trabajo	15/08/2013		15/08/2013		Sí	0.72
43	EJECUCIÓN: Taller para socialización de la metodología de presentación de proyectos realizada en la ciudad 1	5-Entregables Intermedios	26/08/2013		26/08/2013		Sí	0.5
44	EJECUCIÓN: Taller para socialización de la metodología de presentación de proyectos realizada en la ciudad 2	5-Entregables Intermedios	06/09/2013		06/09/2013		Sí	0.5
45	EJECUCIÓN: Socialización de la propuesta de Fusión de IPIS acordada interinstitucionalmente, realizada.	5-Entregables Intermedios	13/09/2013		13/09/2013		Sí	0.75
46	EJECUCIÓN: Propuestas de proyectos y programas de investigación, presentados por los IPIs, receptadas	5-Entregables Intermedios	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.5
47	EJECUCIÓN: Revisión inicial de pertinencia realizada	5-Entregables Intermedios	29/11/2013		29/11/2013		Sí	0.5
48	EJECUCIÓN: Propuesta de Decreto Ejecutivo de Fusión de IPIS acordada interinstitucionalmente, elaborada.	9-Entregables Formales	20/12/2013		20/12/2013		Sí	0.25
49	EJECUCIÓN: Revisión final de pertinencia realizada	5-Entregables Intermedios	23/12/2013		14/01/2014		Sí	0.75
50	EJECUCIÓN: Informe para la Comisión Ejecutiva de proyectos I+D+I preparado	9-Entregables Formales	31/12/2013		25/02/2014		Sí	0.5
51	EJECUCIÓN: Aprobación de proyectos por parte de la Comisión Ejecutiva de proyectos I+D+I realizada	5-Entregables Intermedios	15/02/2014		15/02/2014		Sí	0.5
52	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos a proyectos de arrastre realizada	3-Adjudicación	28/02/2014		28/02/2014		Sí	0.5
53	EJECUCIÓN: Notificación de resultados sobre proyectos postulados por instituciones realizada	5-Entregables Intermedios	15/03/2014		15/03/2014		Sí	0.5
54	EJECUCIÓN: Bases de Convocatoria Abierta 2014 aprobada	4-Inicio de Trabajo	30/03/2014		30/05/2014		Sí	0.5
55	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos a Redes Internacionales realizada	3-Adjudicación	30/03/2014		30/04/2014		Sí	0.15

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
56	EJECUCIÓN: Convenios específicos para el financiamiento de proyectos firmados	3-Adjudicación	30/04/2014		30/05/2014		Sí	0.5
57	EJECUCIÓN: Lanzamiento de Convocatoria Abierta realizada	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/05/2014		Sí	0.5
58	EJECUCIÓN: Consultoría contratada (Investigación especializada en la cuenca del Rio Napo)	3-Adjudicación	30/05/2014		30/10/2014		Sí	0.5
59	EJECUCIÓN: Ferias zonales de galardones y preselección de proyectos realizada.	5-Entregables Intermedios	30/05/2014		30/09/2014		Sí	0.27
60	EJECUCIÓN: Lanzamiento de convocatoria cerrada de proyectos de I+D por los IPIs realizada	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.99
61	EJECUCIÓN: Adjudicación de Galardones realizada	3-Adjudicación	30/07/2014		30/11/2014		Sí	0.99
62	EJECUCIÓN: Propuestas de programas y proyectos de investigación en Convocatoria Abierta Receptados	4-Inicio de Trabajo	10/08/2014		10/08/2014		Sí	0.99
63	EJECUCIÓN: Informe de Pertinencia de convocatoria abierta realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	0.5
64	EJECUCIÓN: Propuestas de proyectos y programas de investigación, presentados por los IPIs, receptadas (Convocatoria Cerrada)	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	0.5
65	EJECUCIÓN: Aprobación de proyectos presentados en Convocatoria Abierta por parte de la Comisión ejecutiva de I +D realizado	9-Entregables Formales	30/11/2014		30/12/2014		Sí	0.5
66	EJECUCIÓN: Notificación de resultados Convocatoria Abierta 2014 realizado	9-Entregables Formales	30/11/2014		30/12/2014		Sí	0.5
67	EJECUCIÓN: Informes de pertinencia convocatoria cerrada realizado	9-Entregables Formales	23/12/2014		23/12/2014		Sí	0.5
68	EJECUCIÓN: Informe para la Comisión Ejecutiva de proyectos I+D+I preparado (Convocatoria Cerrada)	9-Entregables Formales	30/12/2014		30/12/2014		Sí	1.25
69	EJECUCIÓN: Socialización POA 2015 de la Subsecretaría de Investigación Científica.	5-Entregables Intermedios	30/01/2015		30/01/2015		Sí	0.25
70	EJECUCIÓN: Trámites para transferencia de recursos del año 2015 para proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en ejecución	5-Entregables Intermedios	30/01/2015		30/01/2015		Sí	0.25
71	EJECUCIÓN: Sesión de la Comisión Ejecutiva de proyectos I+D+I realizada	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.5
72	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos a proyectos de arrastre realizada	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
73	EJECUCIÓN: Bases de Convocatoria aprobada	5-Entregables Intermedios	30/03/2015		30/03/2015		Sí	0.5
74	EJECUCIÓN: Notificación de resultados sobre proyectos adjudicados	5-Entregables Intermedios	30/03/2015		30/03/2015		Sí	0.5
75	EJECUCIÓN: Lanzamiento de Convocatoria realizada	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.5
76	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos a Redes Internacionales realizada	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.5
77	EJECUCIÓN: Consultoría contratada	5-Entregables Intermedios	30/05/2015	30/10/2015			No	0.22
78	EJECUCIÓN: Convenios específicos para el financiamiento de proyectos firmados	5-Entregables Intermedios	30/05/2015		30/05/2015		Sí	0.2
79	EJECUCIÓN: Bases de Convocatoria 2015 aprobada	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.45
80	EJECUCIÓN: Ferias zonales de galardones y preselección de proyectos realizada	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/08/2015		Sí	0.1
81	EJECUCIÓN: Contratación Consultoría realizada	5-Entregables Intermedios	30/07/2015	30/10/2015			No	0.5
82	EJECUCIÓN: Lanzamiento de Convocatoria realizada	5-Entregables Intermedios	30/07/2015		30/07/2015		Sí	0.25
83	EJECUCIÓN: Feria Nacional Galardones 2015 realizada	5-Entregables Intermedios	30/08/2015		30/08/2015		Sí	0.25
84	EJECUCIÓN: Propuestas de programas y proyectos de investigación en Convocatoria receptados	5-Entregables Intermedios	30/08/2015		30/08/2015		Sí	0.2
85	EJECUCIÓN: Adjudicación de Galardones realizada	5-Entregables Intermedios	30/09/2015	30/10/2015			No	0.5
86	EJECUCIÓN: Propuestas de programas y proyectos de investigación de la Convocatoria que han superado los criterios de evaluación técnica por pares realizada	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	0.5
87	EJECUCIÓN: Artículos ganadores de Galardones cuarto nivel realizada	5-Entregables Intermedios	30/10/2015	30/10/2015			No	0.5
88	EJECUCIÓN: Informes de pertinencia convocatoria realizado	5-Entregables Intermedios	30/10/2015	30/10/2015			No	0.5
89	EJECUCIÓN: Aprobación de proyectos presentados en Convocatoria por parte de la Comisión Ejecutiva de I+D realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2015	30/11/2015			No	0.5
90	EJECUCIÓN: Notificación de resultados Convocatoria 2015 realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2015	30/11/2015			No	0.75
91	EJECUCIÓN: Informe para la Comisión Ejecutiva de proyectos I+D+I preparado	5-Entregables Intermedios	30/12/2015	30/12/2015			No	0.5
92	EJECUCIÓN: Informes de pertinencia convocatoria realizado	5-Entregables Intermedios	30/12/2015	30/12/2015			No	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
93	EJECUCIÓN: Avance físico 2016	5-Entregables Intermedios	31/12/2016	31/12/2016			No	6.0
94	EJECUCIÓN: Avance físico 2017	5-Entregables Intermedios	31/12/2017	31/12/2017			No	7.0
95	EJECUCIÓN: Avance físico 2018	5-Entregables Intermedios	30/12/2018	30/12/2018			No	8.0
96	CIERRE: Informe de Cierre	9-Entregables Formales	31/12/2018	31/12/2018			No	10.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Supervisión al proyecto sin tener mayor información debido a que es un proyecto que esta Manejado directamente desde Planta Cental del SENESCYT en Qui	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	27/07/2015
2	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	28/04/2015
3	Supervisión del Proyecto	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	18/03/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de convocatorias para la presentación de programas y proyectos de I+D a los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación		100.00 %	4	4	01/01/2014	Ene-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	868,584.52
Estimado Al Fin Del Proyecto:	64,274,070.58 **
Costo Total:	365,461,420.80
Total Devengado:	51,699,928.35
% Costo Total Devengado:	14.15 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 14.15 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	54,060,752.08	34,432,988.62	0.00	88,493,740.70
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	110,819,741.30	38,188,933.00	0.00	149,008,674.30
Ppto. Codificado	41,174,498.07	13,426,294.24	0.00	54,600,792.31
Ppto. Comprometido	35,343,228.72	7,292,725.09	0.00	42,635,953.81
Planeado - Codificado (2015)		21,006,694.38		
Programado a Devengar	49,305,258.94	18,194,097.35	0.00	67,499,356.29
Ppto. Devengado	46,079,973.23	5,619,955.12	0.00	51,699,928.35
Estimado a fin de año	* 46,079,973.23	34,457,988.81	0.00	80,537,962.04
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	3,225,285.71	-16,263,891.46	0.00	-13,038,605.75
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 93.46 %	30.89 %	0.00 %	76.59 %
Ppto. Codificado 998	987,057.78	889,552.93	0.00	1,876,610.71
Ppto. Devengado 998	987,057.78	336,608.63	0.00	1,323,666.41

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015

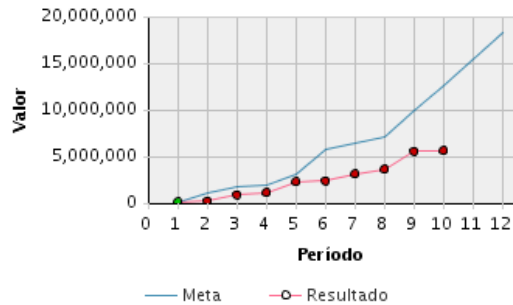

Presupuesto Mensual 2015

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	92,806.96	92,806.96	92,806.96	92,806.96	100.00 %	●	0.51 %

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	942,995.52	103,135.52	1,035,802.48	195,942.48	18.92 %		1.08 %
Mar	710,443.57	719,905.48	1,746,246.05	915,847.96	52.45 %		5.03 %
Abr	131,233.19	199,902.97	1,877,479.24	1,115,750.93	59.43 %		6.13 %
May	1,137,785.20	1,136,110.20	3,015,264.44	2,251,861.13	74.68 %		12.38 %
Jun	2,694,121.94	130,094.96	5,709,386.38	2,381,956.09	41.72 %		13.09 %
Jul	662,199.90	723,739.72	6,371,586.28	3,105,695.81	48.74 %		17.07 %
Ago	734,567.83	544,941.30	7,106,154.11	3,650,637.11	51.37 %		20.06 %
Sep	2,771,985.81	1,884,911.47	9,878,139.92	5,535,548.58	56.04 %		30.42 %
Oct	2,771,985.81	84,406.54	12,650,125.73	5,619,955.12	44.43 %		30.89 %
Nov	2,771,985.81		15,422,111.54				
Dic	2,771,985.81		18,194,097.35				
Total	18,194,097.35	5,619,955.12					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
3	Incrementar las capacidades científicas y técnicas de los actores del Sistema Nacional de Ciencia , Tecnología e Innovación MEDIANTE el financiamiento de programas y proyectos de I+D+i

IMPACTO A SERVICIOS

Servicios	
SENESCYT-005	Financiamiento y Reconocimiento de Proyectos y/o Programas de Investigación Científica y Acreditación de Investigadores
SENESCYT-006	Provisión de Información Científica

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1. Proyecto I+D+i aprobado por SENPLADES	A1.pdf	22/11/2013
2	A2. Dictamen de Prioridad del Proyecto de I+D+i	A2.PDF	22/11/2013
3	A3. ASOCIACIÓN HITO 20: Una propuesta de Decreto Ejecutivo de un Instituto Público de Investigación acordado interinstitucionalmente	A3.PDF	22/11/2013
4	A4.ASOCIACIÓN Hito Nro. 21: Homologación de Directorios de cuatro Institutos Públicos de Investigación realizado conforme Decreto Ejecutivo 1285	A4.PDF	22/11/2013
5	A5.ASOCIACIÓN Hito Nro. 22: Informe de pertinencia realizado en base a los de programas y/o proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico presentados por los Institutos de Investigación Científica	A5.PDF	22/11/2013
6	A6.ASOCIACIÓN Hito Nro. 23: Tres Institutos Públicos de Investigación reformados	A6.PDF	22/11/2013
7	A7.ASOCIACIÓN Hito Nro. 24: Reunión realizada con IPIs para la estructuración final de los presupuestos de proyectos fase 1	A7.PDF	22/11/2013
8	A8.ASOCIACIÓN Hito Nro. 25: Programas y/ o proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico analizados, aprobados y/o negados por la Comisión I+D para la selección y adjudicación, de ser el caso.	A8.PDF	22/11/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
9	A9.ASOCIACIÓN Hito Nro. 26: Reunión de la Comisión Ejecutiva de proyectos I+D+I realizada	A9.PDF	22/11/2013
10	ASOCIACIÓN HITO Nro. 76.- Transferencia de recursos a redes internacionales realizada	I10.pdf	30/04/2015
11	ASOCIACIÓN HITO Nro. 76.- Transferencia de recursos a redes internacionales realizada	I10.pdf	30/04/2015
12	ASOCIACIÓN HITO Nro. 76.- Transferencia de recursos a redes internacionales realizada	I10.pdf	30/04/2015
13	ASOCIACIÓN HITO Nro. 76.- Transferencia de recursos a redes internacionales realizada	I10.pdf	30/04/2015
14	ASOCIACIÓN HITO Nro. 83. Feria Nacional Galardones 2015 realizada.	J8.pdf	03/09/2015
15	ASOCIACIÓN HITO Nro. 83. Feria Nacional Galardones 2015 realizada.	J8.pdf	03/09/2015
16	ASOCIACIÓN HITO Nro. 83. Feria Nacional Galardones 2015 realizada.	J8.pdf	04/09/2015
17	ASOCIACIÓN HITO Nro. 83. Feria Nacional Galardones 2015 realizada.	J8.pdf	04/09/2015
18	ASOCIACIÓN HITO Nro. 83. Feria Nacional Galardones 2015 realizada.	J8.pdf	03/09/2015
19	ASOCIACIÓN HITO Nro. 84 Propuestas de programas y proyectos de investigación en Convocatoria receptados.	J9.pdf	03/09/2015
20	ASOCIACIÓN HITO Nro. 84 Propuestas de programas y proyectos de investigación en Convocatoria receptados.	J9.pdf	03/09/2015
21	Asociación Hito Nro. 86 Propuestas de programas y proyectos de investigación de la Convocatoria que han superado los criterios de evaluación técnica por pares realizada	K1.pdf	30/09/2015
22	B1.ASOCIACIÓN Hito Nro. 27: Notificación de resultados a instituciones postulantes realizada	B1.PDF	22/11/2013
23	B2.ASOCIACIÓN Hito Nro. 28: Reunión de la Comisión Ejecutiva de proyectos I+D+I realizada	B2.PDF	22/11/2013
24	B3.ASOCIACIÓN Hito Nro. 29: Convenios específicos firmados para el financiamiento de proyectos fase 1	B3.PDF	22/11/2013
25	B4.ASOCIACIÓN Hito Nro. 30: Notificación de resultados a instituciones postulantes realizada	B4.PDF	22/11/2013
26	B5.ASOCIACIÓN Hito Nro. 31: Reunion interinstitucional para revisión y /o validación de matriz de competencias y modelo de gestión	B5.PDF	22/11/2013
27	B6.ASOCIACIÓN Hito Nro. 32: Transferencia de fondos realizada a proyectos aprobados	B6.PDF	22/11/2013
28	B7.ASOCIACIÓN Hito Nro. 33: Un instituto público de investigación reformado	B7.PDF	22/11/2013
29	B8.ASOCIACIÓN Hito Nro. 34: Reunión realizada con IPs para la estructuración final de los presupuestos de proyectos fase 2	B8.PDF	22/11/2013
30	B9.ASOCIACIÓN Hito Nro. 35: Reunión de la Comisión Ejecutiva de proyectos I+D+I realizada	B9.PDF	22/11/2013
31	C1.ASOCIACIÓN Hito Nro. 36: Notificación de resultados a instituciones postulantes realizada	C1.PDF	22/11/2013
32	C2.ASOCIACIÓN Hito Nro. 37: Convenios específicos firmados para el financiamiento de proyectos fase 2	C2.PDF	22/11/2013
33	C3.ASOCIACIÓN Hito Nro. 38: Reunion interinstitucional para revisión y /o validación de matriz de competencias y modelo de gestión	C3.PDF	22/11/2013
34	C4.ASOCIACIÓN Hito Nro. 39: Transferencia de fondos realizada a proyectos aprobados	C4.PDF	22/11/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
35	C5.ASOCIACIÓN Hito Nro. 40: Bases para nuevo llamamiento elaboradas	C5.PDF	22/11/2013
36	C6.ASOCIACIÓN Hito Nro. 41: Reunión de la Comisión Ejecutiva de proyectos I+D+I realizada	C6.PDF	22/11/2013
37	C7.ASOCIACIÓN Hito Nro. 42: Llamamiento para la presentación de nuevos proyectos realizada	C7.PDF	22/11/2013
38	C8.ASOCIACIÓN Hito Nro. 43: Taller para socialización de la metodología de presentación de proyectos realizada en la ciudad 1	C8.PDF	22/11/2013
39	C9.ASOCIACIÓN Hito Nro. 44: Taller para socialización de la metodología de presentación de proyectos realizada en la ciudad 2	C9.PDF	22/11/2013
40	D1.ASOCIACIÓN Hito Nro. 45: Socialización de la propuesta de Fusión de IPIS acordada interinstitucionalmente, realizada.	D1.PDF	22/11/2013
41	D2.ASOCIACIÓN Hito Nro. 46: Propuestas de proyectos y programas de investigación, presentados por los IPIs, receptadas	D2.PDF	22/11/2013
42	D3.ASOCIACIÓN Hito Nro.47 Revisión inicial de pertinencia realizada	D3.pdf	29/11/2013
43	D4.ASOCIACIÓN Hito Nro. 48: Propuesta de Decreto Ejecutivo de Fusión de IPIS acordada interinstitucionalmente, elaborada.	D4.PDF	26/12/2013
44	D5.ASOCIACIÓN Hitos Nro. 49 y 50: Justificación de retraso	D5.PDF	26/12/2013
45	D6.ASOCIACIÓN Hito Nro. 49: Revisión final de pertinencia realizada	D6.PDF	05/02/2014
46	D7.ASOCIACIÓN HITO 50: Informe para la Comisión Ejecutiva de proyectos I+D+I preparado	D7.pdf	28/02/2014
47	D8.ASOCIACIÓN HITO 51: Aprobación de proyectos por parte de la Comisión Ejecutiva de proyectos I+D+I realizada	D8.PDF	28/02/2014
48	D9.ASOCIACIÓN HITO 52: Aprobación de proyectos por parte de la Comisión Ejecutiva de proyectos I+D+I realizada	D9.PDF	28/02/2014
49	E1.ASOCIACIÓN HITO 53: Notificación de resultados sobre proyectos postulados por instituciones realizada	E1.PDF	15/03/2014
50	E2. Reporte e-SIGEF febrero 2014	E2.pdf	25/03/2014
51	E3.ASOCIACIÓN Hito Nro. 54: "Bases convocatoria abierta 2014 aprobada" - Justificación de retraso	E3.PDF	01/04/2014
52	E4.ASOCIACIÓN Hito Nro. 55: " Transferencia de recursos a Redes Internacionales realizada" - Justificación de retraso	E4.PDF	01/04/2014
53	E5. Reporte e-SIGEF marzo 2014	E5.pdf	07/04/2014
54	E6.ASOCIACIÓN Hito Nro. 54: "Bases convocatoria abierta 2014 aprobada" - Justificación de retraso	E6.PDF	02/05/2014
55	E7.ASOCIACIÓN Hito Nro. 55: " Transferencia de recursos a Redes Internacionales realizada"	E7.PDF	02/05/2014
56	E8.ASOCIACIÓN Hito Nro. 56: "Convenios específicos para el financiamiento de proyecto firmados" - justificación de retraso	E8.PDF	02/05/2014
57	E9.ASOCIACIÓN Hito 57: Lanzamiento de Convocatoria Abierta realizada - justificación de retraso	E9.PDF	02/05/2014
58	F1. Reporte e-SIGEF abril 2014	F1.pdf	14/05/2014
59	F2. ASOCIACIÓN Hito Nro. 54: "Bases convocatoria abierta 2014 aprobada"	F2.PDF	02/06/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
60	F3. ASOCIACIÓN Hito Nro. 56: "Convenios específicos para el financiamiento de proyecto firmados"	F3.pdf	03/06/2014
61	F4. ASOCIACIÓN Hito 57: Lanzamiento de Convocatoria Abierta realizada	F4.PDF	30/05/2014
62	F5. ASOCIACIÓN HITO Nro. 58: "Consultoría contratada (Investigación especializada en la cuenca del Río Napo)" - justificación de retraso	F5.PDF	03/06/2014
63	F6. ASOCIACIÓN HITO Nro. 59: "Ferias zonales de galardones y preselección de proyectos realizada" - justificación de retraso	F6.PDF	30/05/2014
64	F7. Reporte e-sigef mes de mayo 2014	F7.pdf	05/06/2014
65	F8. ASOCIACIÓN Hito Nro. 60: Lanzamiento de convocatoria cerrada de proyectos de I+D por los IPIs realizada	F8.pdf	01/07/2014
66	F9. ASOCIACIÓN HITO Nro. 61: "Adjudicación de Galardones realizada" - justificación de retraso	F9.pdf	30/07/2014
67	G.1. ASOCIACIÓN HITO Nro. 62: "Propuestas de programas y proyectos de investigación en convocatoria abierta receptados"	G1.pdf	05/09/2014
68	G.2. Reporte e-sigef mes de Julio 2014	G.2.pdf	31/07/2014
69	G.3. Reporte e-sigef mes de Agosto 2014	G.3.pdf	02/09/2014
70	G.4. Reporte e-sigef mes de junio 2014	G.4.pdf	05/09/2014
71	G5. ASOCIACIÓN Hito Nro. 59: "Ferias zonales de Galardones y preselección de proyectos realizado"	G.5.pdf	01/10/2014
72	G6. Reporte e-sigef mes de septiembre 2014	G6..pdf	02/10/2014
73	G7. ASOCIACIÓN Hito Nro. 63: "Informe de pertinencia de convocatoria abierta realizado"	G.7.pdf	03/10/2014
74	G8. Reporte e-sigef mes de octubre 2014	G8..pdf	04/11/2014
75	G9. ASOCIACIÓN HITO Nro. 58: "Consultoría Contratada (Investigación Especializada en la Cuenca del Río Napo)"	G9.pdf	05/11/2014
76	H1. ASOCIACIÓN HITO Nro. 64: "Propuestas de proyectos y programas de investigación, presentados por los IPIS, receptadas (Convocatoria Cerrada)"	H1.pdf	05/11/2014
77	H2 Reporte e-sigef mes de Noviembre 2014	H.2.pdf	01/12/2014
78	H3. ASOCIACIÓN HITO Nro. 61: "Adjudicación de Galardones Realizada"	H3.pdf	03/12/2014
79	H4. ASOCIACIÓN HITO Nro. 67: "Informes de pertinencia convocatoria cerrada realizado"	H4.pdf	29/12/2014
80	H5. ASOCIACIÓN HITO Nro. 68: "Informes para la comisión ejecutiva de proyectos I+D+I preparado (convocatoria cerrada)"	H5.pdf	31/12/2014
81	H6. Reporte e-sigef mes de Diciembre 2014	H6..pdf	05/01/2015
82	H7. ASOCIACIÓN HITO Nro. 66: "Notificación de resultados convocatoria abierta 2014 realizado"	H7.pdf	05/01/2015
83	H8. ASOCIACIÓN HITO Nro. 65: "Aprobación de proyectos presentados en convocatoria abierta por parte de la Comisión Ejecutiva de I+D realizado"	H8.pdf	06/01/2015
84	H9. Reporte e-SIGEF enero 2015	H9..pdf	05/02/2015
85	I1. ASOCIACIÓN HITO Nro. 69: Socialización POA 2015 de la Subsecretaría de Investigación Científica realizada	I.1.pdf	10/02/2015
86	I2. ASOCIACIÓN HITO Nro. 70: "Trámites para transferencia de recursos del año 2015 para proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en ejecución"	I2.pdf	09/02/2015
87	I3. Reporte e-SIGEF Febrero 2015	I3.pdf	28/02/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
88	I4. ASOCIACIÓN HITO Nro. 72: "Transferencia de recursos a proyectos de arrastre realizada"	I4.pdf	04/03/2015
89	I5. ASOCIACIÓN HITO Nro. 71: "Sesión de la comisión ejecutiva de proyectos i+d+i realizada"	I5.pdf	04/03/2015
90	I6. Reporte e-SIGEF Marzo 2015	I6.pdf	07/04/2015
91	I7. ASOCIACIÓN HITO Nro. 73.- Bases de Convocatoria aprobada	I7.pdf	02/04/2015
92	I8. ASOCIACIÓN HITO Nro. 74.- Notificación de resultados sobre proyectos adjudicados	I8.pdf	02/04/2015
93	I9. Reporte e-SIGEF Abril 2015	I9.pdf	30/04/2015
94	J1. ASOCIACIÓN HITO Nro. 75.- Lanzamiento de Convocatoria realizada	J1.pdf	30/04/2015
95	J2. ASOCIACIÓN HITO Nro. 76.- Transferencia de recursos a Redes Internacionales realizada	J2.pdf	30/04/2015
96	J3. ASOCIACIÓN HITO Nro. 78: "Convenios específicos para el financiamiento de proyectos firmados"	J3.pdf	31/05/2015
97	J4. Reporte e-SIGEF Mayo 2015	J4.pdf	04/06/2015
98	J5. ASOCIACIÓN HITO Nro. 79 Bases de Convocatoria 2015 aprobada	J5.pdf	03/07/2015
99	J6. ASOCIACIÓN HITO Nro. 82, Informe de Lanzamiento de Convocatoria realiza	J6.pdf	03/08/2015
100	J7. Reporte e-SIGEF Julio 2015	J7.pdf	04/08/2015
101	J8. ASOCIACIÓN HITO Nro. 83, Feria Nacional Galardones 2015 realizada	J8.pdf	04/09/2015
102	J9. Asociación al Hito 84, Propuestas de programas y proyectos de investigación en Convocatoria receptados	J9.pdf	04/09/2015
103	K1. Asociación al Hito 86. Propuestas de programas y proyectos de investigación de la Convocatoria que han superado los criterios de evaluación técnica por pares realizada	K1.pdf	01/10/2015

LIGAS EXTERNAS

Dirección (URL)	
1	Proyectos de Investigación
	http://www.educacionsuperior.gob.ec/investigacion-cientifica-2/

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico
Araque Intriago, Eloiza Gabriela	Asistente del Proyecto	Asistente de la Dirección de Orientación, Diseño y Coordinación de la Investigación Científica	earaque@senescyt.gob.ec
Astudillo Estévez, Iván Estuardo	Analista del Proyecto	Analista de Investigación Científica	iastudillo@senescyt.gob.ec
Carrillo Guarderas, Pablo Sebastián	Analista del Proyecto	Coordinador de Investigación Científica	pcarrillo@senescyt.gob.ec
Cordero Paez, Laura Cristina	Lider del Proyecto	Directora de Orientación, Diseño y Coordinación de la Investigación Científica (E)	lccordero@senescyt.gob.ec
Martínez Herrera, Andrés Fernando	Analista del Proyecto	Analista de Investigación Científica	amartinez@senescyt.gob.ec

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico
Villamagua Piedra, Franco Alberto	Analista del Proyecto	Analista de Investigación Científica	fvillamagua@senescyt.gob.ec
