

**SENESCYT - Secretaría Nacional De Educación Superior, Ciencia, Tecnología E Innovación**  
**PROMETEO**

**PROYECTO: K001 SENESCYT - PROMETEO**

|                                |   |                                 |  |
|--------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Líder del Proyecto:            | Dávila Castro, Marjorie Katherine (mdavila@senescyt.gob.ec) |                                 |  |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Pazos Padilla, Rina Catalina                                | Programas Relacionados:         | PROMETEO, Provincia - Azuay, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Pastaza, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Tungurahua |
| Titular:                       | Dávila Castro, Marjorie Katherine                           | Prioridad:                      | 0  |
| Tipo de Proyecto:              | Brainware - Talento Humano                                  | Retorno Económico:              | 0.00   |
| CUP:                           | 091590000.0000.372804                                       | TIR:                            | 28.00 %  |
| Objetivos Operativos:          | 1   | VAN:                            | 26,186,273.49  |
| Viabilidad Técnica:            | Media   | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 13,620,757.62  |
| Localidad de Gestión:          | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito                            |                                 |  |
| Tipo de Ppto. Externo:         |   | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/02/2011 - 31/12/2015  |
| Fecha de última actualización: | 25/11/2015  | Fecha de Fin Base:              | 31/12/2015   |
| Modificado por:                | Dueñas de la Torre, Susana Maria                            | Fecha del siguiente Hito:       | 30/11/2015   |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

El proyecto Prometeo está dirigido a universidades, escuelas politécnicas, públicas o privadas, institutos de investigación, instituciones públicas y clústeres productivos vinculados a la investigación científica, a la innovación y al desarrollo tecnológico.

PRODUCTO: Transferencia de conocimiento

LÍNEA BASE: De acuerdo al PNBV, la educación debe ser fortalecida desde una perspectiva estratégica, en este sentido el estado cumple con un rol fundamental ya que garantiza que éstas se cumplan a través de la generación de políticas. Con estos antecedentes, se implementó el Proyecto Prometeo el cual tiene como objetivo la incorporación de investigadores/expertos de alto nivel en temas estratégicos siendo investigación, innovación, transferencia tecnológica.

OBJETIVO GENERAL: Fomentar y fortalecer la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico en áreas estratégicas del país, a través de la incorporación de científicos y expertos de alto nivel, nacionales y extranjeros

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- Vincular a investigadores/as de alto nivel nacionales y extranjeros que estén viviendo en el exterior a: proyectos de investigación financiados por Senescyt, universidades, escuelas politécnicas, institutos de investigación, instituciones públicas ecuatorianas.
- Incrementar las capacidades de investigación científica e innovación tecnológica de:
  - Universidades y escuelas politécnicas
  - Institutos de investigación
  - Instituciones públicas que realizan actividades de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales.
- Apoyar a equipos nacionales en el diseño, evaluación y desarrollo de proyectos de investigación y en su capacitación en mejores prácticas.
- Vincular expertos de alto nivel a proyectos nacionales de incidencia y que estén vinculados a líneas estratégicas de desarrollo productivo nacional y regional.

**Beneficios Cualitativos**

El proyecto contribuye a transformar el patrón de especialización nacional actual, caracterizada por ser extractivista y exportador de commodities, por uno conducente hacia la producción de bienes y servicios ricos en innovación y conocimiento, con alto valor agregado en los cuales el país obtenga ventajas comparativas.

Con este fin, el proyecto promueve el fortalecimiento de las capacidades de investigación de los IPIS, IES e Instituciones Públicas y de formación de investigadores, docentes investigadores y estudiantes a través de la incorporación de investigadores de alto nivel residentes en el exterior.

**Tipo de Beneficiario**

Universidades y escuelas politécnicas públicas, institutos de investigación, instituciones públicas en general vinculados a la investigación en general, a la innovación y al desarrollo tecnológico, y a la consecución de los objetivos constitucionales y del Plan Nacional de Buen Vivir.

Estudiantes, Docentes, Investigadores técnicos.

**Restricciones**

TIEMPO: Ejecucion del proyecto hasta el 2014

COSTO: \$41.800.000


ALCANCE: Nacional

RECURSOS: Humanos, materiales y equipos que son limitados por el presupuesto.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 98.22 %  
 Fecha de Inicio: 01/02/2011 Fecha de Fin: 31/12/2015

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

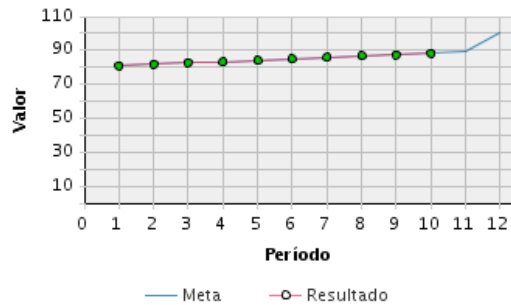

| Porcentaje de Avance |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Año                  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic   |
| 2015                 | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | 81 %                        | 82 % | 83 % | 83 % | 84 % | 85 % | 86 % | 87 % | 88 % | 88 % | 89 % | 100 % |
|                      | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | 81 %                        | 82 % | 83 % | 83 % | 84 % | 85 % | 86 % | 87 % | 88 % | 88 % |      |       |
| Estado               |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | ●                           | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |      |       |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                 | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| OCTUBRE 2015<br>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Prometeo.    | Gordillo Salinas, Mario Andrés | 10/11/2015 - 10:25 AM         |
| SEPTIEMBRE 2015<br>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Prometeo. | Gordillo Salinas, Mario Andrés | 10/11/2015 - 10:25 AM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                 | Fecha de última actualización |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| <p>AGOSTO 2015</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Prometeo.</p>   | Gordillo Salinas, Mario Andrés | 10/11/2015 - 10:24 AM         |
| <p>JULIO 2015</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Prometeo.</p>  | Gordillo Salinas, Mario Andrés | 10/09/2015 - 05:08 PM         |
| <p>JUNIO 2015</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Prometeo.</p>  | Gordillo Salinas, Mario Andrés | 05/07/2015 - 09:02 PM         |
| <p>MAYO 2015</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Prometeo.</p>   | Gordillo Salinas, Mario Andrés | 05/06/2015 - 04:13 PM         |
| <p>ABRIL 2015</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Prometeo.</p>  | Gordillo Salinas, Mario Andrés | 05/06/2015 - 04:12 PM         |
| <p>MARZO 2015</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Prometeo.</p>  | Gordillo Salinas, Mario Andrés | 05/05/2015 - 12:07 PM         |
| <p>FEBRERO 2015</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Prometeo.</p>  | Gordillo Salinas, Mario Andrés | 05/05/2015 - 12:05 PM         |
| <p>ENERO 2015</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Prometeo.</p>  | Gordillo Salinas, Mario Andrés | 05/05/2015 - 12:04 PM         |
| <p>DICIEMBRE 2014:</p> <p>1. Se adjunta informe de cierre de proyecto Prometeo Viejos Sabios (Hito relacionado 36)</p> <p>2. Se realizó el informe de pago a los prometeos que cumplieron con los requerimientos para el pago mensual (Hito relacionado 37).</p> <p>3. No se realizaron transferencias en el mes de diciembre</p> | Castillo Campos, Linda Lesly   | 06/01/2015 - 11:57 AM         |
| <p>NOVIEMBRE 2014:</p> <p>1. Se realizó el informe de pago a los prometeos que cumplieron con los requerimientos para el pago mensual (Hito relacionado 35).</p> <p>2. No se realizaron transferencias en el mes de noviembre</p>   | Castillo Campos, Linda Lesly   | 02/12/2014 - 04:13 PM         |
| <p>OCTUBRE 2014:</p> <p>1. Se realizó el informe de pago a los prometeos que cumplieron con los requerimientos para el pago mensual (Hito relacionado 34).</p> <p>2. No se realizaron transferencias en el mes de octubre</p>   | Castillo Campos, Linda Lesly   | 04/11/2014 - 04:19 PM         |
| <p>SEPTIEMBRE 2014:</p> <p>1. Se realizó el informe de pago a los prometeos que cumplieron con los requerimientos para el pago mensual (Hito relacionado 33).</p> <p>2. No se realizaron transferencias en el mes de septiembre.</p>  | Castillo Campos, Linda Lesly   | 01/10/2014 - 04:39 PM         |
| <p>AGOSTO 2014:</p> <p>1. Se realizó el informe de pago a los prometeos que cumplieron con los requerimientos para el pago mensual (Hito relacionado 32).</p> <p>2. No se realizaron transferencias en el mes de agosto.</p>  | Castillo Campos, Linda Lesly   | 03/09/2014 - 12:54 PM         |
| <p>JULIO 2014:</p> <p>1. Se realizó el informe de pago a los prometeos que cumplieron con los requerimientos para el pago mensual (Hito relacionado 31).</p> <p>2. No se realizaron transferencias en el mes de julio.</p>  | Solano, María José             | 01/08/2014 - 12:35 PM         |
| <p>JUNIO 2014:</p>  | Solano, María José             | 03/07/2014 - 12:26 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                      | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>1. Se realizó el informe de pago a los prometeos que cumplieron con los requerimientos para el pago mensual (Hito relacionado 30).</p> <p>2. No se realizaron transferencias en el mes de junio.</p>  |                                     |                               |
| <p>MAYO 2014:</p> <p>1. Se realizó el informe de pago a los prometeos que cumplieron con los requerimientos para el pago mensual (Hito relacionado 29).</p> <p>2. No se realizaron transferencias en el mes de mayo.</p>   | Solano, María José                  | 05/06/2014 - 04:13 PM         |
| <p>ABRIL 2014:</p> <p>1. Se realizó el informe de pago a los prometeos que cumplieron con los requerimientos para el pago mensual (Hito relacionado 28).</p> <p>2. No se realizaron transferencias en el mes de abril.</p>   | Solano, María José                  | 05/05/2014 - 03:45 PM         |
| <p>MARZO 2014:</p> <p>1. Se realizó el informe de pago a los prometeos que cumplieron con los requerimientos para el pago mensual (Hito relacionado 27).</p> <p>2. No se realizaron transferencias en el mes de marzo.</p>   | Solano, María José                  | 04/04/2014 - 05:25 PM         |
| <p>MARZO 2014:</p> <p>Se realizó el informe de pago a los prometeos que cumplieron con los requerimientos para el pago mensual.</p>  | Solano, María José                  | 31/03/2014 - 01:40 PM         |
| <p>FEBRERO 2014:</p> <p>Se realizó el informe de pago a los prometeos que cumplieron con los requerimientos para el pago mensual</p>   | Solano, María José                  | 05/03/2014 - 09:13 PM         |
| <p>ENERO 2014:</p> <p>Se realizó el informe de pago a los prometeos que cumplieron con los requerimientos para el pago mensual.</p>  | Solano, María José                  | 05/02/2014 - 11:29 AM         |
| <p>DICIEMBRE 2013:</p> <p>Se realizó el informe de pago a los prometeos que cumplieron con los requerimientos para el pago mensual. (HITO 24)</p>  | Paredes del Castillo, Grace Paulina | 06/01/2014 - 08:48 AM         |
| <p>NOVIEMBRE 2013:</p> <p>Se realizó el informe de pago a los prometeos que cumplieron con los requerimientos para el pago mensual. (HITO 23)</p>  | Paredes del Castillo, Grace Paulina | 05/12/2013 - 11:20 AM         |
| <p>OCTUBRE 2013: En el mes de octubre se realizaron 2 Comités Ejecutivos del Proyecto Becas Prometeo. Se procesaron 204 postulaciones manuales con los nuevos baremos del Proyecto. El día martes 22 de octubre se llevó a cabo el Taller de Zonales con el objetivo de dar a conocer los procesos de postulación, selección y vinculación de Prometeos a las diferentes instituciones de acogida dentro del marco del Proyecto Becas Prometeo. El día jueves 24 de octubre de 2013 se organizó dos talleres, uno en Quito y otro en Guayaquil, con las contrapartes de las instituciones y universidades, con el objetivo de informar a las instituciones sobre los cambios y mejoras en los procesos técnicos del Proyecto Becas Prometeo. Un total de 50 instituciones fueron capacitadas cumpliendo el objetivo de los talleres.</p> | Paredes del Castillo, Grace Paulina | 01/11/2013 - 12:58 PM         |
| <p>SEPTIEMBRE 2013: En el mes de septiembre se realizaron 2 Comités Ejecutivo del Proyecto Becas Prometeo. Se procesaron 135 postulaciones manuales con los nuevos baremos del Proyecto. El jueves 19 de septiembre se llevó a cabo el taller en el INER con el objetivo de obtener necesidades específicas conforme a los proyectos de investigación que se desarrollan actualmente. El martes 24 y miércoles 25 de septiembre se realizó el taller de presentación del Proyecto Prometeo en la Universidad Técnica de Machala a los docentes, decanos, subdecanos y vicerrectores con el fin de esclarecer dudas y levantar necesidades.</p>   | Paredes del Castillo, Grace Paulina | 02/10/2013 - 02:11 PM         |
| <p>En el mes de agosto se ratificaron las bases de postulación y los baremos del nuevo Proyecto Becas Prometeo. Se realizaron 2 Comisiones de Selección extraordinarias y el primer Comité Ejecutivo del Proyecto Becas Prometeo. Se procesaron 151 postulaciones manuales con los nuevos baremos del Proyecto. Así también durante el mes de agosto del 2013 se realizó difusión del Proyecto Prometeo entre los becarios de la Convocatoria Abierta 2013 que saldrán fuera del país para especializarse en diferentes áreas del conocimiento, con el fin de que puedan ser nuestros embajadores y principales gestores del Proyecto en el exterior y en sus universidades de acogida. Las inducciones se llevaron a cabo el 17 de agosto en Loja y Portoviejo, el 19 de agosto en Guayaquil y el 20 de agosto en Quito y Cuenca.</p>   | Paredes del Castillo, Grace Paulina | 02/09/2013 - 03:09 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                             | Fecha de última actualización |
|---|--|-------------------------------|
| <p>JULIO 2013: El 31 de julio de 2013 se realizó la Comisión de Selección del Proyecto Prometeo aprobándose la recomendación al Secretario Nacional de la vinculación de 38 investigadores en ciencias exactas, 1 cambio de categoría y 2 cambios de institución de Prometeos previamente aprobados. En el mes de julio 2013 se procesaron 270 postulaciones. El jueves 25 de Julio de 2013 se llevó a cabo el "I Taller de Políticas de investigación y modelos universitarios en el Ecuador" en la ciudad de Manta, cuyo objetivo principal fue el de generar espacios multidisciplinarios de discusión, generando recomendaciones y conclusiones sobre las acciones emprendidas por el gobierno ecuatoriano para fortalecer el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.</p>   | <p>Paredes del Castillo, Grace Paulina</p> | <p>02/08/2013 - 09:47 AM</p>  |
| <p>JUNIO 2013: El 26 de junio de 2013 se realizó la Comisión de Selección del Proyecto Prometeo aprobándose la recomendación al Secretario Nacional de la vinculación de 40 investigadores y 1 cambio de categoría de Prometeos previamente aprobados. Así también se realizó una convocatoria para una Comisión Extraordinaria para el día viernes 28. En el mes de junio 2013 se procesaron 191 postulaciones. El jueves 13 de junio se visitó la Universidad de Guayaquil para la revisión de las condiciones de la universidad al recibir a los Prometeos (físicas, logísticas, académicas), así también se realizó el levantamiento de necesidades y monitoreo del trabajo de los Prometeos. El miércoles 25 de junio se realizó una reunión en las instalaciones de FÁBRICA IMBABURA en donde se presentó el Proyecto Prometeo y se realiza levantamiento de necesidades. Del 27 al 29 de junio se difundió el Proyecto Prometeo en el 6to Encuentro de Ecuatorianistas realizado en la ciudad de Cuenca.</p>                 | <p>Paredes del Castillo, Grace Paulina</p> | <p>01/07/2013 - 05:35 PM</p>  |
| <p>MAYO 2013: El 29 de mayo de 2013 se realizó la Comisión de Selección del Proyecto Prometeo aprobándose la recomendación al Secretario Nacional de la vinculación de 48 investigadores, 2 cambios de categoría y 1 cambio de institución de Prometeos previamente aprobados. En el mes de mayo 2013 se procesó 277 postulaciones. El 01 de mayo de 2013 se realizó un levantamiento de necesidades y capacitación de los procesos de Prometeo a los funcionarios del INP a cargo de Gabriela Jaramillo, Gerente del Proyecto. El 08 y 09 de mayo se presentó en Proyecto Prometeo en la empresa pública ETAPA y se visitó el museo Pumapungo para conocer sobre sus necesidades. El 22 de mayo se realizó un taller con las autoridades de la prefectura de Manabí. El día 28 de mayo de 2013 se llevó a cabo el Taller de difusión del Proyecto Prometeo para todas las Instituciones públicas de Imbabura y el 30 de mayo de 2013 se presentó el Proyecto Prometeo a las autoridades de la Universidad Central del Ecuador.</p> | <p>Paredes del Castillo, Grace Paulina</p> | <p>03/06/2013 - 05:53 PM</p>  |
| <p>ABRIL 2013: El 26 de abril de 2013 se realizó la Comisión de Selección del Proyecto Prometeo aprobándose la recomendación al Secretario Nacional de la vinculación de 36 investigadores y 3 cambios de categoría de Prometeos previamente aprobados. El mes de abril 2013 se procesaron 150 postulaciones. El jueves 11 de abril de 2013 la Gerente del Proyecto, Gabriela Jaramillo, participó en una entrevista en vivo en el programa "El Ciudadano Radio", de Radio Universal. Por otro lado, también participó en una entrevista con Olga Velasco, de Ecuador Tv, para un reportaje en el que se recogieron puntos de vista de varios investigadores, sobre el Proyecto. El 30 de abril de 2013 la Gerente del Proyecto sostuvo un taller con las altas autoridades del Instituto Nacional de Pesca en Guayaquil y mantuvo dos reuniones oficiales de manera personal exclusivamente con el Rector de la ESPOL por un lado y con el Rector de la Universidad de Guayaquil por otro lado.</p>                                | <p>Paredes del Castillo, Grace Paulina</p> | <p>02/05/2013 - 05:30 PM</p>  |
| <p>MARZO 2013: El 27 de marzo, 2013 se realizó la Comisión de Selección del Proyecto aprobándose la vinculación de 30 investigadores. El 13 y 14 de marzo, el Proyecto participó con un stand y charlas informativas en la "Feria Internacional de Reclutamiento" celebrada en Madrid- España, con el fin de promover la iniciativa y atraer candidatos idóneos. Entre las actividades de promoción local, la Gerente del Proyecto, realizó entrevistas en medios de prensa como: El Comercio, ECTV (noticiero de la mañana), Radio Quito (Regresando con Andrés Carrión). Se receptaron y evaluaron 117 aplicaciones.</p>  | <p>Ulloa Hurtado, Gina Dolores</p>         | <p>01/04/2013 - 12:22 PM</p>  |
| <p>FEBRERO 2013: La Comisión de Selección del Proyecto Prometeo se efectuó en febrero 27, 2013 aprobándose la vinculación de 20 investigadores. Se realizó el evento de Promoción del Proyecto entre las instituciones públicas, universidades y municipalidades de Cuenca, Guayaquil, Macas (feb 19, 20, 28) y Direcciones Provinciales del MAE, a fin de establecer contactos y necesidades para futuras vinculaciones. Adicionalmente se capacitó al personal Senescyt de la Zonal Cuenca, Zonal Guayaquil y Servicio a la Ciudadanía Quito, sobre el alcance y beneficios del Proyecto. Se puso en producción el nuevo sistema de postulaciones en línea, lográndose finalizar aplicaciones que estaban incompletas por parte de los postulantes. Se recibieron 123 aplicaciones.</p>   | <p>Ulloa Hurtado, Gina Dolores</p>         | <p>28/02/2013 - 07:18 PM</p>  |
| <p>FEBRERO 2013: La Comisión de Selección del Proyecto Prometeo se efectuó en febrero 27, 2013 aprobándose la vinculación de 20 investigadores. Se realizó el evento de Promoción del Proyecto entre las instituciones públicas, universidades y municipalidades de Cuenca, Guayaquil,</p>  | <p>Ulloa Hurtado, Gina Dolores</p>         | <p>28/02/2013 - 07:05 PM</p>  |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por              | Fecha de última actualización |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Macas (feb 19, 20, 28) y Direcciones Provinciales del MAE, a fin de establecer contactos y necesidades para futuras vinculaciones. Adicionalmente se capacitó al personal Senescyt de la Zonal Cuenca, Zonal Guayaquil y Servicio a la Ciudadanía Quito, sobre el alcance y beneficios del Proyecto. Se puso en producción el nuevo sistema de postulaciones en línea, lográndose finalizar aplicaciones que estaban incompletas por parte de los postulantes. Se procesaron 80 postulaciones de un total recibido de 123 aplicaciones.  |                             |                               |
| ENERO 2013: En la Comisión de Selección del Proyecto Prometeo celebrada en enero 17, 2013 se aprobó la vinculación de 17 investigadores. Se realizó el evento de Promoción del Proyecto en el II Foro de Estudiantes Ecuatorianos en Europa y el Taller con Embajadores del Ecuador, llevados a cabo en Milán. Se realizaron varias reuniones en España, donde se presentó el Proyecto a universidades en Barcelona y Madrid a fin de lograr acuerdos para la vinculación de investigadores. Se procesaron el total de las postulaciones recibidas en enero, llegando a 60 aplicaciones. | Ulloa Hurtado, Gina Dolores | 01/02/2013 - 09:20 AM         |

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 0

## LOCALIDADES

|    | Localidad de Impacto   |
|----|--|
| 1  | Zona 1 - Norte > Carchi > Toda la Provincia del Carchi   |
| 2  | Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas  |
| 3  | Zona 1 - Norte > Imbabura > Toda la Provincia de Imbabura  |
| 4  | Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios  |
| 5  | Zona 2 - Centro Norte > Napo > Toda la Provincia de Napo   |
| 6  | Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Toda la Provincia de Orellana   |
| 7  | Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha                                       |
| 8  | Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo   |
| 9  | Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Toda la Provincia de Cotopaxi   |
| 10 | Zona 3 - Centro > Pastaza > Toda la Provincia de Pastaza   |
| 11 | Zona 3 - Centro > Tungurahua > Toda la Provincia de Tungurahua   |
| 12 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí   |
| 13 | Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Toda la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas |
| 14 | Zona 5 - Litoral > Bolívar > Toda la Provincia de Bolívar  |
| 15 | Zona 5 - Litoral > Galápagos > Toda la Provincia de Galapagos  |
| 16 | Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas   |
| 17 | Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Toda la Provincia de Los Ríos  |
| 18 | Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Toda la Provincia de Santa Elena  |
| 19 | Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay  |
| 20 | Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar  |
| 21 | Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago                                 |
| 22 | Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro  |
| 23 | Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja  |
| 24 | Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipec > Toda la Provincia de Zamora Chinchipe                                 |

## HITOS

|   | Hito                          | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| 1 | EJECUCIÓN: Avance físico 2011 | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2011         |                | 31/12/2011 |  | Sí            | 11.0          |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 2  | EJECUCIÓN: Avance físico 2012  | 5-Entregables Intermedios  | 31/12/2012         |                | 31/12/2012 |          | Sí            | 15.0          |
| 3  | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en comisión de selección.   | 5-Entregables Intermedios  | 18/01/2013         |                | 18/01/2013 |          | Sí            | 3.87          |
| 4  | EJECUCIÓN: Reporte de resultados sobre la ejecución de la actividad de Promoción del Proyecto, entregado.            | 1-Solicitud de Información | 24/01/2013         |                | 24/01/2013 |          | Sí            | 1.6           |
| 5  | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en comisión de selección.   | 1-Solicitud de Información | 15/02/2013         |                | 15/02/2013 |          | Sí            | 1.0           |
| 6  | EJECUCIÓN: Reporte de resultados sobre la ejecución de la actividad de Promoción del Proyecto, entregado             | 1-Solicitud de Información | 28/02/2013         |                | 20/02/2013 |          | Sí            | 1.6           |
| 7  | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en comisión de selección.   | 1-Solicitud de Información | 15/03/2013         |                | 27/03/2013 |          | Sí            | 1.0           |
| 8  | EJECUCIÓN: Reporte de resultados sobre la ejecución de la actividad de Promoción del Proyecto, entregado             | 1-Solicitud de Información | 30/03/2013         |                | 30/03/2013 |          | Sí            | 1.6           |
| 9  | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en comisión de selección.   | 1-Solicitud de Información | 30/04/2013         |                | 30/04/2013 |          | Sí            | 3.0           |
| 10 | EJECUCIÓN: Reporte de resultados sobre la ejecución de la actividad de Promoción del Proyecto, entregado.            | 1-Solicitud de Información | 30/04/2013         |                | 30/04/2013 |          | Sí            | 1.6           |
| 11 | EJECUCIÓN: Análisis de ejecución y re-programación del presupuesto, realizado.                                       | 1-Solicitud de Información | 20/05/2013         |                | 20/05/2013 |          | Sí            | 2.0           |
| 12 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en comisión de selección.   | 1-Solicitud de Información | 30/05/2013         |                | 30/05/2013 |          | Sí            | 3.0           |
| 13 | EJECUCIÓN: Reporte de resultados del taller con Prometeos, entregado.  | 1-Solicitud de Información | 30/05/2013         |                | 30/05/2013 |          | Sí            | 3.0           |
| 14 | EJECUCIÓN: Reporte de resultados sobre la ejecución de la EJECUCIÓN: actividad de Promoción del Proyecto, entregado. | 1-Solicitud de Información | 30/05/2013         |                | 30/05/2013 |          | Sí            | 2.6           |
| 15 | EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución.                              | 1-Solicitud de Información | 30/06/2013         |                | 30/06/2013 |          | Sí            | 1.6           |
| 16 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en comisión de selección.   | 1-Solicitud de Información | 30/06/2013         |                | 30/06/2013 |          | Sí            | 2.0           |
| 17 | EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución.                              | 1-Solicitud de Información | 30/07/2013         |                | 30/07/2013 |          | Sí            | 1.6           |
| 18 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en comisión de selección.   | 1-Solicitud de Información | 30/07/2013         |                | 30/07/2013 |          | Sí            | 2.0           |
| 19 | EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores  | 1-Solicitud de Información | 30/08/2013         |                | 30/08/2013 |          | Sí            | 1.6           |

HITOS

|    | Hito  | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
|    | para ser asignados a una institución.                                 |  |                    |                |            |          |               |               |
| 20 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comisión de selección.           | 1-Solicitud de Información             | 30/08/2013         |                | 30/08/2013 |          | Sí            | 2.0           |
| 21 | EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado septiembre. | 1-Solicitud de Información             | 30/09/2013         |                | 30/09/2013 |          | Sí            | 0.6           |
| 22 | EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado octubre.    | 1-Solicitud de Información             | 30/10/2013         |                | 30/10/2013 |          | Sí            | 2.0           |
| 23 | EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado noviembre   | 1-Solicitud de Información             | 30/11/2013         |                | 30/11/2013 |          | Sí            | 1.6           |
| 24 | EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado diciembre.  | 1-Solicitud de Información             | 18/12/2013         |                | 18/12/2013 |          | Sí            | 2.0           |
| 25 | EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado enero.      | 1-Solicitud de Información             | 31/01/2014         |                | 31/01/2014 |          | Sí            | 0.73          |
| 26 | EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado febrero.    | 1-Solicitud de Información             | 28/02/2014         |                | 28/02/2014 |          | Sí            | 0.73          |
| 27 | EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado marzo.      | 1-Solicitud de Información             | 31/03/2014         |                | 31/03/2014 |          | Sí            | 0.73          |
| 28 | EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado abril.      | 1-Solicitud de Información             | 30/04/2014         |                | 30/04/2014 |          | Sí            | 0.73          |
| 29 | EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado mayo.       | 1-Solicitud de Información             | 31/05/2014         |                | 31/05/2014 |          | Sí            | 0.73          |
| 30 | EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado junio.      | 1-Solicitud de Información             | 30/06/2014         |                | 30/06/2014 |          | Sí            | 0.73          |
| 31 | EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado julio.      | 1-Solicitud de Información             | 31/07/2014         |                | 31/07/2014 |          | Sí            | 0.73          |
| 32 | EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado agosto.     | 1-Solicitud de Información             | 31/08/2014         |                | 29/08/2014 |          | Sí            | 0.73          |
| 33 | EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado septiembre. | 1-Solicitud de Información             | 30/09/2014         |                | 30/09/2014 |          | Sí            | 0.74          |
| 34 | EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado octubre.    | 1-Solicitud de Información             | 31/10/2014         |                | 31/10/2014 |          | Sí            | 0.74          |
| 35 | EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado noviembre.  | 1-Solicitud de Información             | 30/11/2014         |                | 30/11/2014 |          | Sí            | 0.84          |
| 36 | EJECUCIÓN: Informe de pago prometeos vinculados realizado diciembre.  | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2014         |                | 31/12/2014 |          | Sí            | 3.0           |
| 37 | EJECUCIÓN: Actualización del proyecto enero realizado.                | 5-Entregables Intermedios              | 31/01/2015         |                | 31/01/2015 |          | Sí            | 0.84          |
| 38 | EJECUCIÓN: Actualización del proyecto febrero realizado.              | 5-Entregables Intermedios              | 28/02/2015         |                | 28/02/2015 |          | Sí            | 0.83          |
| 39 | EJECUCIÓN: Actualización del proyecto marzo realizado.                | 5-Entregables Intermedios              | 30/03/2015         |                | 30/03/2015 |          | Sí            | 0.83          |



**HITOS**

|    | Hito  | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 40 | EJECUCIÓN: Actualización del proyecto abril realizado.      | 5-Entregables Intermedios              | 30/04/2015         |                | 30/04/2015 |          | Sí            | 0.83          |
| 41 | EJECUCIÓN: Actualización del proyecto mayo realizado.       | 5-Entregables Intermedios              | 30/05/2015         |                | 30/05/2015 |          | Sí            | 0.83          |
| 42 | EJECUCIÓN: Actualización del proyecto junio realizado.      | 5-Entregables Intermedios              | 30/06/2015         |                | 30/06/2015 |          | Sí            | 0.83          |
| 43 | EJECUCIÓN: Actualización del proyecto julio realizado.      | 5-Entregables Intermedios              | 30/07/2015         |                | 30/07/2015 |          | Sí            | 0.83          |
| 44 | EJECUCIÓN: Actualización del proyecto agosto realizado.     | 5-Entregables Intermedios              | 30/08/2015         |                | 30/08/2015 |          | Sí            | 0.83          |
| 45 | EJECUCIÓN: Actualización del proyecto septiembre realizado. | 5-Entregables Intermedios              | 30/09/2015         |                | 30/09/2015 |          | Sí            | 0.83          |
| 46 | EJECUCIÓN: Actualización del proyecto octubre realizado.    | 5-Entregables Intermedios              | 30/10/2015         |                | 30/10/2015 |          | Sí            | 0.83          |
| 47 | EJECUCIÓN: Actualización del proyecto noviembre realizado.  | 5-Entregables Intermedios              | 30/11/2015         | 30/11/2015     |            |          | No            | 0.83          |
| 48 | EJECUCIÓN: Actualización del proyecto diciembre realizado.  | 5-Entregables Intermedios              | 30/12/2015         | 30/12/2015     |            |          | No            | 0.83          |
| 49 | CIERRE: Informe de cierre                                   | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2015         | 31/12/2015     |            |          | No            | 10.0          |

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

|   | Supervisión   | Supervisor                          | Organización Supervisora   | Fecha de creación |
|---|---|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | SUPERVISION DE PROYECTO   | Dueñas de la Torre, Susana Maria    | {PR} - Provincia - MANABÍ  | 25/11/2015        |
| 2 | SUPERVISION DE PROYECTO   | Dueñas de la Torre, Susana Maria    | {PR} - Provincia - MANABÍ  | 29/09/2015        |
| 3 | Supervisión al positiva al cumplimiento del Hito planificado para este mes  | Berrezueta Carrion, Leonardo Renato | {PR} - Provincia - AZUAY   | 28/09/2015        |
| 4 | VERIFICAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y EL NUMERO DE PROMETEOS VINCULADOS EN LAS INSTITUCIONES DE ACOGIDA EN LA PROVINCIA DE EL ORO | Granda Dávila, Pablo Esteban        | {PR} - Provincia - EL ORO  | 20/08/2014        |
| 5 | VERIFICACIÓN DE PROYECTO  | Ojeda Valarezo, Tania Verónica      | {PR} - Provincia - LOJA    | 22/04/2014        |
| 6 | Supervisión del Proyecto  | Cordero Ortiz, Miguel Humberto      | {PR} - Provincia - AZUAY   | 18/03/2014        |
| 7 | Visita del 09 de Diciembre del 2013   | Coka Bastidas, Denise Maria         | {PR} - Provincia - PASTAZA | 10/12/2013        |

**INDICADORES DEL PROYECTO**

| Indicador                     | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-------------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| No hay información disponible |        |                   |      |                       |                 |                            |


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00             |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 13,620,757.62 ** |
| Costo Total:                  | 41,800,000.00    |
| Total Devengado:              | 13,582,918.58    |
| % Costo Total Devengado:      | 32.50 %          |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 32.50 %

**Perfil Económico 2015**

|   | Años Previos    | Año Actual (2015) | Años Futuros | Total         |
|---|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado  | 7,374,961.96    | 55,151.24         | 0.00         | 7,430,113.20  |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00            | 0.00              | 0.00         | 0.00          |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 39,306,771.41   | 0.00              | 0.00         | 39,306,771.41 |
| Ppto. Codificado  | 14,895,072.48   | 17,312.20         | 0.00         | 14,912,384.68 |
| Ppto. Comprometido                                      | 3,365,245.57    | 17,312.20         | 0.00         | 3,382,557.77  |
| Planeado - Codificado (2015)                            |                 | 37,839.04         |              |               |
| Programado a Devengar                                   | 14,206,012.14   | 55,151.24         | 0.00         | 14,261,163.38 |
| Ppto. Devengado   | 13,565,606.38   | 17,312.20         | 0.00         | 13,582,918.58 |
| Estimado a fin de año                                   | * 13,565,606.38 | 0.00              | 0.00         | 13,565,606.38 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 640,405.76      | 55,151.24         | 0.00         | 695,557.00    |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 95.49 %       | 31.39 %           | 0.00 %       | 95.24 %       |
| Ppto. Codificado 998                                    | 0.00            | 0.00              | 0.00         | 0.00          |
| Ppto. Devengado 998                                     | 0.00            | 0.00              | 0.00         | 0.00          |

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015**

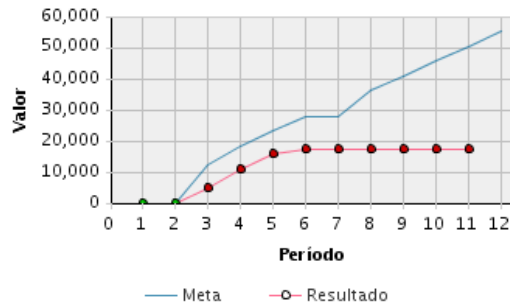

**Presupuesto Mensual 2015**

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado                               | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         | <span style="color: green;">●</span> | 0.00 %       |

| Presupuesto Mensual 2015 |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |        | 0.00 %       |
| Mar                      | 12,421.53                  | 4,994.47            | 12,421.53                    | 4,994.47              | 40.21 %          |        | 9.06 %       |
| Abr                      | 5,988.18                   | 5,988.18            | 18,409.71                    | 10,982.65             | 59.66 %          |        | 19.91 %      |
| May                      | 4,838.40                   | 4,838.40            | 23,248.11                    | 15,821.05             | 68.05 %          |        | 28.69 %      |
| Jun                      | 4,747.75                   | 1,491.15            | 27,995.86                    | 17,312.20             | 61.84 %          |        | 31.39 %      |
| Jul                      | 0.00                       | 0.00                | 27,995.86                    | 17,312.20             | 61.84 %          |        | 31.39 %      |
| Ago                      | 8,004.35                   | 0.00                | 36,000.21                    | 17,312.20             | 48.09 %          |        | 31.39 %      |
| Sep                      | 4,998.47                   | 0.00                | 40,998.68                    | 17,312.20             | 42.23 %          |        | 31.39 %      |
| Oct                      | 4,747.75                   | 0.00                | 45,746.43                    | 17,312.20             | 37.84 %          |        | 31.39 %      |
| Nov                      | 4,747.75                   | 0.00                | 50,494.18                    | 17,312.20             | 34.29 %          |        | 31.39 %      |
| Dic                      | 4,657.06                   |                     | 55,151.24                    |                       |                  |        |              |
| <b>Total</b>             | <b>55,151.24</b>           | <b>17,312.20</b>    |                              |                       |                  |        |              |

## OBJETIVOS ALINEADOS

### Objetivos Operativos

|   |  |
|---|--|
| 2 | Incrementar el número de vinculaciones de expertos de alto nivel residentes en el exterior a instituciones de acogida MEDIANTE la búsqueda de perfiles a nivel mundial, su evaluación, aprobación e incorporación de dichos profesionales. |
|---|--|

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo  | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|---------|---------------|
| 1  | DICTAMEN DE PRIORIDAD   | A.1.pdf | 21/11/2013    |
| 2  | FORMATO SENPLADES PROYECTO PROMETEO   | A.2.pdf | 25/11/2013    |
| 3  | A.3.ASOCIACIÓN HITO 1.- Avance físico 2011  | A.3.pdf | 25/11/2013    |
| 4  | A.4.ASOCIACIÓN HITO 2.- Avance físico 2012  | A.4.pdf | 25/11/2013    |
| 5  | A.5.ASOCIACIÓN HITO 3.- Prometeos aprobados en comisión de selección, enero 2013                              | A.5.pdf | 25/11/2013    |
| 6  | A.6.ASOCIACIÓN HITO 4.- Resultados sobre la ejecución de la actividad de promoción del Proyecto, enero 2013   | A.6.pdf | 25/11/2013    |
| 7  | A.7.ASOCIACIÓN HITO 5.- Prometeos aprobados en comisión de selección, febrero 2013                            | A.7.pdf | 25/11/2013    |
| 8  | A.8.ASOCIACIÓN HITO 6.- Resultados sobre la ejecución de la actividad de promoción del Proyecto, febrero 2013 | A.8.pdf | 25/11/2013    |
| 9  | A.9.ASOCIACIÓN HITO 7.- Prometeos aprobados en comisión de selección, marzo 2013                              | A.9.pdf | 25/11/2013    |
| 10 | B.1.ASOCIACIÓN HITO 8.- Resultados sobre la ejecución de la actividad de promoción del Proyecto, marzo 2013   | B.1.pdf | 25/11/2013    |
| 11 | B.2.ASOCIACIÓN HITO 9.- Prometeos aprobados en comisión de selección, abril 2013                              | B.2.pdf | 25/11/2013    |
| 12 | B.3.ASOCIACIÓN HITO 10.- Resultados sobre la ejecución de la actividad de promoción del Proyecto, abril 2013  | B.3.pdf | 25/11/2013    |
| 13 | B.4.ASOCIACIÓN HITO 11.- Análisis de ejecución y re-programación del presupuesto                              | B.4.pdf | 25/11/2013    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo  | Archivo  | Fecha de Alta |
|----|---|----------|---------------|
| 14 | B.5.ASOCIACIÓN HITO 12.- Prometeos aprobados en comisión de selección, mayo 2013                            | B.5.pdf  | 25/11/2013    |
| 15 | B.6.ASOCIACIÓN HITO 14.- Resultados sobre la ejecución de la actividad de promoción del Proyecto, mayo 2013 | B.6.pdf  | 02/09/2014    |
| 16 | B.7.ASOCIACIÓN HITO 15.- Perfiles disponibles de investigadores, junio 2013                                 | B.7.pdf  | 02/09/2014    |
| 17 | B.8.ASOCIACIÓN HITO 16.- Prometeos aprobados en comisión de selección, junio 2013                           | B.8.pdf  | 02/09/2014    |
| 18 | B.9.ASOCIACIÓN HITO 17.- Perfiles disponibles de investigadores, julio 2013                                 | B.9.pdf  | 02/09/2014    |
| 19 | C.1.ASOCIACIÓN HITO 18.- Prometeos aprobados en comisión de selección, julio 2013                           | C.1.pdf  | 02/09/2014    |
| 20 | C.2.ASOCIACIÓN HITO 19.- Perfiles disponibles de investigadores, agosto 2013                                | C.2.pdf  | 02/09/2014    |
| 21 | C.3.ASOCIACIÓN HITO 20.- Prometeos aprobados en comisión de selección, agosto 2013                          | C.3.pdf  | 02/09/2014    |
| 22 | C.4.ASOCIACIÓN HITO 21: Informe de pago prometeos vinculados realizado septiembre.                          | C.4.pdf  | 02/09/2014    |
| 23 | C.5.ASOCIACIÓN HITO 22: Informe de pago prometeos vinculados realizado octubre.                             | C.5.pdf  | 02/09/2014    |
| 24 | C.6.ASOCIACIÓN HITO 23: Informe de pago prometeos vinculados realizado noviembre.                           | C.6.pdf  | 02/09/2014    |
| 25 | C.7.ASOCIACIÓN HITO 24: Informe de pago prometeos vinculados realizado diciembre                            | C.7.docx | 02/09/2014    |
| 26 | C.8.ASOCIACIÓN HITO 25: Informe de pago prometeos vinculados realizado enero                                | C.8.pdf  | 02/09/2014    |
| 27 | C.9.ASOCIACIÓN HITO 26: Informe de pago prometeos febrero   | C.9.pdf  | 02/09/2014    |
| 28 | D.1 Reporte e-SIGEF febrero 2014  | D.1..pdf | 02/09/2014    |
| 29 | D.2.ASOCIACIÓN HITO 27: Informe de pago prometeos vinculados realizado marzo                                | D.2.pdf  | 02/09/2014    |
| 30 | D.3. Reporte e-SIGEF marzo 2014   | D.3.pdf  | 02/09/2014    |
| 31 | D.5. Reporte e-sigef mes de mayo 2014   | D.5.pdf  | 02/09/2014    |
| 32 | D.8. Reporte e-sigef mes de junio 2014  | D.8.pdf  | 02/09/2014    |
| 33 | D4.ASOCIACIÓN HITO 28: Informe de pago prometeos vinculados realizado abril                                 | D.4.pdf  | 02/09/2014    |
| 34 | D6.ASOCIACIÓN HITO 29: Informe de pago prometeos vinculados realizado mayo.                                 | D.6.pdf  | 02/09/2014    |
| 35 | D7.ASOCIACIÓN HITO 30: Informe de pago prometeos vinculados realizado junio.                                | D.7.pdf  | 02/09/2014    |
| 36 | D9.ASOCIACIÓN HITO 31.- Informe de pago prometeos vinculados realizado julio.                               | D9.pdf   | 02/09/2014    |
| 37 | E.1. Reporte e-sigef mes de Julio 2014  | E.1.pdf  | 31/07/2014    |
| 38 | E.2. Reporte e-sigef mes de Agosto 2014   | E.2.pdf  | 02/09/2014    |
| 39 | E.3.ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe de pago prometeos vinculados realizado agosto.                             | E3.pdf   | 02/09/2014    |
| 40 | E.4.ASOCIACIÓN HITO 33.- Informe de pago prometeos vinculados realizado septiembre.                         | E4.pdf   | 01/10/2014    |
| 41 | E.5. Reporte e-sigef mes de septiembre 2014   | E5.pdf   | 02/10/2014    |
| 42 | E.6. Reporte e-sigef mes de octubre 2014  | E6..pdf  | 04/11/2014    |
| 43 | E.7.ASOCIACIÓN HITO 34.- Informe de pago prometeos vinculados realizado octubre.                            | E7.pdf   | 04/11/2014    |
| 44 | E.8 Reporte e-sigef mes de Noviembre 2014   | E.8.pdf  | 01/12/2014    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo   | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|---------|---------------|
| 45 | E.9.ASOCIACIÓN HITO 35.- Informe de pago prometeos vinculados realizado noviembre. | E9.PDF  | 02/12/2014    |
| 46 | F.1. Reporte e-sigef mes de Diciembre 2014   | F1..pdf | 05/01/2015    |
| 47 | F.2.ASOCIACIÓN HITO 36.- Informe de pago cierre                                    | F2.pdf  | 06/01/2015    |
| 48 | F.3.ASOCIACIÓN HITO 37.- Informe de pago prometeos vinculados realizado diciembre. | F3.pdf  | 06/01/2015    |
| 49 | F.4. Reporte e-sigef mes de Marzo 2015   | F4.pdf  | 07/04/2015    |
| 50 | F5. Reporte e-sigef mes de Abril 2015  | F5.pdf  | 30/04/2015    |
| 51 | F6. Reporte e-sigef mes de Mayo 2015   | F6.pdf  | 05/06/2015    |

**LIGAS EXTERNAS**

**Dirección (URL)**

|   |   |
|---|---|
| 1 | <a href="http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/Prometeo/inicio.do">http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/Prometeo/inicio.do</a> |
|   | <a href="http://9 de Octubre y Ramírez Dávalos">http://9 de Octubre y Ramírez Dávalos</a>   |

**EQUIPO DEL PROYECTO**

| Nombre                            | Rol                | Puesto  | Correo Electrónico      | Teléfono(s) |
|-----------------------------------|--------------------|---|-------------------------|-------------|
| Dávila Castro, Marjorie Katherine | Lider del proyecto | Gerente del Proyecto Becas Prometeo                                       | mdavila@senescyt.gob.ec |             |
| Páez Echeverría, Viviana Priscila | Analista a cargo   | Coordinadora de Planificación Estratégica y Punto de Atención al Prometeo | vpaez@senescyt.gob.ec   |             |
| Solano, María José                | Analista apoyo     |   | msolano@senescyt.gob.ec |             |
