

**SENESCYT - Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación**  
**Coordinación General de Planificación**

**PROYECTO: K004 PROYECTO DE EXCELENCIA**

Líder del Proyecto:	Molina Carrera, Diana Gabriela (dmolina@senescyt.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ramírez Gallegos, René Alberto	Programas Relacionados:	PROYECTO DE EXCELENCIA
Titular:	Molina Carrera, Diana Gabriela	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	091590000.0000.376139	TIR:	13.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	83,279.64
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	6,004,747.03
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	12/12/2016	Fecha de Fin Base:	31/12/2014
Modificado por:	Martínez Chevez, Mayra Elizabeth	Fecha del siguiente Hito:	30/12/2016

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Fortalecer y mejorar las capacidades de gestión académica, investigativa, de vinculación con la colectividad y administrativa-financiera de las universidades y escuelas politécnicas públicas de calidad, para instalar procesos de mejora continua de la educación superior, que responda a los objetivos estratégicos nacionales y territoriales con perspectiva de acreditación internacional.

**Beneficios Cualitativos**

Información en proceso de actualización

**Tipo de Beneficiario**

Información en proceso de actualización


**Restricciones**

Proyecto dirigido a 7 Universidades de Calidad

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 80.23 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2013      Fecha de Fin: 31/12/2017

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

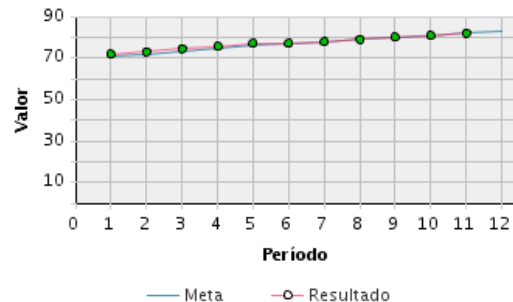

**Porcentaje de Avance**

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	71 %	72 %	73 %	74 %	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %	81 %	82 %	83 %
	Avance real acumulado											
	72 %	73 %	74 %	75 %	77 %	77 %	78 %	79 %	80 %	81 %	82 %	

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>NOVIEMBRE 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	08/12/2016 - 12:41 PM
<p>OCTUBRE 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	11/11/2016 - 05:01 PM
<p>SEPTIEMBRE 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	05/10/2016 - 04:19 PM
<p>AGOSTO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p> <p>2. Para el mes de Agosto se realizo la transferecna a la ESPE por un monto de 5.500.000,00</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	02/09/2016 - 09:02 AM
<p>JULIO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p> <p>2. Para el mes de Julio no se realizaron transferencias</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	08/08/2016 - 04:25 PM
<p>JUNIO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	04/07/2016 - 11:57 AM
<p>MAYO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	03/06/2016 - 10:56 AM
<p>ABRIL 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	03/05/2016 - 10:29 AM
<p>MARZO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	04/04/2016 - 04:54 PM
<p>FEBRERO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p>	Gordillo Salinas, Mario Andrés	02/03/2016 - 09:13 AM
<p>ENERO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p>	Gordillo Salinas, Mario Andrés	16/02/2016 - 03:31 PM
<p>ENERO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p>	Gordillo Salinas, Mario Andrés	05/02/2016 - 05:25 PM
<p>DICIEMBRE 2015</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p>	Gordillo Salinas, Mario Andrés	29/01/2016 - 08:45 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
NOVIEMBRE 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	07/12/2015 - 10:05 AM
OCTUBRE 2015. 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	10/11/2015 - 10:23 AM
SEPTIEMBRE 2015. 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	27/10/2015 - 03:38 PM
AGOSTO 2015. 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	10/09/2015 - 05:09 PM
JULIO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	10/09/2015 - 05:04 PM
JUNIO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	10/09/2015 - 05:04 PM
JUNIO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	05/07/2015 - 09:05 PM
MAYO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	08/06/2015 - 11:38 AM
ABRIL 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	04/05/2015 - 09:23 AM
MARZO 2015  1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	04/05/2015 - 09:22 AM
FEBRERO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	04/05/2015 - 09:22 AM
ENERO 2015  1. Se realizó la actualización del Proyecto de Inversión de Excelencia.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	18/02/2015 - 11:41 AM

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3


**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Equipo de trabajo Definido	4-Inicio de Trabajo	01/01/2013		01/01/2013		Sí	10.0
2	PLANEACIÓN: Dictamen de Prioridad Aprobada	3-Adjudicación	02/01/2013		02/01/2013		Sí	10.0
3	EJECUCIÓN: Avance Físico 2014	5-Entregables Intermedios	23/12/2014		23/12/2014		Sí	30.0
4	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	1.66

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
5	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	1.66
6	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/03/2015		30/03/2015		Sí	1.66
7	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	1.66
8	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/05/2015		30/05/2015		Sí	1.66
9	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	1.66
10	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/07/2015		30/07/2015		Sí	1.66
11	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/08/2015		30/08/2015		Sí	1.66
12	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	1.66
13	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/10/2015		30/10/2015		Sí	1.66
14	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	1.66
15	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/12/2015		30/12/2015		Sí	1.66
16	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/01/2016		30/01/2016		Sí	1.0
17	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2016		28/02/2016		Sí	1.0
18	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	01/03/2016		01/03/2016		Sí	1.0
19	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	17/03/2016		17/03/2016		Sí	0.5
20	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	29/04/2016		29/04/2016		Sí	0.5
21	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2016		30/04/2016		Sí	0.5
22	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	29/05/2016		29/05/2016		Sí	0.5
23	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/05/2016		30/05/2016		Sí	1.0
24	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2015		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/07/2016		30/07/2016		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/08/2016		30/08/2016		Sí	1.0
27	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	1.0
28	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/10/2016		30/10/2016		Sí	1.0
29	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	1.0
30	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/12/2016	30/12/2016			No	1.08
31	EJECUCIÓN: Avance Físico 2017	5-Entregables Intermedios	30/12/2017	30/12/2017			No	7.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
32	CIERRE: Informe de Cierre	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2017	31/12/2017			No	10.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	6,004,747.03 **
Costo Total:	65,420,690.00
Total Devengado:	6,022,413.53
% Costo Total Devengado:	9.21 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 9.21 %

**Perfil Económico 2016**

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	7,813,779.30	0.00	0.00	7,813,779.30
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ppto. Aprobado Inicial</b>	7,211,915.30	121,536.16	0.00	7,333,451.46
Ppto. Codificado	6,046,776.47	276,879.38	0.00	6,323,655.85
Ppto. Comprometido	5,908,475.00	272,026.30	0.00	6,180,501.30
Planeado - Codificado (2016)		-276,879.38		
<b>Programado a Devengar</b>	7,470,997.58	242,432.03	0.00	7,713,429.61
Ppto. Devengado	5,762,315.00	260,098.53	0.00	6,022,413.53
Estimado a fin de año	* 5,762,315.00	0.00	0.00	5,762,315.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,708,682.58	242,432.03	0.00	1,951,114.61
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 77.13 %	107.29 %	0.00 %	78.08 %
<b>Ppto. Codificado 998</b>	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
<b>Ppto. Devengado 998</b>	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016**

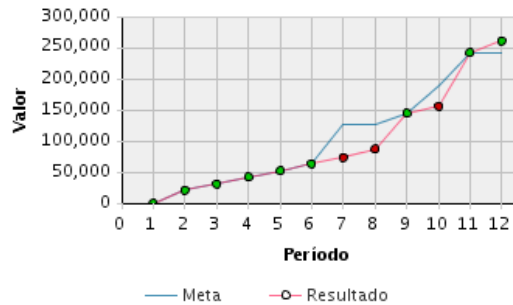

**Presupuesto Mensual 2016**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	0.00 %

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	20,493.31	20,493.31	20,493.31	20,493.31	100.00 %		8.45 %
Mar	9,756.34	9,756.34	30,249.65	30,249.65	100.00 %		12.48 %
Abr	11,265.96	11,265.96	41,515.61	41,515.61	100.00 %		17.12 %
May	10,851.75	10,851.75	52,367.36	52,367.36	100.00 %		21.60 %
Jun	10,720.25	10,720.25	63,087.61	63,087.61	100.00 %		26.02 %
Jul	63,230.81	10,588.75	126,318.42	73,676.36	58.33 %		30.39 %
Ago	0.00	12,741.54	126,318.42	86,417.90	68.41 %		35.65 %
Sep	17,691.60	58,405.89	144,010.02	144,823.79	100.57 %		59.74 %
Oct	44,500.79	10,750.79	188,510.81	155,574.58	82.53 %		64.17 %
Nov	53,921.22	86,290.83	242,432.03	241,865.41	99.77 %		99.77 %
Dic	0.00	18,233.12	242,432.03	260,098.53	107.29 %		107.29 %
<b>Total</b>	<b>242,432.03</b>	<b>260,098.53</b>					

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
5	Incrementar la eficiencia de la gestión de la planificación institucional MEDIANTE la aplicación de metodologías y herramientas para la generación de planes, programas, proyectos de inversión y desconcentración territorial.
7	Incrementar la eficiencia y calidad de la gestión de Seguimiento y Evaluación MEDIANTE la aplicación de metodologías y herramientas de análisis de resultados para la generación de informes y respuestas a pedidos de información.

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1. Reporte e-SIGEF Enero 2015	A1.pdf	30/03/2015
2	A2. Reporte e-SIGEF febrero 2015	A2.pdf	30/03/2015
3	A3. Reporte e-SIGEF Marzo 2015	A3.pdf	30/03/2015
4	A4. Reporte e-SIGEF Abril 2015	A4.pdf	30/04/2015
5	A5. Reporte e-SIGEF Mayo 2015	A5.pdf	05/06/2015
6	A6. Reporte e-SIGEF JUNIO 2015	A6.pdf	20/02/2016
7	A7. Reporte e-SIGEF JULIO 2015	A7.pdf	20/02/2016
8	A8. Reporte e-SIGEF AGOSTO 2015	A8.pdf	20/02/2016
9	A9. Reporte e-SIGEF SEPTIEMBRE 2015	A9.pdf	20/02/2016
10	B1. Reporte e-SIGEF OCTUBRE 2015	B1.pdf	20/02/2016
11	B2. Reporte e-SIGEF NOVIEMBRE 2015	B2.pdf	20/02/2016
12	B3. Reporte e-SIGEF DICIEMBRE 2015	B3.pdf	20/02/2016
13	B4. Reporte e-SIGEF ENERO 2016	B4.pdf	20/02/2016
14	B5. Reporte e-SIGEF FEBRERO 2016	B5.pdf	02/03/2016
15	B6. Reporte e-SIGEF MARZO 2016	B6.pdf	04/04/2016
16	B7. Reporte e-SIGEF ABRIL 2016	B7.pdf	03/05/2016
17	B8. Reporte e-SIGEF MAYO 2016	B8.pdf	03/06/2016
18	B9. Reporte e-SIGEF JUNIO 2016	B9.pdf	04/07/2016
19	C1. Reporte e-SIGEF JULIO 2016	C1.pdf	08/08/2016
20	C2. Reporte e-SIGEF Agosto 2016	C2.pdf	06/09/2016

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
21	C3. Reporte e-SIGEF Septiembre 2016	C3.pdf	05/10/2016
22	C4. Reporte e-SIGEF Octubre 2016	C4.pdf	09/11/2016
23	C5. Reporte e-SIGEF Noviembre 2016	C5.pdf	12/12/2016

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Castro Arredondo, Hugo Nicanor	Líder Metodológico	Analista de Seguimiento	hcastro@senescyt.gob.ec	
Molina Carrera, Diana Gabriela	Coordinadora General de Planificación		dmolina@senescyt.gob.ec	
