

**SENESCYT - Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación**  
**Subsecretaría de Formación Académica y Profesional**

**PROYECTO: K004 PROYECTO DE EXCELENCIA**

Líder del Proyecto:	Cuji Llugna, Luis Fernando (lcuji@senescyt.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Bonilla Soria, Xavier Adrian	Programas Relacionados:	PROYECTO DE EXCELENCIA
Titular:	Cuji Llugna, Luis Fernando	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	091590000.0000.376139	TIR:	13.00 %
Objetivos Operativos:	8	VAN:	83,279.64
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	6,088,366.59
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	09/11/2017	Fecha de Fin Base:	31/12/2014
Modificado por:	Espinoza Castro, Silvia Valeria	Fecha del siguiente Hito:	20/11/2017

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Fortalecer y mejorar las capacidades de gestión académica, investigativa, de vinculación con la colectividad y administrativa-financiera de las universidades y escuelas politécnicas públicas de calidad, para instalar procesos de mejora continua de la educación superior, que responda a los objetivos estratégicos nacionales y territoriales con perspectiva de acreditación internacional.

**Beneficios Cualitativos**

Información en proceso de actualización

**Tipo de Beneficiario**

Información en proceso de actualización


**Restricciones**

Proyecto dirigido a 7 Universidades de Calidad

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 97.15 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2013      Fecha de Fin: 31/12/2017

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

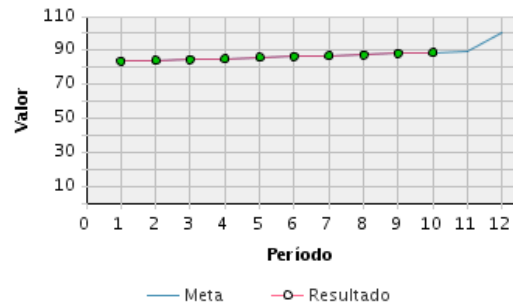

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	83 %	84 %	85 %	85 %	86 %	86 %	87 %	88 %	88 %	89 %	89 %	100 %
	Avance real acumulado											

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	83 %	84 %	85 %	85 %	86 %	86 %	87 %	88 %	88 %	89 %		
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>OCTUBRE 2017</b></p> <p>Durante el mes de octubre de 2017 se realizaron las siguientes actividades relacionadas con los hitos: Hito 49. Diseñada campaña contra la violencia a la mujer en el marco del acompañamiento a Redes; e, Hito 50 Revisada y aprobada propuesta de programa de posgrado conjunto</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementación de foros de sensibilización sobre violencia de género. Asociación hito 47.</li> <li>2. Organización de campaña contra la violencia de género. Asociación hito 49.</li> <li>3. Elaboración de informe técnico sobre la campaña para la erradicación de la violencia de género en las IES. Asociación hito 49.</li> <li>4. Acompañamiento en el proceso de aprobación interna del programa de Maestría Conjunta en Ciencia de los Alimentos. Asociación hito 50.</li> <li>5. Acompañamiento en el proceso de presentación del programa de Maestría Conjunta en Ciencia de los Alimentos para aprobación ante el CES. Asociación hito 50.</li> <li>6. Monitoreo semanal al avance en la ejecución de la obra de la ESPE en Santo Domingo de los Tsáchilas.. Asociación Hito 44</li> <li>7. Seguimiento a la ejecución del convenio ESPOCH-SENESCYT. Asociación hito 45</li> </ol> <p>Adicionalmente se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración de respuestas a trámites ingresados a la SFA</li> <li>- Elaboración de informes varios.</li> <li>- Organización de un taller focal para definir contenido de un protocolo de prevención, erradicación y atención a casos de violencia sexo genérica en las IES</li> <li>- Implementación de foros de sensibilización de violencia de género en las IES</li> </ul> <p>En el mes de octubre de 2017 no se realizaron transferencias por parte del proyecto.</p>	Espinoza Castro, Silvia Valeria	09/11/2017 - 02:41 PM
<p><b>SEPTIEMBRE 2017</b></p> <p>Durante el mes de septiembre de 2017 se realizaron las siguientes actividades relacionadas con los hitos: Hito 47 Ejecutada primera actividad de fortalecimiento de buenas prácticas, elaborado , Hito 48. Ejecutada segunda actividad de fortalecimiento de buenas prácticas, elaborado.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organización de foros de sensibilización sobre violencia de género. Asociación hito 47</li> <li>2. Coordinación de curso para docentes en la EPN. Asociación Hito 48</li> <li>3. Monitoreo semanal al avance en la ejecución de la obra de la ESPE en Santo Domingo de los Tsáchilas.. Asociación Hito 44</li> <li>4. Seguimiento a la ejecución del convenio ESPOCH-SENESCYT. Asociación hito 45</li> </ol> <p>Adicionalmente se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organización de taller de diagnóstico del campo de agricultura</li> <li>- Elaboración de insumos técnicos y recomendaciones de líneas de trabajo con la Universidad Zamorano</li> <li>- Elaboración de respuestas a trámites ingresados a la SFA</li> <li>- Elaboración de informes varios.</li> </ul> <p>En el mes de septiembre de 2017 no se realizaron transferencias por parte del proyecto.</p>	Espinoza Castro, Silvia Valeria	11/10/2017 - 04:34 PM
<p><b>AGOSTO 2017</b></p> <p>Durante el mes de agosto de 2017 se realizaron las siguientes actividades relacionadas con los hitos: Hito 45 Informe de seguimiento al convenio ESPOCH-SENESCYT, elaborado e, Hito 46. Plan de Fortalecimiento de Buenas Prácticas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reunión para organización de actividades contempladas en el plan de buenas prácticas. Asociación hito 46</li> <li>2. Coordinación de curso para docentes en la EPN. Asociación Hito 46</li> <li>2. Seguimiento a los avances de publicación . Asociación Hito 43</li> </ol>	Espinoza Castro, Silvia Valeria	26/09/2017 - 08:26 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3. Monitoreo semanal al avance en la ejecución de la obra de la ESPE en Santo Domingo de los Tsáchilas.. Asociación Hito 44</p> <p>4. Seguimiento a la ejecución del convenio ESPOCH-SENESCYT. Asociación hito 45</p> <p>Adicionalmente se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acompañamiento a la UTA y la UCE en el proceso de aprobación del programa conjunto de Maestría en Ciencia de los Alimentos</li> <li>- Acompañamiento a la EPN en la generación de dos programas de maestría investigativa</li> <li>- Monitoreo semanal a la obra de la ESPE Santo Domingo de los Tsáchilas</li> <li>- Elaboración de respuestas a trámites ingresados a la SFA</li> <li>- Coordinación de actividades con la AMEXCID para la identificación de expertos mexicanos que colaboren con las UEP del Proyecto de Excelencia</li> <li>- - Elaboración de informes varios.</li> </ul> <p>En el mes de agosto se realizaron transferencias por parte del proyecto.</p>		
<p>JULIO 2017</p> <p>Durante el mes de julio de 2017 se realizaron las siguientes actividades relacionadas con los hitos: Hito 43 Primer Borrador de ponencias sobre educación superior y género para publicación, en el marco de acompañamiento a redes, elaborado; e, Hito 42. Reapertura de la Extensión de Macas de la ESPOCH, realizado.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reunión del núcleo de la RESG para coordinaciones relacionadas con la población del libro, el 15 de julio de 2017 Asociación Hito 43</li> <li>2. Elaboración de informe de seguimiento a los avances de publicación . Asociación Hito 43</li> <li>3. Monitoreo semanal al avance en la ejecución de la obra de la ESPE en Santo Domingo de los Tsáchilas.. Asociación Hito 44</li> <li>4. Elaboración de informe técnico de seguimiento de la obra de la ESPE en Santo Domingo de los Tsáchilas.. Asociación Hito 44</li> <li>5. Visita a la ESPE en Santo Domingo de los Tsáchilas el.20 de julio de 2017. Asociación Hito 44</li> </ol> <p>Adicionalmente se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acompañamiento a la UTA y la UCE en el proceso de aprobación del programa conjunto de Maestría en Ciencia de los Alimentos</li> <li>- Acompañamiento a la EPN en la generación de dos programas de maestría investigativa</li> <li>- Monitoreo semanal a la obra de la ESPE Santo Domingo de los Tsáchilas</li> <li>- Elaboración de respuestas a trámites ingresados a la SFA</li> <li>- Coordinación de actividades con la AMEXCID para la identificación de expertos mexicanos que colaboren con las UEP del Proyecto de Excelencia</li> <li>- - Elaboración de informes varios.</li> </ul> <p>En el mes de julio no se realizaron transferencias por parte del proyecto. Espinoza Castro, Silvia Valeria 11/07/2017 - 04:40 PM</p>	<p>Espinoza Castro, Silvia Valeria</p>	<p>14/08/2017 - 08:20 AM</p>
<p>JUNIO 2017</p> <p>Durante el mes de junio de 2017 se realizaron las siguientes actividades relacionadas con los hitos: Hito 41 Primer Borrador de ponencias sobre educación superior y género para publicación, en el marco de acompañamiento a redes, elaborado; e, Hito 42. Reapertura de la Extensión de Macas de la ESPOCH, realizado.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reunión ampliada de la Red de Educación Superior y Género, realizada el 30 de junio de 2017. Asociación Hito 41</li> <li>2. Elaboración de informe técnico para entrega de ponencias para publicación a la Universidad Técnica de Ambato. Asociación Hito 41</li> <li>3. Monitoreo semanal al avance en la ejecución de la obra de la ESPOCH en Macas. Asociación Hito 42</li> <li>2. Elaboración de informe técnico de seguimiento de la obra de la ESPOCH Macas. Asociación Hito 42</li> </ol> <p>Adicionalmente se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acompañamiento a la UTA y la UCE en el proceso de aprobación del programa conjunto de Maestría en Ciencia de los Alimentos</li> <li>- Monitoreo semanal a la obra de la ESPE SAnTo Domingo de los Tsáchilas</li> </ul>	<p>Espinoza Castro, Silvia Valeria</p>	<p>11/07/2017 - 04:40 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>- Elaboración de respuestas a trámites ingresados a la SFA                      - Coordinación de actividades con la AMEXCID para la identificación de expertos mexicanos que colaboren con las UEP del Proyecto de Excelencia                      - Coordinación de actividades entre la UFA ESPE y la AMEXCID para la participación de expertos mexicanos en el II Congreso de Ciencia y Tecnología                      - Elaboración de informes varios.</p> <p>En el mes de Mayo no se realizaron transferencias por parte del proyecto.</p>		
<p>MAYO 2017</p> <p>Durante el mes de mayo de 2017 se realizaron las siguientes actividades relacionadas con los hitos: Hito 39. Finalizada área remodelada de la ESPOCH Macas; e, Hito 40. Elaborada propuesta de programa de posgrado conjunto.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoreo semanal al avance en la ejecución de la obra de la ESPOCH en Macas. Asociación Hito 39</li> <li>2. Elaboración de informe técnico de seguimiento de la obra de la ESPOCH Macas. Asociación Hito 39</li> <li>3. Acompañamiento a la EPN en el diseño de un programa de maestría investigativa en Gestión de la Ciencia y la Tecnología. Asociación hito 40.</li> <li>4. Elaboración de informe técnico de acompañamiento en la elaboración de programas de posgrado investigativo de las universidades que participan en el proyecto de excelencia. Asociación hito 40.</li> <li>5. En el mes de Mayo no se realizaron transferencias por parte del proyecto.</li> </ol>	<p>Castro Arredondo, Hugo Nicanor</p>	<p>15/06/2017 - 09:15 AM</p>
<p>ABRIL 2017</p> <p>Durante el mes de ABRIL de 2017 se cumplieron dos de los hitos programados. Hito 37 Entregado al CES 1 programa de posgrado conjunto en producción alimentaria para aprobación, realizado, e Hito 38: Finalizada infraestructura para aulas UFA ESPE Santo Domingo, realizado.</p> <p>Se realizaron las siguientes actividades</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoreo y seguimiento semanal de avance de obra de construcción de la FASE I-A de la futura Sede de la UFA ESPE en Santo Domingo de los Tsáchilas. Asociación hito 38</li> <li>2. Visita de seguimiento in-situ a la obra de la Fase I-A de la futura Sede de la UFA ESPE en Santo Domingo de los Tsáchilas, el 27/04/2017. Asociación hito 38</li> <li>3. Reunión con delegados del CEE, UFA ESPE, INNOVATIVA, para establecer estrategias para cumplimiento de metas. Asociación hito 38</li> <li>4. Elaboración de Informe de avance de obra ESPE Santo Domingo. Asociación hito 38.</li> <li>5. Reunión con vicerrectores de la UTA y UCE para establecer compromisos que permitan la presentación del programa de maestría en alimentos ante el CES el 23/04/2017. Asociación hito 37</li> <li>6. Reuniones técnicas para la generación de programas de posgrado conjuntos el con la UTA, UCE, EPN y AECID. Asociación hito 37</li> </ol> <p>Adicionalmente se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Orientación a la UTA y UCE en la elaboración del presupuesto del programa de maestría en Alimentos con mención en Ciencia y Tecnología                      Actualización y presentación ante la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo del proyecto de fortalecimiento a la política pública de educación superior en el marco de la cooperación internacional con México                      Organización y participación de la II reunión ampliada de la RESG, realizada en Universidad de Otavalo el 7 de abril de 2017                      Coordinación con tres universidades para la organización de actividades en la que participen expertos mexicanos en diferentes campos del conocimiento                      Participación en la reunión de la mesa técnica de inclusión, realizada el 6 de abril de 2017                      Gestión de aceptación de ayuda en especie otorgada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo                      Organización y participación de la reunión con vicerrectores para tratar asuntos del programa de maestría en Alimentos con mención en Ciencia y Tecnología, realizada el lunes 24 de abril de 2017                      Seguimiento a las acciones implementadas en las IES para afrontar casos de violencia de género</p>	<p>Espinoza Castro, Silvia Valeria</p>	<p>09/05/2017 - 02:39 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>MARZO 2017</b></p> <p>Durante el mes de marzo de 2017 se cumplieron dos de los hitos programados. Hito 35 Informe de avance de obra ESPE Santo Domingo, elaborado; e, Hito 36 Informe de avance de obra ESPOCH Macas, elaborado.</p> <p>Se realizaron las siguientes actividades</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Monitoreo y seguimiento semanal de avance de obra de construcción de la FASE I-A de la futura Sede de la UFA ESPE en Santo Domingo de los Tsáchilas. Asociación hito 35</li> <li>2.Monitoreo y seguimiento semanal de avance de obra de remodelación y mantenimiento de la Extensión de Morona Santiago de la ESPOCH. Asociación hito 36</li> <li>3.Elaboración de Informe de avance de obra ESPE Santo Domingo. Asociación hito 35.</li> <li>4.Elaboración de informe de avance de obra ESPOCH Macas. Asociación hito 36.</li> <li>5.Revisión y aprobación de Informe de avance de obra ESPE Santo Domingo. Asociación hito 35.</li> <li>6.Revisión y aprobación de informe de avance de obra ESPOCH Macas. Asociación hito 36.</li> <li>7. Reuniones técnicas para la generación de programas de posgrado conjuntos el 7, 8, 13, 22, y 28 de abril de 2017 con la UTA, UCE y AECID.</li> </ol> <p>Adicionalmente se realizaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Actualización del Proyecto de Excelencia en el SIPeIP</li> <li>2.Organización y logística de charla académica en Macas, el 14/03/ 2017</li> <li>3.Organización y logística para recorrido de obra de la Extensión de Morona Santiago de la ESPOCH por parte de la Subsecretaría General de Educación Superior, realizada el 14/03/2017</li> <li>4.Elaboración de insumos: ayuda memoria, fichas técnicas y líneas argumentales para el recorrido de obra de la Extensión de Morona Santiago de la ESPOCH</li> <li>5.Elaboración de informe de ejecución del Proyecto de Excelencia para incorporarse en el informe de rendición de cuentas de la institución.</li> <li>6.Apoyo en organización y logística de charla académica en la Universidad Técnica de Ambato, realizada el 21/03/2017</li> <li>7.Realización de video conferencia para coordinación de publicación de libro, en el marco del trabajo de acompañamiento de redes académicas, el 15/03/2017</li> <li>8.Reunión del núcleo de la RESG, realizada en el marco del acompañamiento a redes académicas, el 24/03/2017</li> <li>9. Reunión para implementación del programa de posgrado conjunto en producción alimentaria el 8/03/2017</li> <li>10. Reunión para revisión de presupuesto del programa de posgrado conjunto en producción alimentaria el 28/03/2017</li> </ol>	<p>Espinoza Castro, Silvia Valeria</p>	<p>10/04/2017 - 10:49 AM</p>
<p><b>FEBRERO 2017</b></p> <p>Durante el mes de febrero de 2017 se cumplieron dos de los hitos programados. Hito 33 Lineamientos de respuesta al acoso sexual en Pichincha, en el marco del plan de acompañamiento a redes, socializado; e, Hito 34; y, Lineamientos de respuesta al acoso sexual, en Provincias, en el marco del plan de acompañamiento a redes, socializado.</p> <p>Se realizaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Actualización de base de contactos de IES de Pichincha que pertenecen a la Red de Educación Superior y Género (RESG) . Asociación hito 33</li> <li>2.Actualización de base de contactos de IES de Provincia que pertenecen a la RESG. Asociación hito 34</li> <li>3.Generación del oficio para socializar los Lineamientos de respuesta al acoso sexual a IES que pertenecen a la RESG de Pichincha. Asociación al hito 33</li> <li>4.Envío de oficio N° SENESCYT-SFA-2017-0116-O, a 10 instituciones de educación superior de Pichincha que pertenecen a la RESG, a través de Correos del Ecuador. Asociación hito 33</li> <li>5.Envío de oficio N° SENESCYT-SFA-2017-0116-O, a 25 instituciones de educación superior de Pichincha que pertenecen a la RESG, a través de Correos del Ecuador. Asociación hito 34</li> <li>6.Envío de "Lineamientos generales para la respuesta al acoso sexual y otras formas de violencia basada en género en las instituciones de educación superior en el Ecuador", a las IES de Pichincha, que integran la RESG, a través de correo electrónico. Asociación hito 33</li> <li>7.Envío de "Lineamientos generales para la respuesta al acoso sexual y otras formas de violencia basada en género en las instituciones de educación superior en el Ecuador", a las IES de 13 provincias, que integran la RESG, a través de correo electrónico. Asociación hito 34</li> <li>8.Elaboración de informe de la socialización de los "Lineamientos generales para la respuesta al acoso sexual y otras formas de violencia basada en género en las instituciones de educación superior en el Ecuador", a IES de Pichincha. Asociación hito 33</li> <li>9.Elaboración de informe de la socialización de los "Lineamientos generales para la respuesta al acoso sexual y otras formas de violencia basada en género en las instituciones de educación superior en el Ecuador", a IES de 13 provincias. Asociación hito 34</li> </ol>	<p>Espinoza Castro, Silvia Valeria</p>	<p>08/03/2017 - 05:33 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Adicionalmente se realizaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Seguimiento semanal al avance de la obra de construcción de la Fase I-A de la futura sede de la UFA ESPE en Santo Domingo de los Tsáchilas.</li> <li>2.Seguimiento semanal al avance de la obra de reapertura de la extensión de Morona Santiago de la ESPOCH.</li> <li>3.Inspección in-situ obra de construcción de la Fase I-A de la futura sede de la UFA ESPE en Santo Domingo de los Tsáchilas, domingo 12 de febrero de 2017.</li> <li>4.Coordinación y logística para visita del señor Presidente a la obra de construcción de la Fase I-A de la futura sede de la UFA ESPE en Santo Domingo de los Tsáchilas, el 13 de febrero de 2017</li> <li>5.Inspección in-situ obra de construcción de reapertura de la extensión de Morona Santiago de la ESPOCH, el 24 de febrero de 2017.</li> <li>6.Coordinación y conducción de reuniones del núcleo de la RESG el 10 y 24 de febrero de 2017</li> </ol>		
<p><b>ENERO 2017</b></p> <p>Durante el mes de enero de 2017 se cumplieron dos de los hitos programados. Hito 31 Definido el plan de acompañamiento a redes académicas; e, Hito 32 Informe de cumplimiento de plan de acompañamiento a redes 2016, elaborado</p> <p>Se realizaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Reunión del núcleo de la RESG para definir propuesta de trabajo para el 2017. Asociación al hito 31</li> <li>2.Elaboración del plan de acción de la RESG para el 2017. Asociación al hito 31</li> <li>3.Elaboración del plan de acompañamiento redes académicas para el año 2017. Asociación al hito 31</li> <li>4.Organización y conducción de la primera reunión ampliada de la RESG del 2017. Asociación al hito 31</li> <li>5.Actualización de datos de los representantes de las instituciones de educación superior a la RESG. Asociación hito 31</li> <li>6. Elaboración del Informe de cumplimiento al plan de acompañamiento a redes correspondiente al año 2016. Asociación al hito 32</li> </ol> <p>Adicionalmente se realizaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Seguimiento semanal al avance de la obra de construcción de la Fase I-A de la futura sede de la UFA ESPE en Santo Domingo de los Tsáchilas.</li> <li>2.Seguimiento semanal al avance de la obra de reapertura de la extensión de Morona Santiago de la ESPOCH.</li> <li>3.Elaboración de ayuda memoria de la primera reunión ampliada de la RESG</li> <li>4.Informe de acciones a favor de ciudadanos y ciudadanas LGBTI</li> <li>5.Informes de avances en la reivindicación de los derechos de la mujer</li> <li>6.Seguimiento a la ampliación del convenio de cooperación interinstitucional entre la SENESCYT y la UFA ESPE para la construcción de los laboratorios de Petroquímica de la extensión Latacunga de dicha institución</li> <li>7.Revisión de informes para aceptación de productos generados en el marco de la construcción de la Agenda 2035 de Educación Superior</li> <li>8.Seguimiento a la ejecución del proceso de construcción de programas de posgrado conjunto.</li> <li>9. En el mes de enero de 2017 no se realizaron transferencias de recursos</li> </ol>	Espinoza Castro, Silvia Valeria	14/02/2017 - 04:35 PM
<p><b>DICIEMBRE 2016</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</li> </ol>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	10/01/2017 - 12:17 PM
<p><b>NOVIEMBRE 2016</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</li> </ol>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	08/12/2016 - 12:41 PM
<p><b>OCTUBRE 2016</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</li> </ol>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	11/11/2016 - 05:01 PM
<p><b>SEPTIEMBRE 2016</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</li> </ol>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	05/10/2016 - 04:19 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia. 2. Para el mes de Agosto se realizo la transferecnia a la ESPE por un monto de 5.500.000,00</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	02/09/2016 - 09:02 AM
<p>JULIO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia. 2. Para el mes de Julio no se realizaron transferencias</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	08/08/2016 - 04:25 PM
<p>JUNIO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	04/07/2016 - 11:57 AM
<p>MAYO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	03/06/2016 - 10:56 AM
<p>ABRIL 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	03/05/2016 - 10:29 AM
<p>MARZO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	04/04/2016 - 04:54 PM
<p>FEBRERO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p>	Gordillo Salinas, Mario Andrés	02/03/2016 - 09:13 AM
<p>ENERO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p>	Gordillo Salinas, Mario Andrés	16/02/2016 - 03:31 PM
<p>ENERO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p>	Gordillo Salinas, Mario Andrés	05/02/2016 - 05:25 PM
<p>DICIEMBRE 2015</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p>	Gordillo Salinas, Mario Andrés	29/01/2016 - 08:45 AM
<p>NOVIEMBRE 2015</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p>	Gordillo Salinas, Mario Andrés	07/12/2015 - 10:05 AM
<p>OCTUBRE 2015.</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p>	Gordillo Salinas, Mario Andrés	10/11/2015 - 10:23 AM
<p>SEPTIEMBRE 2015.</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p>	Gordillo Salinas, Mario Andrés	27/10/2015 - 03:38 PM
<p>AGOSTO 2015.</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p>	Gordillo Salinas, Mario Andrés	10/09/2015 - 05:09 PM
<p>JULIO 2015</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.</p>	Gordillo Salinas, Mario Andrés	10/09/2015 - 05:04 PM
<p>JUNIO 2015</p>	Gordillo Salinas, Mario Andrés	10/09/2015 - 05:04 PM

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.		
JUNIO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	05/07/2015 - 09:05 PM
MAYO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	08/06/2015 - 11:38 AM
ABRIL 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	04/05/2015 - 09:23 AM
MARZO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	04/05/2015 - 09:22 AM
FEBRERO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Excelencia.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	04/05/2015 - 09:22 AM
ENERO 2015 1. Se realizó la actualización del Proyecto de Inversión de Excelencia.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	18/02/2015 - 11:41 AM

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>2- NACIONAL. Económico.</b> Retraso en pagos CAUSARÍA paralización de las obras	25/01/2017	Luis Fernando Cuji Llugna	30 %	80	24	0/1
<b>2- NACIONAL. * General.</b> Desintegración de redes académicas CAUSARÍA que no se cumpla con el plan de acompañamiento	25/01/2017	Luis Fernando Cuji Llugna	30 %	70	21	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2

## LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Equipo de trabajo Definido	4-Inicio de Trabajo	01/01/2013		01/01/2013		Sí	10.0
2	PLANEACIÓN: Dictamen de Prioridad Aprobada	3-Adjudicación	02/01/2013		02/01/2013		Sí	10.0
3	EJECUCIÓN: Avance Físico 2014	5-Entregables Intermedios	23/12/2014		23/12/2014		Sí	30.0
4	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	1.66
5	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	1.66



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
6	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/03/2015		30/03/2015		Sí	1.66
7	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	1.66
8	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/05/2015		30/05/2015		Sí	1.66
9	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	1.66
10	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/07/2015		30/07/2015		Sí	1.66
11	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/08/2015		30/08/2015		Sí	1.66
12	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	1.66
13	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/10/2015		30/10/2015		Sí	1.66
14	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	1.66
15	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/12/2015		30/12/2015		Sí	1.66
16	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/01/2016		30/01/2016		Sí	1.0
17	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2016		28/02/2016		Sí	1.0
18	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	01/03/2016		01/03/2016		Sí	1.0
19	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	17/03/2016		17/03/2016		Sí	0.5
20	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	29/04/2016		29/04/2016		Sí	0.5
21	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2016		30/04/2016		Sí	0.5
22	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	29/05/2016		29/05/2016		Sí	0.5
23	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/05/2016		30/05/2016		Sí	1.0
24	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2015		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/07/2016		30/07/2016		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/08/2016		30/08/2016		Sí	1.0
27	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	1.0
28	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/10/2016		30/10/2016		Sí	1.0
29	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	1.0
30	EJECUCIÓN: Actualización del Proyecto de Inversión realizado	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		30/12/2016		Sí	1.08
31	EJECUCIÓN: Definido el plan de acompañamiento a Redes 2017, realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.15
32	EJECUCIÓN: Informe de cumplimiento de plan de acompañamiento a redes 2016, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.29

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
33	EJECUCIÓN: Lineamientos de respuesta al acoso sexual en Pichincha, en el marco del plan de acompañamiento a redes, socializado	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.29
34	EJECUCIÓN: Lineamientos de respuesta al acoso sexual, en Provincias, en el marco del plan de acompañamiento a redes, socializado	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.29
35	EJECUCIÓN: Informe de avance de obra ESPE Santo Domingo, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.29
36	EJECUCIÓN: Informe de avance de obra de ESPOCH MACAS, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.29
37	EJECUCIÓN: Entregado al CES 1 programa de posgrado conjunto en producción alimentaria para aprobación, realizado	5-Entregables Intermedios	28/04/2017		28/04/2017		Sí	0.29
38	EJECUCIÓN: Finalizada infraestructura para aulas UFA ESPE Santo Domingo, realizado	5-Entregables Intermedios	28/04/2017		28/04/2017		Sí	0.29
39	EJECUCIÓN: Finalizada área remodelada ESPOCH Macas, realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	0.29
40	EJECUCIÓN: Propuesta de programa de posgrado conjunto, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	0.29
41	EJECUCIÓN: Primer borrador de ponencias sobre educación superior y género para publicación, en el marco del plan de acompañamiento a redes, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.29
42	EJECUCIÓN: Reapertura extensión Macas de la ESPOCH, realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.29
43	EJECUCIÓN: Elaborada versión final de ponencias sobre educación superior y género para publicación, en el marco del plan de acompañamiento a redes, realizada	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		31/07/2017		Sí	0.29
44	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento al convenio ESPE - SENESCYT, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		31/07/2017		Sí	0.29
45	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento al convenio ESPOCH - SENESCYT, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		31/08/2017		Sí	0.29
46	EJECUCIÓN: Plan de fortalecimiento de buenas prácticas, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		31/08/2017		Sí	0.29
47	EJECUCIÓN: Ejecutada primera actividad de fortalecimiento de buenas prácticas, realizado	5-Entregables Intermedios	29/09/2017		29/09/2017		Sí	0.29

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
48	EJECUCIÓN: Ejecutada segunda actividad de fortalecimiento de buenas prácticas, realizado	5-Entregables Intermedios	29/09/2017		29/09/2017		Sí	0.29
49	EJECUCIÓN: Diseñada campaña contra la violencia a la mujer en el marco del acompañamiento a Redes, realizada	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		31/10/2017		Sí	0.29
50	EJECUCIÓN: Revisada y aprobada propuesta de programa de posgrado conjunto, realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		31/10/2017		Sí	0.29
51	EJECUCIÓN: Implementada campaña contra la violencia a la mujer en el marco del acompañamiento a Redes, realizado	5-Entregables Intermedios	20/11/2017	20/11/2017			No	0.3
52	EJECUCIÓN: Implementado posgrado investigativo conjunto, realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2017	30/11/2017			No	0.3
53	EJECUCIÓN: Liquidado convenio ESPE- SENESCYT, realizado	5-Entregables Intermedios	29/12/2017	29/12/2017			No	0.15
54	EJECUCIÓN: Liquidado convenio ESPOCH - SENESCYT, realizado	5-Entregables Intermedios	29/12/2017	29/12/2017			No	0.3
55	EJECUCIÓN: Definido el plan de acompañamiento a Redes 2017, realizado	5-Entregables Intermedios	30/12/2017	30/12/2017			No	0.29
56	CIERRE: Informe de Cierre	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2017	31/12/2017			No	10.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de planes de acompañamiento ejecutados		-	-	-	01/01/2017	-
2	Número de actividades para fortalecimiento de buenas prácticas		100.00 %	2	2	01/01/2017	Ene-Jun


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	6,088,366.59 **
Costo Total:	65,420,690.00
Total Devengado:	6,062,220.94
% Costo Total Devengado:	9.27 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 9.27 %

**Perfil Económico 2017**

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
<b>Ppto. Planeado</b>	7,813,779.30	63,009.60	0.00	<b>7,876,788.90</b>
<b>Ppto. Externo Planeado</b>	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Ppto. Aprobado Inicial</b>	7,333,451.46	121,536.16	0.00	<b>7,454,987.62</b>
<b>Ppto. Codificado</b>	6,323,655.85	65,953.06	0.00	<b>6,389,608.91</b>
<b>Ppto. Comprometido</b>	6,180,501.30	39,807.41	0.00	<b>6,220,308.71</b>
<b>Planeado - Codificado (2017)</b>		-2,943.46		
<b>Programado a Devengar</b>	7,743,023.88	65,953.06	0.00	<b>7,808,976.94</b>
<b>Ppto. Devengado</b>	6,022,413.53	39,807.41	0.00	<b>6,062,220.94</b>
<b>Estimado a fin de año</b>	* 6,022,413.53	0.00	0.00	<b>6,022,413.53</b>
<b>Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)</b>	1,720,610.35	65,953.06	0.00	<b>1,786,563.41</b>
<b>% de Programado a Devengar vs. Devengado</b>	* 77.78 %	60.36 %	0.00 %	<b>77.63 %</b>
<b>Ppto. Codificado 998</b>	37,500.00	0.00	0.00	<b>37,500.00</b>
<b>Ppto. Devengado 998</b>	37,500.00	0.00	0.00	<b>37,500.00</b>

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017**

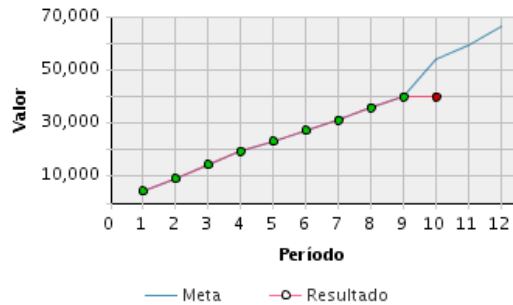

**Presupuesto Mensual 2017**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	4,449.62	4,449.62	4,449.62	4,449.62	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	6.75 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	4,783.79	4,783.79	9,233.41	9,233.41	100.00 %		14.00 %
Mar	5,188.28	5,188.28	14,421.69	14,421.69	100.00 %		21.87 %
Abr	4,919.91	4,919.91	19,341.60	19,341.60	100.00 %		29.33 %
May	3,891.81	3,891.81	23,233.41	23,233.41	100.00 %		35.23 %
Jun	3,956.00	3,956.00	27,189.41	27,189.41	100.00 %		41.23 %
Jul	3,956.00	3,956.00	31,145.41	31,145.41	100.00 %		47.22 %
Ago	4,706.00	4,706.00	35,851.41	35,851.41	100.00 %		54.36 %
Sep	3,956.00	3,956.00	39,807.41	39,807.41	100.00 %		60.36 %
Oct	14,116.51	0.00	53,923.92	39,807.41	73.82 %		60.36 %
Nov	5,510.21		59,434.13				
Dic	6,518.93		65,953.06				
<b>Total</b>	<b>65,953.06</b>	<b>39,807.41</b>					

## OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
18	Incrementar la calidad y pertinencia de la oferta académica de posgrado nacional e internacional, MEDIANTE la elaboración de insumos técnicos que aporten a la construcción de política pública.
19	Incrementar la gestión de la Dirección de Registro de Títulos, MEDIANTE la elaboración de informes técnicos - jurídicos para otras áreas de la Secretaría y respuestas sobre títulos extranjeros a ciudadanos e instituciones
20	Incrementar la gestión de la Dirección de Grado MEDIANTE lineamientos de apoyo e informes técnicos al organismo de derecho público encargado de la planificación y regulación del funcionamiento de las entidades del Sistema de Educación Superior en lo relacionado a la formación académica y profesional de grado
21	Incrementar la gestión de la política pública para la formación académica y profesional de Grado, Mediante la elaboración de insumos técnicos para otras áreas de la Secretaría Instituciones de Educación Superior y ciudadanos en general
22	Incrementar la gestión de la política pública relacionada a las exenciones aduaneras Mediante la elaboración de informes técnicos previo requerimiento de las instituciones de educación superior.
23	Reducir el tiempo de respuesta a las solicitudes de reconocimiento y registro de títulos extranjeros y nacionales respectivamente, MEDIANTE la optimización del uso de recursos y herramientas de la dirección.

Objetivos Operativos Matriciales	
SENESCYT - Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación >Coordinación General de Planificación	
5	Incrementar la eficiencia de la gestión de la planificación institucional MEDIANTE la aplicación de metodologías y herramientas para la generación de planes, programas, proyectos de inversión y desconcentración territorial.
7	Incrementar la eficacia del seguimiento a planes, programas y proyectos MEDIANTE la aplicación de metodologías y herramientas de análisis de resultados para la generación de informes y respuestas a pedidos de información.

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		E4.pdf	06/07/2017
2	A1. Reporte e-SIGEF Enero 2015	A1.pdf	30/03/2015
3	A2. Reporte e-SIGEF febrero 2015	A2.pdf	30/03/2015
4	A3. Reporte e-SIGEF Marzo 2015	A3.pdf	30/03/2015
5	A4. Reporte e-SIGEF Abril 2015	A4.pdf	30/04/2015
6	A5. Reporte e-SIGEF Mayo 2015	A5.pdf	05/06/2015
7	A6. Reporte e-SIGEF JUNIO 2015	A6.pdf	20/02/2016
8	A7. Reporte e-SIGEF JULIO 2015	A7.pdf	20/02/2016

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
9	A8. Reporte e-SIGEF AGOSTO 2015	A8.pdf	20/02/2016
10	A9. Reporte e-SIGEF SEPTIEMBRE 2015	A9.pdf	20/02/2016
11	Asociación hito 47. Ejecutada primera actividad de fortalecimiento de buenas prácticas, elaborada	F4.pdf	07/11/2017
12	Asociación Hito 48. Ejecutada segunda actividad de fortalecimiento de buenas prácticas, elaborada	F5.pdf	07/11/2017
13	B1. Reporte e-SIGEF OCTUBRE 2015	B1.pdf	20/02/2016
14	B2. Reporte e-SIGEF NOVIEMBRE 2015	B2.pdf	20/02/2016
15	B3. Reporte e-SIGEF DICIEMBRE 2015	B3.pdf	20/02/2016
16	B4. Reporte e-SIGEF ENERO 2016	B4.pdf	20/02/2016
17	B5. Reporte e-SIGEF FEBRERO 2016	B5.pdf	02/03/2016
18	B6. Reporte e-SIGEF MARZO 2016	B6.pdf	04/04/2016
19	B7. Reporte e-SIGEF ABRIL 2016	B7.pdf	03/05/2016
20	B8. Reporte e-SIGEF MAYO 2016	B8.pdf	03/06/2016
21	B9. Reporte e-SIGEF JUNIO 2016	B9.pdf	04/07/2016
22	C1. Reporte e-SIGEF JULIO 2016	C1.pdf	08/08/2016
23	C2. Reporte e-SIGEF Agosto 2016	C2.pdf	06/09/2016
24	C3. Reporte e-SIGEF Septiembre 2016	C3.pdf	05/10/2016
25	C4. Reporte e-SIGEF Octubre 2016	C4.pdf	09/11/2016
26	C5. Reporte e-SIGEF Noviembre 2016	C5.pdf	12/12/2016
27	C6. Asociación hito 31. Plan de Acompañamiento Redes 2017	C6.pdf	06/02/2017
28	C7. Asociación Hito 32. Informe de seguimiento Plan Acompañamiento Redes 2016	C7.pdf	06/02/2017
29	C8. Reporte e-SIGEF Enero 2017	C8.pdf	01/03/2017
30	C9. Reporte e-SIGEF Febrero 2017	C9.pdf	01/03/2017
31	D1. ASOCIACIÓN HITO 33: Lineamientos de respuesta al acoso sexual, socializado	C10.pdf	08/03/2017
32	D2. ASOCIACIÓN HITO 34: Lineamientos de respuesta al acoso sexual, en Provincias, en el marco del plan de acompañamiento a redes, socializado	C11.pdf	08/03/2017
33	D3. Asociación Hito 35: Informe de avance de obra ESPE Santo Domingo elaborado	D3.pdf	03/04/2017
34	D4. Asociación Hito 36: Informe de avance de obra ESPOCH Macas, elaborado	D4.pdf	03/04/2017
35	D5. Reporte e-SIGEF Marzo 2017	D5.pdf	11/04/2017
36	D6. Reporte e-SIGEF Abril 2017	D6.pdf	02/05/2017
37	D7 Asociación hito 37 Entregado al CES 1 programa de posgrado conjunto en producción alimentaria para aprobación, realizado	D7.pdf	05/05/2017
38	D8 Asociación Hito 38 Finalizada infraestructura para aulas UFA ESPE Santo Domingo, realizado	D8.pdf	05/05/2017
39	D9. Reporte e-SIGEF Mayo 2017	D9.pdf	05/06/2017
40	E1. Asociación Hito 39. Finalizada área remodelada ESPOCH Macas	E1.pdf	06/06/2017
41	E2. Asociación Hito 40. Propuesta de programa de posgrado conjunto	E2.pdf	06/06/2017
42	E3 Reporte eSIGEF Junio 2017	E3.pdf	05/07/2017
43	E4. Asociación hito 41. Primer borrador de ponencias sobre educación superior y género para publicación, en el marco del plan de acompañamiento a redes, elaborado	E4.pdf	06/07/2017

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
44	E5. Asociación Hito 42 Reapertura extensión Macas de la ESPOCH, realizado	E5.pdf	06/07/2017
45	E6 Reporte e-SIGEF Julio 2017	E6.pdf	04/08/2017
46	E6. Asociación Hito 43 Elaborada versión final de ponencias sobre educación superior y género para publicación, en el marco del plan de acompañamiento a redes, realizada	E6.pdf	04/08/2017
47	E7. Asociación hito 44. Informe de seguimiento al convenio ESPE - SENESCYT, elaborado	E7.pdf	04/08/2017
48	E9. Asociación hito 45. Informe de seguimiento al convenio ESPOCH SENESCYT, ELABORADO	E9.pdf	07/09/2017
49	F1. Asociación hito 46. Plan de Fortalecimiento de Buenas Prácticas	F1.pdf	07/09/2017
50	F2 Reporte e-SIGEF agosto 2017	F2.pdf	14/09/2017
51	F3 Reporte e-SIGEF Septiembre 2017	F3.pdf	03/10/2017
52	F4. Asociación Hito 47	F4.pdf	07/11/2017
53	F5. Asociación Hito 48	F5.pdf	07/11/2017
54	F6. Asociación Hito 49.	F4.pdf	07/11/2017
55	F7. Asociación hito 50	F5.pdf	07/11/2017

### EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Cuji Llugna, Luis Fernando	Subsecretario de Formación Académica y Profesional	Subsecretario de Formación Académica	lcuji@senescyt.gob.ec	2505660
Espinoza Castro, Silvia Valeria	Líder del Proyecto	Subsecretario de Formación Académica	sespinoza@senescyt.gob.ec	2505660
