

SENESCYT - Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Coordinación General de Planificación

PROYECTO: K003 PLAN DE CONTINGENCIA

Líder del Proyecto:	Ramírez Gallegos, René Alberto		
Patrocinador Ejecutivo:	Bonilla Soria, Xavier Adrian	Programas Relacionados:	PLAN DE CONTINGENCIA
Titular:	Fierro León, Daniel Eduardo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	13.00 %
Objetivos Operativos:	7	VAN:	27,395,096.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	17,023,757.09
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2012 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	16/11/2017	Fecha de Fin Base:	31/12/2014
Modificado por:	Rocha Vaca, Gladys Verónica	Fecha del siguiente Hito:	30/11/2017


DATOS GENERALES

Descripción
Garantizar el derecho a continuar los estudios regulares de las y los estudiantes de las universidades y escuelas politécnicas ubicadas en la categoría e que fueron suspendidas definitivamente por el ceaces. Las ies suspendidas contaban a la fecha de suspensión con 38,108 estudiantes inscritos. Se aspira obtener una tasa de titulación del 80% de los estudiantes que culminan sus estudios en la propia institución de origen, y una tasa de 40.5% de titulación en el caso de los estudiantes que se encuentran en niveles intermedios.
Beneficios Cualitativos
Informacion en proceso de actualización
Tipo de Beneficiario
Estudiantes de universidades cerradas
Restricciones
Universidades cerradas

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 98.59 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2012 Fecha de Fin: 31/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

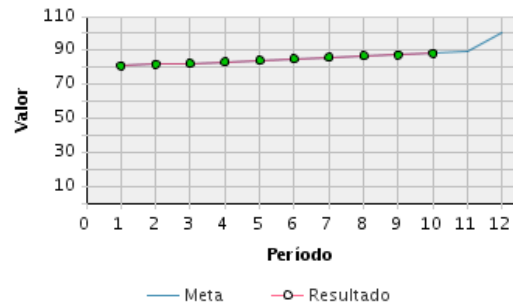

Porcentaje de Avance

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	81 %	82 %	82 %	83 %	84 %	85 %	86 %	87 %	87 %	88 %	89 %	100 %
	Avance real acumulado											
	81 %	82 %	82 %	83 %	84 %	85 %	86 %	87 %	87 %	88 %		

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE 2017:</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.</p>	Rocha Vaca, Gladys Verónica	07/11/2017 - 09:55 AM
<p>SEPTIEMBRE 2017:</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.</p>	Martínez Chevez, Mayra Elizabeth	03/10/2017 - 09:47 AM
<p>AGOSTO 2017:</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	14/09/2017 - 02:57 PM
<p>JULIO 2017:</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.</p>	Martínez Chevez, Mayra Elizabeth	04/08/2017 - 09:54 AM
<p>JUNIO 2017:</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	13/07/2017 - 09:10 AM
<p>MAYO 2017:</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	09/06/2017 - 02:42 PM
<p>ABRIL 2017:</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.</p>	Martínez Chevez, Mayra Elizabeth	09/05/2017 - 09:33 AM
<p>MARZO 2017:</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	07/04/2017 - 03:51 PM
<p>FEBRERO 2017</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	08/03/2017 - 05:06 PM
<p>ENERO 2017</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	10/02/2017 - 04:22 PM
<p>DICIEMBRE 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	10/01/2017 - 12:17 PM
<p>NOVIEMBRE 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	08/12/2016 - 12:40 PM
<p>OCTUBRE 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	11/11/2016 - 04:59 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	05/10/2016 - 04:18 PM
<p>AGOSTO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	02/09/2016 - 09:02 AM
<p>JULIO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.</p> <p>2. Se realizaron transferencias por 1.032.390,00 USD.</p> <p>Universidad Central del Ecuador 697.731,00 USD</p> <p>Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 52.714,00 USD</p> <p>Universidad Técnica de Ambato 60.915,00 USD</p> <p>Universidad Técnica de Manabí 221.030,00 USD</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	28/07/2016 - 10:54 AM
<p>JUNIO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	04/07/2016 - 11:56 AM
<p>MAYO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	03/06/2016 - 10:54 AM
<p>ABRIL 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	03/05/2016 - 10:17 AM
<p>MARZO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.</p>	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	04/04/2016 - 04:44 PM
<p>FEBRERO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.</p>	Gordillo Salinas, Mario Andrés	02/03/2016 - 09:11 AM
<p>ENERO 2016</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.</p>	Gordillo Salinas, Mario Andrés	05/02/2016 - 05:28 PM
<p>DICIEMBRE 2015</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.</p>	Gordillo Salinas, Mario Andrés	05/02/2016 - 05:27 PM
<p>NOVIEMBRE 2015</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.</p>	Gordillo Salinas, Mario Andrés	07/12/2015 - 10:04 AM
<p>OCTUBRE 2015</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.</p>	Gordillo Salinas, Mario Andrés	10/11/2015 - 10:23 AM
<p>SEPTIEMBRE 2015</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.</p>	Gordillo Salinas, Mario Andrés	05/10/2015 - 05:12 PM
<p>AGOSTO 2015</p> <p>1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.</p>	Gordillo Salinas, Mario Andrés	10/09/2015 - 05:08 PM
<p>JULIO 2015</p>	Gordillo Salinas, Mario Andrés	10/09/2015 - 05:04 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.		
JUNIO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	05/07/2015 - 09:04 PM
MAYO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	08/06/2015 - 11:37 AM
ABRIL 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	04/05/2015 - 09:26 AM
MARZO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	04/05/2015 - 09:26 AM
FEBRERO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión Plan de Contingencia.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	04/05/2015 - 09:25 AM
ENERO 2015 1. Se actualizó el proyecto de inversión de Plan de Contingencia	Gordillo Salinas, Mario Andrés	18/02/2015 - 11:42 AM

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Equipo de trabajo Definido	4-Inicio de Trabajo	17/12/2014		17/12/2014		Sí	10.0
2	PLANEACIÓN: Dictamen de Prioridad Aprobada	3-Adjudicación	19/12/2014		19/12/2014		Sí	10.0
3	EJECUCIÓN: Avance Físico 2014	5-Entregables Intermedios	23/12/2014		23/12/2014		Sí	20.0
4	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	1.66
5	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	1.66
6	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	30/03/2015		30/03/2015		Sí	1.66
7	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	1.66
8	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2015		31/05/2015		Sí	1.66
9	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	1.66
10	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2015		31/07/2015		Sí	1.66
11	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	30/08/2015		30/08/2015		Sí	1.66
12	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	1.66
13	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/10/2015		Sí	1.66

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
14	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	3.4
15	EJECUCIÓN: Avance Físico 2016	5-Entregables Intermedios	31/01/2016		31/01/2016		Sí	1.67
16	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	29/02/2016		29/02/2016		Sí	1.67
17	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2016		31/03/2016		Sí	1.67
18	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2016		30/04/2016		Sí	1.67
19	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		31/05/2016		Sí	1.67
20	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	1.67
21	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2016		31/07/2016		Sí	1.67
22	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	1.67
23	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	1.66
24	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	1.66
25	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	1.66
26	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2016		31/12/2016		Sí	1.66
27	EJECUCIÓN: Avance Físico 2017	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.83
28	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.83
29	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.83
30	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	28/04/2017		28/04/2017		Sí	0.83
31	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	0.83
32	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.83
33	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		31/07/2017		Sí	0.83
34	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		31/08/2017		Sí	0.83
35	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	29/09/2017		29/09/2017		Sí	0.84
36	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		31/10/2017		Sí	0.84
37	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2017	30/11/2017			No	0.84
38	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	29/12/2017	29/12/2017			No	0.84
39	CIERRE: Informe de Cierre	5-Entregables Intermedios	31/12/2017	31/12/2017			No	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	784,384.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	17,023,757.09 **
Costo Total:	59,933,838.00
Total Devengado:	16,483,441.00
% Costo Total Devengado:	27.50 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 27.50 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	14,194,239.70	0.00	0.00	14,194,239.70
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	15,122,293.70	194,320.00	0.00	15,316,613.70
Ppto. Codificado	18,481,347.00	543,259.61	0.00	19,024,606.61
Ppto. Comprometido	16,483,441.00	0.00	0.00	16,483,441.00
Planeado - Codificado (2017)		-543,259.61		
Programado a Devengar	18,029,560.70	540,316.09	0.00	18,569,876.79
Ppto. Devengado	16,483,441.00	0.00	0.00	16,483,441.00
Estimado a fin de año	* 16,483,441.00	0.00	0.00	16,483,441.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,546,119.70	540,316.09	0.00	2,086,435.79
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 91.42 %	0.00 %	0.00 %	88.76 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017

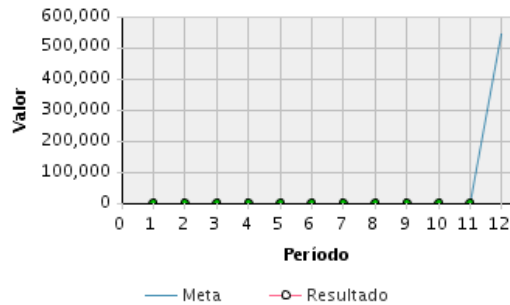

Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Oct	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Nov	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Dic	540,316.09		540,316.09				
Total	540,316.09	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
5	Incrementar la eficiencia de la gestión de la planificación institucional MEDIANTE la aplicación de metodologías y herramientas para la generación de planes, programas, proyectos de inversión y desconcentración territorial.
7	Incrementar la eficacia del seguimiento a planes, programas y proyectos MEDIANTE la aplicación de metodologías y herramientas de análisis de resultados para la generación de informes y respuestas a pedidos de información.
11	Incrementar la gestión del relacionamiento internacional con miras a obtener una cooperación y una agenda internacional estratégica para la obtención de resultados y beneficios tangibles enfocados a fortalecer y complementar las iniciativas y programas impulsados por la Secretaría, posicionando a la vez la política pública institucional MEDIANTE la identificación de oportunidades de cooperación disponibles para el sector del conocimiento; la priorización y categorización de la pertinencia de participación en los diferentes eventos internacionales y además ejecutando, promocionando y dando seguimiento a los documentos de cooperación internacional.
12	Incrementar la efectividad de la planificación institucional MEDIANTE la correcta utilización de instrumentos técnicos
13	Incrementar el avance del plan para la implementación del modelo de gestión de procesos, MEDIANTE herramientas técnicas de mejora continua que generen productos y servicios que respondan a las necesidades de la ciudadanía.
17	Incrementar la gestión del cambio e innovación de la cultura organizacional MEDIANTE la formación equipos de trabajos empoderados, servicios, procesos, programas y proyectos que contribuyan a los resultados propuestos por la organización.
18	Incrementar la provisión de información relevante, oportuna y veraz a la ciudadanía sobre los servicios prestados por la institución MEDIANTE la implementación de herramientas metodológicas que eleven los estándares de calidad y calidez

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1. Reporte e-SIGEF Enero 2015	A1.pdf	30/03/2015
2	A2. Reporte e-SIGEF febrero 2015	A2.pdf	30/03/2015
3	A3. Reporte e-SIGEF Marzo 2015	A3.pdf	30/03/2015
4	A4. Reporte e-sigef mes de Abril 2015	A4.pdf	30/04/2015
5	A5. Reporte e-sigef mes de Mayo 2015	A5.pdf	05/06/2015
6	A6. Reporte e-sigef mes de Junio 2015	A6.pdf	20/02/2016
7	A7. Reporte e-SIGEF JULIO 2015	A7.pdf	20/02/2016
8	A8. Reporte e-SIGEF AGOSTO 2015	A8.pdf	20/02/2016
9	A9. Reporte e-SIGEF SEPTIEMBRE 2015	A9.pdf	20/02/2016
10	B1. Reporte e-SIGEF Octubre 2015	B1.pdf	20/02/2016
11	B2. Reporte e-SIGEF NOVIEMBRE 2015	B2.pdf	20/02/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
12	B3. Reporte e-SIGEF DICIEMBRE 2015	B3.pdf	20/02/2016
13	B4. Reporte e-SIGEF ENERO 2016	B4.pdf	20/02/2016
14	B5. Reporte e-SIGEF FEBRERO 2016	B5.pdf	02/03/2016
15	B6. Reporte e-SIGEF MARZO 2016	B6.pdf	04/04/2016
16	B7. Reporte e-SIGEF ABRIL 2016	B7.pdf	03/05/2016
17	B8. Reporte e-SIGEF Mayo 2016	B8.pdf	03/06/2016
18	B9. Reporte e-SIGEF Junio 2016	B9.pdf	04/07/2016
19	C1. Reporte e-SIGEF Julio 2016	C1.pdf	08/08/2016
20	C2. Reporte e-SIGEF Agosto 2016	C2.pdf	06/09/2016
21	C3. Reporte e-SIGEF Septiembre 2016	C3.pdf	05/10/2016
22	C4. Reporte e-SIGEF Octubre 2016	C4.pdf	09/11/2016
23	C5. Reporte e-SIGEF Noviembre 2016	C5.pdf	12/12/2016
24	C6. Reporte e-SIGEF Enero 2017	C6.pdf	09/03/2017
25	C7. Reporte e-SIGEF Febrero 2017	C7.pdf	09/03/2017
26	C8. Reporte e-SIGEF Marzo 2017	C8.pdf	11/04/2017
27	C9. Reporte e-SIGEF Abril 2017	C9.pdf	02/05/2017
28	D1. Reporte e-SIGEF Mayo2017	D1.pdf	05/06/2017
29	D2 Reporte e-SIGEF Junio 2017	D2.pdf	05/07/2017
30	D3 Reporte e-SIGEF Julio 2017	D3.pdf	04/08/2017
31	D4 Reporte e-SIGEF agosto 2017	D4.pdf	14/09/2017
32	D5 Reporte e-SIGEF Septiembre 2017	D5.pdf	03/10/2017

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Fierro León, Daniel Eduardo	Coordinador General de Planificación	Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica	dfierro@senescyt.gob.e c	2505660
