

SENESCYT - Secretaría Nacional De Educación Superior, Ciencia, Tecnología E Innovación
PROMETEO

PROYECTO: K002 SENESCYT - BECAS PROMETEO

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Líder del Proyecto: | Coronel Zuñiga, Cristian Ricardo (ccoronel@senescyt.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Pazos Padilla, Rina Catalina | Programas Relacionados: | BECAS PROMETEO, Provincia - Azuay, Provincia - Bolivar, Provincia - Carchi, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Napo, Provincia - Orellana, Provincia - Pastaza, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Sucumbíos, Provincia - Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe |
| Titular: | Coronel Zuñiga, Cristian Ricardo | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Brainware - Talento Humano | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 091590000.0000.375757 | TIR: | 12.00 % |
| Objetivos Operativos: | 1 | VAN: | 2,056,698.81 |
| Viabilidad Técnica: | Media | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 44,070,736.73 |
| Localidad de Gestión: | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 31/07/2013 - 31/12/2017 |
| Fecha de última actualización: | 31/03/2015 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2017 |
| Modificado por: | Páez Echeverría, Viviana Priscila | Fecha del siguiente Hito: | 30/04/2015 |

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El Proyecto Prometeo está dirigido a universidades y escuelas politécnicas, tanto públicas como cofinanciadas; institutos públicos de investigación; institutos técnicos y tecnológicos, de artes, música y pedagogía; entidades y organismos del sector público en general y sectores productivos priorizados de todo el país. Bajo este lineamiento, los expertos de alto nivel aportarán con sus actividades de investigación, docencia y transferencia de conocimientos en temas especializados

PRODUCTO: Transferencia de conocimiento

LÍNEA BASE: De acuerdo al PNBV, la educación debe ser fortalecida desde una perspectiva estratégica, en este sentido el estado cumple con un rol fundamental ya que garantiza que éstas se cumplan a través de la generación de políticas. Con estos antecedentes, se implementó el Proyecto Prometeo el cual tiene como meta para el año 2017 la incorporación de 5000 investigadores/docentes de alto nivel en diferentes áreas estratégicas

OBJETIVO GENERAL: Incrementar las capacidades de conocimiento de las universidades y escuelas politécnicas, institutos públicos de investigación, institutos técnicos y tecnológicos, entidades y organismos del sector público en general en temas de investigación científica, docencia, innovación, desarrollo tecnológico y social en las áreas estratégicas del desarrollo nacional y regional, así como en los sectores productivos priorizados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Búsqueda e identificación de prometeos de acuerdo al levantamiento de necesidades con las instituciones beneficiarias.


DATOS GENERALES

| |
|---|
| Descripción |
| <p>2. Otorgar becas a expertos de alto nivel, nacionales y extranjeros, residentes en el exterior, universidades y escuelas politécnicas, tanto públicas como cofinanciadas, institutos públicos de investigación, institutos técnicos y tecnológicos, entidades y organismos del sector público en general y sectores productivos priorizados de todo el país que determine el Secretario Nacional de la Senescyt para el desarrollo de proyectos de investigación, transferencia de conocimientos en temas especializados, y docencia.</p> <p>3. Automatizar la evaluación y selección de los postulantes a "Prometeos" que respondan a las necesidades de las instituciones beneficiarias del Proyecto, que se conocerán como "instituciones de acogida y seguimiento a las actividades realizadas por los expertos de alto nivel.</p> |
| Beneficios Cualitativos |
| <p>El proyecto contribuye a transformar el patrón de especialización nacional actual, caracterizada por ser extractivista y exportador de commodities, por uno conducente hacia la producción de bienes y servicios ricos en innovación y conocimiento, con alto valor agregado en los cuales el país obtenga ventajas comparativas.</p> <p>Con este fin, el proyecto promueve el fortalecimiento de las capacidades de investigación de los IPIS, IES e Instituciones Públicas y de formación de investigadores, docentes investigadores y estudiantes a través de la incorporación de investigadores de alto nivel residentes en el exterior.</p> |
| Tipo de Beneficiario |
| <p>Universidades y escuelas politécnicas públicas, institutos de investigación, instituciones públicas en general vinculados a la investigación en general, a la innovación y al desarrollo tecnológico, y a la consecución de los objetivos constitucionales y del Plan Nacional de Buen Vivir.</p> <p>Estudiantes, Docentes, Investigadores técnicos.</p> |
| Restricciones |
| <p>TIEMPO: Ejecución del proyecto desde julio 2013 hasta el 2017</p> <p>COSTO: \$ 260.257.621,51</p> <p>ALCANCE: Nacional</p> <p>RECURSOS: Humanos, materiales y equipos que son limitados por el presupuesto.</p> |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | Ejecución | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 37.71 %
 Fecha de Inicio: 31/07/2013 Fecha de Fin: 31/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

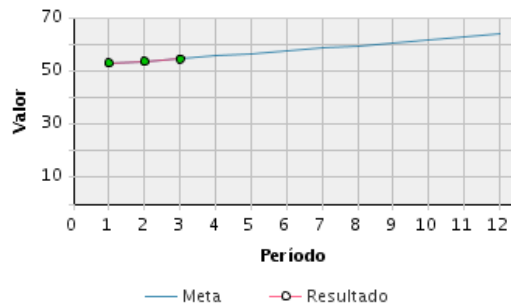

| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2015 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 53 % | 54 % | 55 % | 56 % | 56 % | 57 % | 58 % | 60 % | 60 % | 62 % | 62 % | 64 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 53 % | 54 % | 55 % | | | | | | | | | |
| Estado | | | | | | | | | | | | |
| | ● | ● | ● | | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| <p>FEBRERO 2015</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 242 aplicaciones, de las cuales 96 fueron pre-seleccionadas. 6484 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de enero (Hito relacionado 41). Nº de prometeos aprobados en comité de febrero (Hito relacionado 42). Se vincularon 52 Prometeos en el mes de febrero No se realizaron transferencias en el mes de febrero | Castillo Campos, Linda Lesly | 04/03/2015 - 07:24 PM |
| <p>FEBRERO 2015</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 242 aplicaciones, de las cuales 96 fueron pre-seleccionadas. 6484 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de enero (Hito relacionado 41). Se vincularon 52 Prometeos en el mes de febrero No se realizaron transferencias en el mes de febrero | Castillo Campos, Linda Lesly | 04/03/2015 - 05:25 PM |
| <p>ENERO 2015</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 248 aplicaciones, de las cuales 95 fueron pre-seleccionadas. 14000 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de diciembre (Hito relacionado 38). Se coloca el análisis de número de Prometeos vinculados y finalizados por mes (Hito relacionado 39) Se coloca el análisis de restricciones a aplicarse en los beneficios de Prometeos en el 2015 Se vincularon 2 Prometeos en el mes de enero No se realizaron transferencias en el mes de enero. | Castillo Campos, Linda Lesly | 06/02/2015 - 02:10 PM |
| <p>DICIEMBRE 2014</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 216 aplicaciones, de las cuales 93 fueron pre-seleccionadas. 8672 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de noviembre (Hito relacionado 36). Se aprobaron 2 Prometeos en el Comité ejecutado el 4 de diciembre de 2014 Y 16 Prometeos en el Comité ejecutado el 31 de diciembre de 2014 (Hito relacionado 37). Se cierran los riesgos registrados. No se realizaron transferencias en el mes de diciembre. | Castillo Campos, Linda Lesly | 06/01/2015 - 12:18 PM |
| <p>NOVIEMBRE 2014</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 298 aplicaciones, de las cuales 123 fueron pre-seleccionadas. 14928 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de octubre (Hito relacionado 33). Se realizaron 6706 Eventos para la transferencia de conocimientos de los expertos "Prometeos" en las instituciones de acogida, realizados. (Hito relacionado 34). Se aprobaron 12 Prometeos en el Comité ejecutado el 28 de noviembre de 2014 (Hito relacionado 35). En el mes de noviembre se vincularon a las instituciones de acogida 23 Prometeos. El Proyecto Prometeo es parte de Gobierno electrónico debido a que desde el 2013 posee una plataforma web de postulación para captar los perfiles de postulantes al Proyecto a nivel nacional. No se realizaron transferencias en el mes de noviembre | Castillo Campos, Linda Lesly | 02/12/2014 - 05:17 PM |
| <p>OCTUBRE 2014</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 180 aplicaciones, de las cuales 69 fueron pre-seleccionadas. 7423 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de SEPTIEMBRE (Hito relacionado 30). Se realizaron 15 eventos para difundir el Proyecto a Nivel internacional (Hito relacionado 31). Se aprobaron 35 Prometeos en el Comité ejecutado el 30 de octubre de 2014 (Hito relacionado 32). En el mes de octubre se vincularon a las instituciones de acogida 55 Prometeos. No se realizaron transferencias en el mes de octubre. | Castillo Campos, Linda Lesly | 04/11/2014 - 05:19 PM |
| <p>OCTUBRE 2014</p> | Castillo Campos, Linda Lesly | 04/11/2014 - 05:07 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 180 aplicaciones, de las cuales 69 fueron pre-seleccionadas. 7423 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de SEPTIEMBRE (Hito relacionado 32). Se aprobaron 35 Prometeos en el Comité ejecutado el 30 de octubre de 2014 (Hito relacionado 30). En el mes de octubre se vincularon a las instituciones de acogida 55 Prometeos. No se realizaron transferencias en el mes de octubre. | | |
| <p>SEPTIEMBRE 2014</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 306 aplicaciones, de las cuales 141 fueron pre-seleccionadas. 8465 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de AGOSTO (Hito relacionado 28). Se aprobaron 28 Prometeos en el Comité ejecutado el 26 de septiembre de 2014 (Hito relacionado 29). En el mes de septiembre se vincularon a las instituciones de acogida 61 Prometeos. No se realizaron transferencias en el mes de septiembre. | Castillo Campos, Linda Lesly | 02/10/2014 - 11:29 AM |
| <p>Resúmenes Ejecutivos (Más recientes) Modificado por Fecha de Última Actualización septiembre 2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 306 aplicaciones, de las cuales 141 fueron pre-seleccionadas. 8465 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de AGOSTO (Hito relacionado 28). Se aprobaron 28 Prometeos en el Comité ejecutado el 26 de septiembre de 2014 (Hito relacionado 29). En el mes de septiembre se vincularon a las instituciones de acogida 61 Prometeos. No se realizaron transferencias en el mes de septiembre. | Castillo Campos, Linda Lesly | 02/10/2014 - 10:32 AM |
| <p>AGOSTO 2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 297 aplicaciones, de las cuales 129 fueron pre-seleccionadas. 10525 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de julio (Hito relacionado 26). Se aprobaron 28 Prometeos en el Comité ejecutado el 26 de agosto de 2014 (Hito relacionado 27). En el mes de agosto se vincularon a las instituciones de acogida 58 Prometeos. No se realizaron transferencias en el mes de agosto. | Castillo Campos, Linda Lesly | 04/09/2014 - 04:00 PM |
| <p>JULIO 2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 546 aplicaciones, de las cuales 264 fueron pre-seleccionadas. 10918 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes, en el mes de junio (Hito relacionado 24). Se aprobaron 37 Prometeos en el Comité ejecutado el 25 de julio de 2014 (Hito relacionado 25). En el mes de julio se vincularon a las instituciones de acogida 48 Prometeos. No se realizaron transferencias en el mes de julio. | Solano, María José | 01/08/2014 - 12:32 PM |
| <p>JUNIO 2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 546 aplicaciones, de las cuales 264 fueron pre-seleccionadas. 10918 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes, en el mes de junio (Hito relacionado 24). Se aprobaron 37 Prometeos en el Comité ejecutado el 25 de julio de 2014 (Hito relacionado 25). En el mes de julio se vincularon a las instituciones de acogida 48 Prometeos. No se realizaron transferencias en el mes de julio. | Solano, María José | 01/08/2014 - 11:33 AM |
| <p>JUNIO 2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 342 aplicaciones, de las cuales 173 fueron pre-seleccionadas. 8422 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes, en el mes de mayo (Hito relacionado 21). | Solano, María José | 04/07/2014 - 03:40 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>3. Se ha solicitado la Automatización de todos los procesos del Proyecto Prometeo a en el Sistema de Postulación; actualmente se ha desarrollado la propuesta que ya fue presentada a las autoridades de SENESCYT, quedando a la espera de su validación. (Hito relacionado 22).</p> <p>4. Se aprobaron 49 Prometeos en el Comité ejecutado el 25 de junio de 2014 (Hito relacionado 23).</p> <p>5. En el mes de junio se vincularon a las instituciones de acogida 44 Prometeos.</p> <p>6. No se realizaron transferencias en el mes de junio.</p> | | |
| <p>MAYO 2014:</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 268 aplicaciones, de las cuales 131 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 8189 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de abril (Hito relacionado 19).</p> <p>3. Se aprobaron 66 Prometeos en el Comité ejecutado el 23 de mayo de 2014 (Hito relacionado 20).</p> <p>4. En el mes de mayo se vincularon a las instituciones de acogida 33 Prometeos.</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de mayo.</p> | Solano, María José | 05/06/2014 - 03:56 PM |
| <p>ABRIL 2014:</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 360 aplicaciones, de las cuales 158 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 5242 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de febrero (Hito relacionado 17).</p> <p>3. Se aprobaron 77 Prometeos en el Comité ejecutado el 25 y 30 de abril de 2014 (Hito relacionado 18).</p> <p>4. En el mes de abril se vincularon a las instituciones de acogida 30 Prometeos.</p> <p>5. Se implementó la descarga automática de formularios a través de nuestro portal oficial: prometeo.educacionsuperior.gob.ec/biblioteca</p> <p>6. No se realizaron transferencias en el mes de abril.</p> | Solano, María José | 05/05/2014 - 04:17 PM |
| <p>MARZO 2014:</p> <p>1. 6563 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de febrero (Hito relacionado 15).</p> <p>2. Se aprobaron 48 Prometeos en el Comité ejecutado el 21 de marzo de 2014 (Hito relacionado 16).</p> <p>3. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 167 aplicaciones, de las cuales 82 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>4. En el mes de marzo se vincularon a las instituciones de acogida 30 Prometeos.</p> <p>5. Se implementó la descarga automática de formularios a través de nuestro portal oficial: prometeo.educacionsuperior.gob.ec/biblioteca</p> <p>6. Participación del Proyecto Prometeo en la "IV Edición de la Feria Internacional de Opciones de Becas de Posgrado en Ciencia Tecnología e Innovación 2014" organizado por el MICITT de Costa Rica; con el objetivo de difundir el Proyecto y reclutar posibles Prometeos.</p> <p>7. No se realizaron transferencias en el mes de marzo.</p> | Solano, María José | 04/04/2014 - 05:21 PM |
| <p>FEBRERO 2014:</p> <p>-En el mes de enero se realizaron 2 Comités Ejecutivos del Proyecto Becas Prometeo en el que se aprobaron 39 postulantes, se procesaron 126 aplicaciones y se vincularon 46 Prometeos; adicionalmente el Proyecto ha concretado acuerdos de difusión con distintas instituciones nacionales e internacionales.</p> | Solano, María José | 05/03/2014 - 09:32 PM |
| <p>ENERO 2014:</p> <p>-En el mes de enero se realizaron 2 Comités Ejecutivos del Proyecto Becas Prometeo en el que se aprobaron 12 Prometeos y se procesaron 130 postulaciones.</p> <p>-Se procesaron 170 informes correspondientes a diciembre 2013.</p> | Solano, María José | 05/02/2014 - 05:36 PM |
| <p>DICIEMBRE 2013:</p> <p>-En el mes de diciembre se realizaron 3 Comités Ejecutivos del Proyecto Becas Prometeo y se procesaron 125 postulaciones.(HITO 11)</p> <p>-El sistema se encuentra en una etapa de estabilización y se están realizando pruebas y solventando los inconvenientes de los postulantes.</p> | Paredes del Castillo, Grace Paulina | 03/01/2014 - 08:31 PM |
| <p>NOVIEMBRE 2013:</p> | CADENA FUERTES, | 05/12/2013 - 12:01 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|----------------|-------------------------------|
| <p>-En el mes de noviembre se realizaron 3 Comités Ejecutivos del Proyecto Becas Prometeo y se procesaron 211 postulaciones.(HITO 11)</p> <p>-Con respecto la puesta en producción del sistema de Prometeo (R.I y PIC), los documentos ya se encuentran entregados. El sistema se encuentra en una etapa de estabilización, es decir se están realizando pruebas y solventando todos los inconvenientes de los postulantes.</p> <p>-El miércoles 20 de noviembre la Gerente del Proyecto Prometeo Gabriela Jaramillo fue entrevistada en Radio Centro por el comunicador Andrés López y el jueves 21 de noviembre fue entrevistada en Radio Quito por el comunicador Andrés Carrión; a través de dichas entrevistas se pudo difundir el proyecto.</p> | JOSÉ RUPERTO | |

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| | Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 1 | 5- PROYECTO. Recursos. Falta de recursos presupuestarios y de personal CAUSARÍA retraso en los tiempos esperados de los procesos y el cumplimiento de las metas establecidas | 06/03/2015 | Cristian Ricardo Coronel Zuñiga | 50 % | 80 | 40 | 0/2 |

Riesgos cerrados: 0

LOCALIDADES

| | Localidad de Impacto |
|----|--|
| 1 | Zona 1 - Norte > Carchi > Toda la Provincia del Carchi |
| 2 | Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas |
| 3 | Zona 1 - Norte > Imbabura > Toda la Provincia de Imbabura |
| 4 | Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios |
| 5 | Zona 2 - Centro Norte > Napo > Toda la Provincia de Napo |
| 6 | Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Toda la Provincia de Orellana |
| 7 | Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha |
| 8 | Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo |
| 9 | Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Toda la Provincia de Cotopaxi |
| 10 | Zona 3 - Centro > Pastaza > Toda la Provincia de Pastaza |
| 11 | Zona 3 - Centro > Tungurahua > Toda la Provincia de Tungurahua |
| 12 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí |
| 13 | Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Toda la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas |
| 14 | Zona 5 - Litoral > Bolívar > Toda la Provincia de Bolivar |
| 15 | Zona 5 - Litoral > Galápagos > Toda la Provincia de Galapagos |
| 16 | Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas |
| 17 | Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Toda la Provincia de Los Ríos |
| 18 | Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Toda la Provincia de Santa Elena |
| 19 | Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay |
| 20 | Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar |
| 21 | Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago |
| 22 | Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro |
| 23 | Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja |
| 24 | Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Toda la Provincia de Zamora Chinchipe |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | DEFINICIÓN y PLANIFICACIÓN: Dictamen de prioridad recibido / Equipo de planificación definido | 4-Inicio de Trabajo | 31/07/2013 | | 31/07/2013 | | Sí | 20.0 |
| 2 | EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución. | 5-Entregables Intermedios | 30/08/2013 | | 30/08/2013 | | Sí | 0.9 |
| 3 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas. | 5-Entregables Intermedios | 30/08/2013 | | 30/08/2013 | | Sí | 0.9 |
| 4 | EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2013 | | 30/09/2013 | | Sí | 0.9 |
| 5 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2013 | | 30/09/2013 | | Sí | 0.9 |
| 6 | EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2013 | | 31/10/2013 | | Sí | 0.9 |
| 7 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2013 | | 31/10/2013 | | Sí | 0.9 |
| 8 | EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2013 | | 30/11/2013 | | Sí | 0.9 |
| 9 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2013 | | 30/11/2013 | | Sí | 0.9 |
| 10 | EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2013 | | 31/12/2013 | | Sí | 0.9 |
| 11 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2013 | | 31/12/2013 | | Sí | 0.9 |
| 12 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en enero | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2014 | | 31/01/2014 | | Sí | 0.84 |
| 13 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de enero. | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2014 | | 28/02/2014 | | Sí | 1.68 |
| 14 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en febrero | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2014 | | 28/02/2014 | | Sí | 0.84 |
| 15 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2014 | | 31/03/2014 | | Sí | 0.84 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| | acogida, realizadas en el mes de febrero. | | | | | | | |
| 16 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en marzo | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2014 | | 31/03/2014 |  | Sí | 0.84 |
| 17 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de marzo. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2014 | | 30/04/2014 |  | Sí | 0.84 |
| 18 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en abril | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2014 | | 30/04/2014 |  | Sí | 0.84 |
| 19 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de abril. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2014 | | 31/05/2014 |  | Sí | 0.84 |
| 20 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en mayo | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2014 | | 31/05/2014 |  | Sí | 0.84 |
| 21 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de mayo. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2014 | | 30/06/2014 |  | Sí | 0.84 |
| 22 | EJECUCIÓN: Diseñar, implementar y administrar una herramienta de información, nacional e internacional, desarrollado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2014 | | 30/06/2014 |  | Sí | 0.84 |
| 23 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en junio | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2014 | | 30/06/2014 |  | Sí | 0.84 |
| 24 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de junio. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2014 | | 31/07/2014 |  | Sí | 0.84 |
| 25 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en julio | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2014 | | 31/07/2014 |  | Sí | 0.84 |
| 26 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2014 | | 29/08/2014 |  | Sí | 0.84 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| | realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio. | | | | | | | |
| 27 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en agosto | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2014 | | 29/08/2014 |  | Sí | 0.84 |
| 28 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de agosto. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2014 | | 30/09/2014 |  | Sí | 0.84 |
| 29 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en septiembre | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2014 | | 30/09/2014 |  | Sí | 0.84 |
| 30 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de septiembre. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2014 | | 31/10/2014 |  | Sí | 0.83 |
| 31 | EJECUCIÓN: Difusión del Proyecto Prometeo a nivel internacional, realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2014 | | 31/10/2014 |  | Sí | 0.84 |
| 32 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo realizado en octubre | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2014 | | 31/10/2014 |  | Sí | 0.84 |
| 33 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de octubre. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2014 | | 30/11/2014 |  | Sí | 0.84 |
| 34 | EJECUCIÓN: Eventos para la transferencia de conocimientos de los expertos "Prometeos" en las instituciones de acogida, realizados. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2014 | | 30/11/2014 |  | Sí | 0.84 |
| 35 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en noviembre | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2014 | | 30/11/2014 |  | Sí | 0.83 |
| 36 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de diciembre. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2014 | | 31/12/2014 |  | Sí | 0.84 |
| 37 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2014 | | 31/12/2014 |  | Sí | 0.84 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| | Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre. | | | | | | | |
| 38 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos a ecuatorianos conjuntamente con las diferentes instituciones de acogida, realizado diciembre | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2015 | | 31/01/2015 |  | Sí | 0.2 |
| 39 | EJECUCIÓN: Análisis de número de Prometeos vinculados y finalizados por mes realizada | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2015 | | 31/01/2015 |  | Sí | 0.84 |
| 40 | EJECUCIÓN: Análisis de restricciones a aplicarse en los beneficios de Prometeos en el 2015 | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2015 | | 31/01/2015 |  | Sí | 0.2 |
| 41 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de enero. | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2015 | | 28/02/2015 |  | Sí | 0.3 |
| 42 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en febrero | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2015 | | 28/02/2015 |  | Sí | 0.3 |
| 43 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de febrero. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2015 | | 31/03/2015 |  | Sí | 0.5 |
| 44 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en marzo. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2015 | | 31/03/2015 |  | Sí | 0.5 |
| 45 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de marzo. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2015 | 30/04/2015 | |  | No | 0.5 |
| 46 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en abril. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2015 | 30/04/2015 | |  | No | 0.5 |
| 47 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de abril. | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2015 | 30/05/2015 | |  | No | 0.5 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| 48 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en mayo. | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2015 | 30/05/2015 | |  | No | 0.5 |
| 49 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de mayo. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2015 | 30/06/2015 | |  | No | 0.5 |
| 50 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en junio. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2015 | 30/06/2015 | |  | No | 0.5 |
| 51 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de junio. | 5-Entregables Intermedios | 30/07/2015 | 30/07/2015 | |  | No | 0.5 |
| 52 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en julio. | 5-Entregables Intermedios | 30/07/2015 | 30/07/2015 | |  | No | 0.5 |
| 53 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio. | 5-Entregables Intermedios | 30/08/2015 | 30/08/2015 | |  | No | 0.5 |
| 54 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en agosto. | 5-Entregables Intermedios | 30/08/2015 | 30/08/2015 | |  | No | 0.5 |
| 55 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de agosto. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2015 | 30/09/2015 | |  | No | 0.5 |
| 56 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en septiembre. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2015 | 30/09/2015 | |  | No | 0.5 |
| 57 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de septiembre. | 5-Entregables Intermedios | 30/10/2015 | 30/10/2015 | |  | No | 0.5 |
| 58 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité | 5-Entregables Intermedios | 30/10/2015 | 30/10/2015 | |  | No | 0.5 |



HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en octubre. | | | | | | | |
| 59 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de octubre. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2015 | 30/11/2015 | | | No | 0.5 |
| 60 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en noviembre. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2015 | 30/11/2015 | | | No | 0.5 |
| 61 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2015 | 31/12/2015 | | | No | 0.5 |
| 62 | EJECUCIÓN: Eventos de difusión del Proyecto realizados en el 2015 | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2015 | 31/12/2015 | | | No | 0.5 |
| 63 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en diciembre. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2015 | 31/12/2015 | | | No | 0.5 |
| 64 | EJECUCIÓN: Avanse físico 2016 | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2016 | 31/12/2016 | | | No | 13.5 |
| 65 | EJECUCIÓN: Avance Físico 2017 | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2017 | 30/12/2017 | | | No | 12.5 |
| 66 | CIERRE: Informe de cierre | 9-Entregables Formales | 31/12/2017 | 31/12/2017 | | | No | 10.0 |

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

| | Supervisión | Supervisor | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|---|---|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | CONSTATACIÓN BECAS | Torres Pallo, Jorge | {PR} - Provincia - GALÁPAGOS | 28/02/2015 |
| 2 | Becas están destinados para la Matriz de la Universidad de Bolívar mas no a ninguna extensión de los cantones | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 15/12/2014 |
| 3 | Supervisión | García Pozo, Diego Oswaldo | {PR} - Provincia - IMBABURA | 24/10/2014 |
| 4 | Vigencia del Proyecto | Berrezueta Carrion, Leonardo Renato | {PR} - Provincia - AZUAY | 30/09/2014 |
| 5 | Avance de proyecto | Dueñas de la Torre, Susana Maria | {PR} - Provincia - MANABÍ | 23/04/2014 |
| 6 | Supervisión del Proyecto | Cordero Ortiz, Miguel Humberto | {PR} - Provincia - AZUAY | 18/03/2014 |
| 7 | Supervisión | Taboada Salazar, Wilmer Roberto | {PR} - Provincia - IMBABURA | 15/03/2014 |
| 8 | Visita del 09 de Diciembre del 2013 | Coka Bastidas, Denise Maria | {PR} - Provincia - PASTAZA | 10/12/2013 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|--|---|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Número de Becarios Prometeos vinculados |  | 100.00 % | 82 | 82 | 01/09/2013 | Marzo |
| 2 | Número de expertos aprobados para vinculación a las instituciones de acogida |  | 93.55 % | 31 | 29 | 01/08/2013 | Febrero |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 44,070,736.73 ** |
| Costo Total: | 260,257,621.51 |
| Total Devengado: | 22,741,674.95 |
| % Costo Total Devengado: | 8.74 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 8.74 %

Perfil Económico 2015

| | Años Previos | Año Actual (2015) | Años Futuros | Total |
|---|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado | 9,556,987.18 | 24,944,848.76 | 0.00 | 34,501,835.94 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 5,100,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 12,100,000.00 |
| Ppto. Codificado | 19,293,745.73 | 24,964,848.87 | 0.00 | 44,258,594.60 |
| Ppto. Comprometido | 17,576,563.25 | 3,635,787.09 | 0.00 | 21,212,350.34 |
| Planeado - Codificado (2015) | | -20,000.11 | | |
| Programado a Devengar | 19,293,745.73 | 24,964,848.87 | 0.00 | 44,258,594.60 |
| Ppto. Devengado | 19,105,887.86 | 3,635,787.09 | 0.00 | 22,741,674.95 |
| Estimado a fin de año | * 19,105,887.86 | 11,927,513.40 | 0.00 | 31,033,401.26 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 187,857.87 | 13,037,335.47 | 0.00 | 13,225,193.34 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 99.03 % | 14.56 % | 0.00 % | 51.38 % |
| Ppto. Codificado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Devengado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015

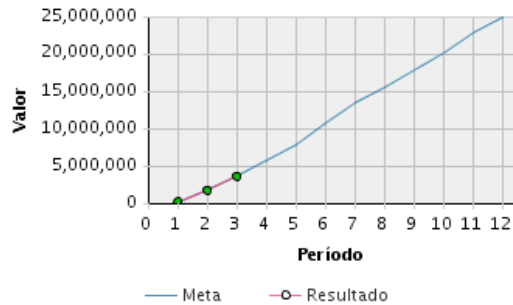

Presupuesto Mensual 2015

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 189,480.50 | 189,480.50 | 189,480.50 | 189,480.50 | 100.00 % | ● | 0.76 % |

| Presupuesto Mensual 2015 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 1,523,484.11 | 1,579,012.46 | 1,712,964.61 | 1,768,492.96 | 103.24 % | | 7.08 % |
| Mar | 1,867,294.13 | 1,867,294.13 | 3,580,258.74 | 3,635,787.09 | 101.55 % | | 14.56 % |
| Abr | 2,134,686.44 | | 5,714,945.18 | | | | |
| May | 2,097,186.44 | | 7,812,131.62 | | | | |
| Jun | 2,814,920.98 | | 10,627,052.60 | | | | |
| Jul | 2,807,231.84 | | 13,434,284.44 | | | | |
| Ago | 2,186,502.54 | | 15,620,786.98 | | | | |
| Sep | 2,103,059.50 | | 17,723,846.48 | | | | |
| Oct | 2,334,767.89 | | 20,058,614.37 | | | | |
| Nov | 2,809,047.96 | | 22,867,662.33 | | | | |
| Dic | 2,097,186.54 | | 24,964,848.87 | | | | |
| Total | 24,964,848.87 | 3,635,787.09 | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|--|
| 2 | Incrementar el número de vinculaciones de expertos de alto nivel residentes en el exterior a instituciones de acogida MEDIANTE la búsqueda de perfiles a nivel mundial, su evaluación, aprobación e incorporación de dichos profesionales. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|---------|---------------|
| 1 | A.1.ASOCIACIÓN HITO 1: Dictamen de prioridad. | A.1.pdf | 05/12/2013 |
| 2 | A.2.ASOCIACIÓN HITO 1: Proyecto Becas - Prometeo formato SENPLADES. | A.2.pdf | 05/12/2013 |
| 3 | A.3.ASOCIACIÓN HITO 2: Perfiles disponibles para ser asignados a una institución, agosto 2013 | A.3.pdf | 05/12/2013 |
| 4 | A.4.ASOCIACIÓN HITO 3: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, agosto 2013 | A.4.pdf | 05/12/2013 |
| 5 | A.5.ASOCIACIÓN HITO 4: Perfiles disponibles para ser asignados a una institución, septiembre 2013 | A.5.pdf | 05/12/2013 |
| 6 | A.6.ASOCIACIÓN HITO 5: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, septiembre | A.6.pdf | 05/12/2013 |
| 7 | A.7.ASOCIACIÓN HITO 6: Perfiles disponibles para ser asignados a una institución, octubre 2013 | A.7.pdf | 05/12/2013 |
| 8 | A.8.ASOCIACIÓN HITO 7: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, octubre 2013 | A.8.pdf | 05/12/2013 |
| 9 | A9.ASOCIACIÓN HITO 8.- Perfiles disponibles para ser asignados a una institución, noviembre 2013 | A9.pdf | 09/12/2013 |
| 10 | B1.ASOCIACIÓN HITO 9.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, noviembre 2013 | B1.pdf | 09/12/2013 |
| 11 | B2.ASOCIACIÓN HITO 10.- Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución. | B2.pdf | 25/03/2014 |
| 12 | B3.ASOCIACIÓN HITO 11.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, diciembre 2013 | B3.pdf | 07/01/2014 |
| 13 | B4.ASOCIACIÓN HITO 12.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, enero 2014 | B4.pdf | 05/02/2014 |
| 14 | B5.ASOCIACIÓN HITO 1: Oficio validación MCCTH | B5.pdf | 28/02/2014 |
| 15 | B6.ASOCIACIÓN HITO 13.-Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos | B6.pdf | 25/03/2014 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|---------|---------------|
| 16 | B7.ASOCIACIÓN HITO 14.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en febrero | B7.pdf | 25/03/2014 |
| 17 | B8. Informe de variación presupuesto programado vs codificado marzo - diciembre 2014 | B8.pdf | 25/03/2014 |
| 18 | B9. Reporte e-SIGEF febrero 2014 | B9.pdf | 25/03/2014 |
| 19 | C1.ASOCIACIÓN HITO 15.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de febrero. | C1.pdf | 31/03/2014 |
| 20 | C2.ASOCIACIÓN HITO 16.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en marzo. | C2.pdf | 31/03/2014 |
| 21 | C3. Reporte e-SIGEF marzo 2014 | C3.pdf | 08/04/2014 |
| 22 | C4.ASOCIACIÓN HITO 17.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de marzo. | C4.pdf | 05/05/2014 |
| 23 | C5.ASOCIACIÓN HITO 18.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en abril | C5.pdf | 05/05/2014 |
| 24 | C6. Reporte e-SIGEF abril 2014 | C6.pdf | 14/05/2014 |
| 25 | C7.ASOCIACIÓN HITO 19.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de abril. | C7.pdf | 03/09/2014 |
| 26 | C8. Reporte e-sigef mes de mayo 2014 | C8.pdf | 03/09/2014 |
| 27 | C9.ASOCIACIÓN HITO 20.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en mayo | C9.pdf | 05/06/2014 |
| 28 | D1. ASOCIACIÓN HITO 21: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de mayo. | D1.pdf | 03/09/2014 |
| 29 | D2.ASOCIACIÓN HITO 22.- Diseñar, implementar y administrar una herramienta de información, nacional e internacional, desarrollado | D2.pdf | 03/09/2014 |
| 30 | D3.ASOCIACIÓN HITO 23.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en junio | D3.pdf | 03/09/2014 |
| 31 | D4. Reporte e-sigef mes de junio 2014 | D4.pdf | 03/09/2014 |
| 32 | D5.ASOCIACIÓN HITO 24.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de junio. | D5.pdf | 01/09/2014 |
| 33 | D6.ASOCIACIÓN HITO 25.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en julio. | D6.pdf | 03/09/2014 |
| 34 | D7. Reporte e-sigef mes de Julio 2014 | D7.pdf | 03/09/2014 |
| 35 | D8. Reporte e-sigef mes de Agosto 2014 | D8.pdf | 03/09/2014 |
| 36 | D9.ASOCIACIÓN HITO 26.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio. | D9.pdf | 03/09/2014 |
| 37 | E.9 Reporte e-sigef mes de Noviembre 2014 | E.9.pdf | 01/12/2014 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|---------|---------------|
| 38 | E1.ASOCIACIÓN HITO 27.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en agosto. | E1.pdf | 03/09/2014 |
| 39 | E2. Reporte e-sigef mes de septiembre 2014 | E2.pdf | 02/10/2014 |
| 40 | E3.ASOCIACIÓN HITO 28.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de agosto. | E3.pdf | 02/10/2014 |
| 41 | E4.ASOCIACIÓN HITO 29.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en septiembre. | E4.pdf | 02/10/2014 |
| 42 | E5. Reporte e-sigef mes de octubre 2014 | E5..pdf | 04/11/2014 |
| 43 | E6.ASOCIACIÓN HITO 30.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de septiembre. | E6.xlsx | 04/11/2014 |
| 44 | E7.ASOCIACIÓN HITO 31.- Difusión del Proyecto Prometeo a nivel internacional, realizado | E7.pdf | 04/11/2014 |
| 45 | E8. ASOCIACIÓN HITO 32.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en octubre | E8.pdf | 04/11/2014 |
| 46 | E9.ASOCIACIÓN HITO 33.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de octubre. | E9.pdf | 02/12/2014 |
| 47 | F1. ASOCIACIÓN HITO 34 : Eventos para la transferencia de conocimientos de los expertos "Prometeos" en las instituciones de acogida, realizados. | F1.pdf | 02/12/2014 |
| 48 | F2. ASOCIACIÓN HITO 35.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en noviembre | F2.pdf | 02/12/2014 |
| 49 | F3. Reporte e-sigef mes de noviembre 2014 | F3.pdf | 02/12/2014 |
| 50 | F4. Relación Proyecto Prometeo con Gobierno electrónico | F4.pdf | 06/01/2015 |
| 51 | F5. Reporte e-sigef mes de Diciembre 2014 | F5..pdf | 05/01/2015 |
| 52 | F6.ASOCIACIÓN HITO 36.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre. | F6.pdf | 06/01/2015 |
| 53 | F7. ASOCIACIÓN HITO 37.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, diciembre 2014 | F7.pdf | 06/01/2015 |
| 54 | F8. Reporte e-SIGEF enero 2015 | F8.pdf | 05/02/2015 |
| 55 | F9. ASOCIACIÓN HITO 38.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de diciembre. | F9.pdf | 06/02/2015 |
| 56 | G1. ASOCIACIÓN HITO 39.- EJECUCIÓN: Análisis de número de Prometeos vinculados y finalizados por mes | G1.pdf | 06/02/2015 |
| 57 | G2. ASOCIACIÓN HITO 40: EJECUCIÓN: Análisis de restricciones a aplicarse en los beneficios de Prometeos en el 2015 | G2..pdf | 06/02/2015 |
| 58 | G3. Reporte e-SIGEF febrero 2015 | G3.pdf | 27/02/2015 |
| 59 | G4. ASOCIACIÓN HITO 41.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos | G4.pdf | 02/03/2015 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|-------------|---------------|
| | Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de enero. | | |
| 60 | G5. ASOCIACIÓN HITO 42.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, febrero 2015 | G5.pdf | 04/03/2015 |
| 61 | G6. Reporte e-SIGEF Marzo 2015 | G6.pdf | 30/03/2015 |
| 62 | G7. ASOCIACIÓN HITO 43.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de febrero. | G7._pdf.pdf | 31/03/2015 |

LIGAS EXTERNAS

| Dirección (URL) | |
|-----------------|---|
| 1 | http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/Prometeo/inicio.do |
| | http://9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Casa Patrimonial |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol |
|-----------------------------------|----------------------|
| Coronel Zuñiga, Cristian Ricardo | Gerente del proyecto |
| Páez Echeverría, Viviana Priscila | Analista a Cargo |
| Solano, María José | Analista Apoyo |
