

**SENESCYT - Secretaría Nacional De Educación Superior, Ciencia, Tecnología E Innovación**  
**PROMETEO**

**PROYECTO: K002 SENESCYT - BECAS PROMETEO**

Líder del Proyecto:	Coronel Zuñiga, Cristian Ricardo (ccoronel@senescyt.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Pazos Padilla, Rina Catalina	Programas Relacionados:	BECAS PROMETEO, Provincia - Azuay, Provincia - Bolivar, Provincia - Carchi, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Napo, Provincia - Orellana, Provincia - Pastaza, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Sucumbíos, Provincia - Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe
Titular:	Coronel Zuñiga, Cristian Ricardo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Brainware - Talento Humano	Retorno Económico:	0.00
CUP:	091590000.0000.375757	TIR:	12.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	2,056,698.81
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	44,065,759.29
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	31/07/2013 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	09/07/2015	Fecha de Fin Base:	31/12/2017
Modificado por:	Gordillo Salinas, Mario Andrés	Fecha del siguiente Hito:	30/07/2015

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

El Proyecto Prometeo está dirigido a universidades y escuelas politécnicas, tanto públicas como cofinanciadas; institutos públicos de investigación; institutos técnicos y tecnológicos, de artes, música y pedagogía; entidades y organismos del sector público en general y sectores productivos priorizados de todo el país. Bajo este lineamiento, los expertos de alto nivel aportarán con sus actividades de investigación, docencia y transferencia de conocimientos en temas especializados

**PRODUCTO:** Transferencia de conocimiento

**LÍNEA BASE:** De acuerdo al PNBV, la educación debe ser fortalecida desde una perspectiva estratégica, en este sentido el estado cumple con un rol fundamental ya que garantiza que éstas se cumplan a través de la generación de políticas. Con estos antecedentes, se implementó el Proyecto Prometeo el cual tiene como meta para el año 2017 la incorporación de 5000 investigadores/docentes de alto nivel en diferentes áreas estratégicas

**OBJETIVO GENERAL:** Incrementar las capacidades de conocimiento de las universidades y escuelas politécnicas, institutos públicos de investigación, institutos técnicos y tecnológicos, entidades y organismos del sector público en general en temas de investigación científica, docencia, innovación, desarrollo tecnológico y social en las áreas estratégicas del desarrollo nacional y regional, así como en los sectores productivos priorizados.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

1. Búsqueda e identificación de prometeos de acuerdo al levantamiento de necesidades con las instituciones beneficiarias.

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

2.Otorgar becas a expertos de alto nivel, nacionales y extranjeros, residentes en el exterior, universidades y escuelas politécnicas, tanto públicas como cofinanciadas, institutos públicos de investigación, institutos técnicos y tecnológicos, entidades y organismos del sector público en general y sectores productivos priorizados de todo el país que determine el Secretario Nacional de la Senescyt para el desarrollo de proyectos de investigación, transferencia de conocimientos en temas especializados, y docencia.  
 3.Automatizar la evaluación y selección de los postulantes a "Prometeos" que respondan a las necesidades de las instituciones beneficiarias del Proyecto, que se conocerán como "instituciones de acogida y seguimiento a las actividades realizadas por los expertos de alto nivel.

**Beneficios Cualitativos**

El proyecto contribuye a transformar el patrón de especialización nacional actual, caracterizada por ser extractivista y exportador de commodities, por uno conducente hacia la producción de bienes y servicios ricos en innovación y conocimiento, con alto valor agregado en los cuales el país obtenga ventajas comparativas.  
 Con este fin, el proyecto promueve el fortalecimiento de las capacidades de investigación de los IPIS, IES e Instituciones Públicas y de formación de investigadores, docentes investigadores y estudiantes a través de la incorporación de investigadores de alto nivel residentes en el exterior.

**Tipo de Beneficiario**

Universidades y escuelas politécnicas públicas, institutos de investigación, instituciones públicas en general vinculados a la investigación en general, a la innovación y al desarrollo tecnológico, y a la consecución de los objetivos constitucionales y del Plan Nacional de Buen Vivir.

Estudiantes, Docentes, Investigadores técnicos.

**Restricciones**

TIEMPO: Ejecucion del proyecto desde julio 2013 hasta el 2017

COSTO: \$ 260.257.621,51


ALCANCE: Nacional

RECURSOS: Humanos, materiales y equipos que son limitados por el presupuesto.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**




Transcurrido: 45.02 %

Fecha de Inicio: 31/07/2013

Fecha de Fin: 31/12/2017

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

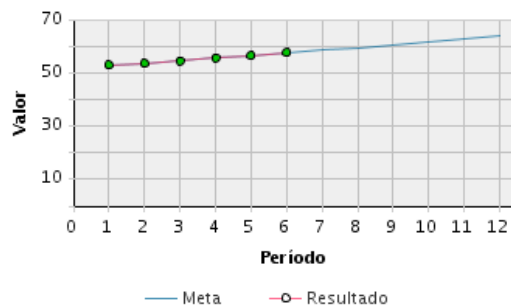

**Porcentaje de Avance**

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	53 %	54 %	55 %	56 %	56 %	57 %	58 %	60 %	60 %	62 %	62 %	64 %
	Avance real acumulado											
	53 %	54 %	55 %	56 %	56 %	57 %						
Estado												
	●	●	●	●	●	●						

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>JUNIO 2015</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 277 aplicaciones, de las cuales 61 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>15187 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de mayo (Hito relacionado 49).</li> <li>24 Prometeos fueron aprobados en comité de junio (Hito relacionado 50)</li> <li>Se vincularon 25 Prometeos en el mes de junio</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de junio</li> </ol>	Páez Echeverría, Viviana Priscila	01/07/2015 - 04:12 PM
<p><b>MAYO 2015</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 204 aplicaciones, de las cuales 60 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>9577 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de abril (Hito relacionado 47).</li> <li>16 Prometeos fueron aprobados en comité de abril (Hito relacionado 48)</li> <li>Se vincularon 25 Prometeos en el mes de mayo</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de mayo</li> </ol>	Páez Echeverría, Viviana Priscila	02/06/2015 - 09:32 AM
<p><b>ABRIL 2015</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 205 aplicaciones, de las cuales 81 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>9088 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de marzo (Hito relacionado 45).</li> <li>10 Prometeos fueron aprobados en comité de abril (Hito relacionado 46)</li> <li>Se vincularon 14 Prometeos en el mes de abril</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de abril</li> </ol>	Páez Echeverría, Viviana Priscila	02/05/2015 - 10:04 AM
<p><b>MARZO 2015</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 233 aplicaciones, de las cuales 84 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>8556 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de febrero (Hito relacionado 43).</li> <li>30 Prometeos fueron aprobados en comité de marzo (Hito relacionado 44)</li> <li>Se vincularon 28 Prometeos en el mes de marzo</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de marzo</li> </ol>	Páez Echeverría, Viviana Priscila	02/04/2015 - 12:49 PM
<p><b>FEBRERO 2015</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 242 aplicaciones, de las cuales 96 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>6484 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de enero (Hito relacionado 41).</li> <li>Nº de prometeos aprobados en comité de febrero (Hito relacionado 42).</li> <li>Se vincularon 52 Prometeos en el mes de febrero</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de febrero</li> </ol>	Castillo Campos, Linda Lesly	04/03/2015 - 07:24 PM
<p><b>FEBRERO 2015</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 242 aplicaciones, de las cuales 96 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>6484 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de enero (Hito relacionado 41).</li> <li>Se vincularon 52 Prometeos en el mes de febrero</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de febrero</li> </ol>	Castillo Campos, Linda Lesly	04/03/2015 - 05:25 PM
<p><b>ENERO 2015</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 248 aplicaciones, de las cuales 95 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>14000 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de diciembre (Hito relacionado 38).</li> <li>Se coloca el análisis de número de Prometeos vinculados y finalizados por mes (Hito relacionado 39)</li> <li>Se coloca el análisis de restricciones a aplicarse en los beneficios de Prometeos en el 2015</li> <li>Se vincularon 2 Prometeos en el mes de enero</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de enero.</li> </ol>	Castillo Campos, Linda Lesly	06/02/2015 - 02:10 PM
<p><b>DICIEMBRE 2014</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 216 aplicaciones, de las cuales 93 fueron pre-seleccionadas.</li> </ol>	Castillo Campos, Linda Lesly	06/01/2015 - 12:18 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2. 8672 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de noviembre (Hito relacionado 36).</p> <p>4. Se aprobaron 2 Prometeos en el Comité ejecutado el 4 de diciembre de 2014 Y 16 Prometeos en el Comité ejecutado el 31 de diciembre de 2014 (Hito relacionado 37).</p> <p>5. Se cierran los riesgos registrados.</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de diciembre.</p>		
<p><b>NOVIEMBRE 2014</b></p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 298 aplicaciones, de las cuales 123 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 14928 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de octubre (Hito relacionado 33).</p> <p>3. Se realizaron 6706 Eventos para la transferencia de conocimientos de los expertos "Prometeos" en las instituciones de acogida, realizados. (Hito relacionado 34).</p> <p>4. Se aprobaron 12 Prometeos en el Comité ejecutado el 28 de noviembre de 2014 (Hito relacionado 35).</p> <p>5. En el mes de noviembre se vincularon a las instituciones de acogida 23 Prometeos.</p> <p>6. El Proyecto Prometeo es parte de Gobierno electrónico debido a que desde el 2013 posee una plataforma web de postulación para captar los perfiles de postulantes al Proyecto a nivel nacional.</p> <p>7. No se realizaron transferencias en el mes de noviembre</p>	Castillo Campos, Linda Lesly	02/12/2014 - 05:17 PM
<p><b>OCTUBRE 2014</b></p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 180 aplicaciones, de las cuales 69 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 7423 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de SEPTIEMBRE (Hito relacionado 30).</p> <p>3. Se realizaron 15 eventos para difundir el Proyecto a Nivel internacional (Hito relacionado 31).</p> <p>4. Se aprobaron 35 Prometeos en el Comité ejecutado el 30 de octubre de 2014 (Hito relacionado 32).</p> <p>5. En el mes de octubre se vincularon a las instituciones de acogida 55 Prometeos.</p> <p>6. No se realizaron transferencias en el mes de octubre.</p>	Castillo Campos, Linda Lesly	04/11/2014 - 05:19 PM
<p><b>OCTUBRE 2014</b></p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 180 aplicaciones, de las cuales 69 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 7423 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de SEPTIEMBRE (Hito relacionado 32).</p> <p>3. Se aprobaron 35 Prometeos en el Comité ejecutado el 30 de octubre de 2014 (Hito relacionado 30).</p> <p>4. En el mes de octubre se vincularon a las instituciones de acogida 55 Prometeos.</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de octubre.</p>	Castillo Campos, Linda Lesly	04/11/2014 - 05:07 PM
<p><b>SEPTIEMBRE 2014</b></p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 306 aplicaciones, de las cuales 141 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 8465 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de AGOSTO (Hito relacionado 28).</p> <p>3. Se aprobaron 28 Prometeos en el Comité ejecutado el 26 de septiembre de 2014 (Hito relacionado 29).</p> <p>4. En el mes de septiembre se vincularon a las instituciones de acogida 61 Prometeos.</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de septiembre.</p>	Castillo Campos, Linda Lesly	02/10/2014 - 11:29 AM
<p>Resúmenes Ejecutivos (Más recientes) Modificado por Fecha de Última Actualización septiembre 2014:</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 306 aplicaciones, de las cuales 141 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 8465 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de AGOSTO (Hito relacionado 28).</p> <p>3. Se aprobaron 28 Prometeos en el Comité ejecutado el 26 de septiembre de 2014 (Hito relacionado 29).</p> <p>4. En el mes de septiembre se vincularon a las instituciones de acogida 61 Prometeos.</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de septiembre.</p>	Castillo Campos, Linda Lesly	02/10/2014 - 10:32 AM
<p><b>AGOSTO 2014:</b></p>	Castillo Campos, Linda Lesly	04/09/2014 - 04:00 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 297 aplicaciones, de las cuales 129 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>10525 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de julio (Hito relacionado 26).</li> <li>Se aprobaron 28 Prometeos en el Comité ejecutado el 26 de agosto de 2014 (Hito relacionado 27).</li> <li>En el mes de agosto se vincularon a las instituciones de acogida 58 Prometeos.</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de agosto.</li> </ol>		
<p><b>JULIO 2014:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 546 aplicaciones, de las cuales 264 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>10918 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes, en el mes de junio (Hito relacionado 24).</li> <li>Se aprobaron 37 Prometeos en el Comité ejecutado el 25 de julio de 2014 (Hito relacionado 25).</li> <li>En el mes de julio se vincularon a las instituciones de acogida 48 Prometeos.</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de julio.</li> </ol>	Solano, María José	01/08/2014 - 12:32 PM
<p><b>JUNIO 2014:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 546 aplicaciones, de las cuales 264 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>10918 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes, en el mes de junio (Hito relacionado 24).</li> <li>Se aprobaron 37 Prometeos en el Comité ejecutado el 25 de julio de 2014 (Hito relacionado 25).</li> <li>En el mes de julio se vincularon a las instituciones de acogida 48 Prometeos.</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de julio.</li> </ol>	Solano, María José	01/08/2014 - 11:33 AM
<p><b>JUNIO 2014:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 342 aplicaciones, de las cuales 173 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>8422 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes, en el mes de mayo (Hito relacionado 21).</li> <li>Se ha solicitado la Automatización de todos los procesos del Proyecto Prometeo a en el Sistema de Postulación; actualmente se ha desarrollado la propuesta que ya fue presentada a las autoridades de SENESCYT, quedando a la espera de su validación. (Hito relacionado 22).</li> <li>Se aprobaron 49 Prometeos en el Comité ejecutado el 25 de junio de 2014 (Hito relacionado 23).</li> <li>En el mes de junio se vincularon a las instituciones de acogida 44 Prometeos.</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de junio.</li> </ol>	Solano, María José	04/07/2014 - 03:40 PM
<p><b>MAYO 2014:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 268 aplicaciones, de las cuales 131 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>.8189 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de abril (Hito relacionado 19).</li> <li>Se aprobaron 66 Prometeos en el Comité ejecutado el 23 de mayo de 2014 (Hito relacionado 20).</li> <li>En el mes de mayo se vincularon a las instituciones de acogida 33 Prometeos.</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de mayo.</li> </ol>	Solano, María José	05/06/2014 - 03:56 PM
<p><b>ABRIL 2014:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 360 aplicaciones, de las cuales 158 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>5242 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de febrero (Hito relacionado 17).</li> <li>Se aprobaron 77 Prometeos en el Comité ejecutado el 25 y 30 de abril de 2014 (Hito relacionado 18).</li> <li>En el mes de abril se vincularon a las instituciones de acogida 30 Prometeos.</li> <li>Se implementó la descarga automática de formularios a través de nuestro portal oficial: <a href="http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/biblioteca">prometeo.educacionsuperior.gob.ec/biblioteca</a></li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de abril.</li> </ol>	Solano, María José	05/05/2014 - 04:17 PM
<p><b>MARZO 2014:</b></p>	Solano, María José	04/04/2014 - 05:21 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1. 6563 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de febrero (Hito relacionado 15).</p> <p>2. Se aprobaron 48 Prometeos en el Comité ejecutado el 21 de marzo de 2014 (Hito relacionado 16).</p> <p>3. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 167 aplicaciones, de las cuales 82 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>4. En el mes de marzo se vincularon a las instituciones de acogida 30 Prometeos.</p> <p>5. Se implementó la descarga automática de formularios a través de nuestro portal oficial: <a href="http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/biblioteca">prometeo.educacionsuperior.gob.ec/biblioteca</a></p> <p>6. Participación del Proyecto Prometeo en la "IV Edición de la Feria Internacional de Opciones de Becas de Posgrado en Ciencia Tecnología e Innovación 2014" organizado por el MICITT de Costa Rica; con el objetivo de difundir el Proyecto y reclutar posibles Prometeos.</p> <p>7. No se realizaron transferencias en el mes de marzo.</p>		
<p><b>FEBRERO 2014:</b></p> <p>-En el mes de enero se realizaron 2 Comités Ejecutivos del Proyecto Becas Prometeo en el que se aprobaron 39 postulantes, se procesaron 126 aplicaciones y se vincularon 46 Prometeos; adicionalmente el Proyecto ha concretado acuerdos de difusión con distintas instituciones nacionales e internacionales.</p>	Solano, María José	05/03/2014 - 09:32 PM
<p><b>ENERO 2014:</b></p> <p>-En el mes de enero se realizaron 2 Comités Ejecutivos del Proyecto Becas Prometeo en el que se aprobaron 12 Prometeos y se procesaron 130 postulaciones.</p> <p>-Se procesaron 170 informes correspondientes a diciembre 2013.</p>	Solano, María José	05/02/2014 - 05:36 PM
<p><b>DICIEMBRE 2013:</b></p> <p>-En el mes de diciembre se realizaron 3 Comités Ejecutivos del Proyecto Becas Prometeo y se procesaron 125 postulaciones.( HITO 11)</p> <p>-El sistema se encuentra en una etapa de estabilización y se están realizando pruebas y solventando los inconvenientes de los postulantes.</p>	Paredes del Castillo, Grace Paulina	03/01/2014 - 08:31 PM
<p><b>NOVIEMBRE 2013:</b></p> <p>-En el mes de noviembre se realizaron 3 Comités Ejecutivos del Proyecto Becas Prometeo y se procesaron 211 postulaciones.( HITO 11)</p> <p>-Con respecto la puesta en producción del sistema de Prometeo (R.I y PIC), los documentos ya se encuentran entregados. El sistema se encuentra en una etapa de estabilización, es decir se están realizando pruebas y solventando todos los inconvenientes de los postulantes.</p> <p>-El miércoles 20 de noviembre la Gerente del Proyecto Prometeo Gabriela Jaramillo fue entrevistada en Radio Centro por el comunicador Andrés López y el jueves 21 de noviembre fue entrevistada en Radio Quito por el comunicador Andrés Carrión; a través de dichas entrevistas se pudo difundir el proyecto.</p>	CADENA FUERTES, JOSÉ RUPERTO	05/12/2013 - 12:01 PM

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p><b>5- PROYECTO. Recursos.</b> Falta de recursos presupuestarios y personal CAUSARÍA retraso en los tiempos esperados</p>	09/07/2015	Cristian Ricardo Coronel Zuñiga	30 %	40	12	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

**LOCALIDADES**

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Carchi > Toda la Provincia del Carchi
2	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas
3	Zona 1 - Norte > Imbabura > Toda la Provincia de Imbabura

**LOCALIDADES**

	Localidad de Impacto
4	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios
5	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Toda la Provincia de Napo
6	Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Toda la Provincia de Orellana
7	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha
8	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo
9	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Toda la Provincia de Cotopaxi
10	Zona 3 - Centro > Pastaza > Toda la Provincia de Pastaza
11	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Toda la Provincia de Tungurahua
12	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí
13	Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Toda la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas
14	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Toda la Provincia de Bolivar
15	Zona 5 - Litoral > Galápagos > Toda la Provincia de Galapagos
16	Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas
17	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Toda la Provincia de Los Ríos
18	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Toda la Provincia de Santa Elena
19	Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay
20	Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar
21	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago
22	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro
23	Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja
24	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipec > Toda la Provincia de Zamora Chinchipe

**HITOS**





	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN y PLANIFICACIÓN: Dictamen de prioridad recibido / Equipo de planificación definido	4-Inicio de Trabajo	31/07/2013		31/07/2013		Sí	20.0
2	EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución.	5-Entregables Intermedios	30/08/2013		30/08/2013		Sí	0.9
3	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas.	5-Entregables Intermedios	30/08/2013		30/08/2013		Sí	0.9
4	EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución.	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		30/09/2013		Sí	0.9
5	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas.	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		30/09/2013		Sí	0.9
6	EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución.	5-Entregables Intermedios	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.9
7	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas.	5-Entregables Intermedios	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.9
8	EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución.	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		30/11/2013		Sí	0.9

HITOS






	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
9	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas.	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		30/11/2013		Sí	0.9
10	EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución.	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		31/12/2013		Sí	0.9
11	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas.	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		31/12/2013		Sí	0.9
12	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en enero	5-Entregables Intermedios	31/01/2014		31/01/2014		Sí	0.84
13	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de enero.	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		28/02/2014		Sí	1.68
14	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en febrero	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		28/02/2014		Sí	0.84
15	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de febrero.	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.84
16	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en marzo	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.84
17	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de marzo.	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	0.84
18	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en abril	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	0.84
19	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de abril.	5-Entregables Intermedios	31/05/2014		31/05/2014		Sí	0.84
20	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en mayo	5-Entregables Intermedios	31/05/2014		31/05/2014		Sí	0.84



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
21	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de mayo.	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.84
22	EJECUCIÓN: Diseñar, implementar y administrar una herramienta de información, nacional e internacional, desarrollado	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.84
23	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en junio	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.84
24	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de junio.	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	0.84
25	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en julio	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	0.84
26	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio.	5-Entregables Intermedios	31/08/2014		29/08/2014		Sí	0.84
27	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en agosto	5-Entregables Intermedios	31/08/2014		29/08/2014		Sí	0.84
28	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de agosto.	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	0.84
29	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en septiembre	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	0.84
30	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de septiembre.	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	0.83

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
31	EJECUCIÓN: Difusión del Proyecto Prometeo a nivel internacional, realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	0.84
32	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo realizado en octubre	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	0.84
33	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de octubre.	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		30/11/2014		Sí	0.84
34	EJECUCIÓN: Eventos para la transferencia de conocimientos de los expertos "Prometeos" en las instituciones de acogida, realizados.	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		30/11/2014		Sí	0.84
35	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en noviembre	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		30/11/2014		Sí	0.83
36	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de diciembre.	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	0.84
37	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre.	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	0.84
38	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos a ecuatorianos conjuntamente con las diferentes instituciones de acogida, realizado diciembre	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.2
39	EJECUCIÓN: Análisis de número de Prometeos vinculados y finalizados por mes realizada	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.84
40	EJECUCIÓN: Análisis de restricciones a aplicarse en los beneficios de Prometeos en el 2015	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.2
41	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de enero.	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
42	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en febrero	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.3
43	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de febrero.	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.5
44	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en marzo.	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.5
45	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de marzo.	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.5
46	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en abril.	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.5
47	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de abril.	5-Entregables Intermedios	30/05/2015		30/05/2015		Sí	0.5
48	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en mayo.	5-Entregables Intermedios	30/05/2015		30/05/2015		Sí	0.5
49	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de mayo.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.5
50	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en junio.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.5
51	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de junio.	5-Entregables Intermedios	30/07/2015	30/07/2015			No	0.5
52	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité	5-Entregables Intermedios	30/07/2015	30/07/2015			No	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en julio.							
53	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio.	5-Entregables Intermedios	30/08/2015	30/08/2015			No	0.5
54	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en agosto.	5-Entregables Intermedios	30/08/2015	30/08/2015			No	0.5
55	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de agosto.	5-Entregables Intermedios	30/09/2015	30/09/2015			No	0.5
56	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en septiembre.	5-Entregables Intermedios	30/09/2015	30/09/2015			No	0.5
57	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de septiembre.	5-Entregables Intermedios	30/10/2015	30/10/2015			No	0.5
58	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en octubre.	5-Entregables Intermedios	30/10/2015	30/10/2015			No	0.5
59	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de octubre.	5-Entregables Intermedios	30/11/2015	30/11/2015			No	0.5
60	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en noviembre.	5-Entregables Intermedios	30/11/2015	30/11/2015			No	0.5
61	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre.	5-Entregables Intermedios	31/12/2015	31/12/2015			No	0.5
62	EJECUCIÓN: Eventos de difusión del Proyecto realizados en el 2015	5-Entregables Intermedios	31/12/2015	31/12/2015			No	0.5
63	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité	5-Entregables Intermedios	31/12/2015	31/12/2015			No	0.5

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en diciembre.							
64	EJECUCIÓN: Avanse físico 2016	5-Entregables Intermedios	31/12/2016	31/12/2016			No	13.5
65	EJECUCIÓN: Avance Físico 2017	5-Entregables Intermedios	30/12/2017	30/12/2017			No	12.5
66	CIERRE: Informe de cierre	9-Entregables Formales	31/12/2017	31/12/2017			No	10.0

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Proyecto se lo ejecuta desde Coordinación Zonal del Austro sur del país	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	24/06/2015
2	GOBERNADOR	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	28/05/2015
3	Supervisión positiva a los objetivos del proyecto y Prometeos existentes actualmente en el Azuay	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	24/04/2015
4	CONSTATAción BECAS	Torres Pallo, Jorge	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	28/02/2015
5	Becas están destinados para la Matriz de la Universidad de Bolívar mas no a ninguna extensión de los cantones	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	15/12/2014
6	Supervisión	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	24/10/2014
7	Vigencia del Proyecto	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	30/09/2014
8	Avance de proyecto	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	23/04/2014
9	Supervisión del Proyecto	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	18/03/2014
10	Supervisión	Taboada Salazar, Wilmer Roberto	{PR} - Provincia - IMBABURA	15/03/2014
11	Visita del 09 de Diciembre del 2013	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	10/12/2013

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de expertos aprobados para vinculación a las instituciones de acogida		102.83 %	106	109	01/08/2013	Junio
2	Número de Becarios Prometeos vinculados		99.32 %	147	146	01/09/2013	Junio


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	44,065,759.29 **
Costo Total:	260,257,621.51
Total Devengado:	29,818,491.88
% Costo Total Devengado:	11.46 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 11.46 %

**Perfil Económico 2015**

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	9,556,987.18	24,964,848.87	0.00	34,521,836.05
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	5,100,000.00	7,000,000.00	0.00	12,100,000.00
Ppto. Codificado	19,293,745.73	12,059,107.76	0.00	31,352,853.49
Ppto. Comprometido	17,576,563.25	10,712,604.02	0.00	28,289,167.27
Planeado - Codificado (2015)		12,905,741.11		
Programado a Devengar	19,293,745.73	24,959,871.43	0.00	44,253,617.16
Ppto. Devengado	19,105,887.86	10,712,604.02	0.00	29,818,491.88
Estimado a fin de año	* 19,105,887.86	11,927,513.40	0.00	31,033,401.26
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	187,857.87	13,032,358.03	0.00	13,220,215.90
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 99.03 %	42.92 %	0.00 %	67.38 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015**

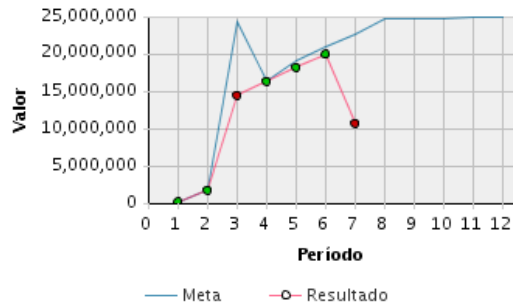

**Presupuesto Mensual 2015**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	189,480.50	189,480.50	189,480.50	189,480.50	100.00 %	●	0.76 %

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	1,579,012.46	1,579,012.46	1,768,492.96	1,768,492.96	100.00 %		7.09 %
Mar	22,414,488.65	12,703,154.13	24,182,981.61	14,471,647.09	59.84 %		57.98 %
Abr	-7,838,936.72	1,872,397.80	16,344,044.89	16,344,044.89	100.00 %		65.48 %
May	2,778,991.07	1,794,764.31	19,123,035.96	18,138,809.20	94.85 %		72.67 %
Jun	1,777,037.23	1,777,357.23	20,900,073.19	19,916,166.43	95.29 %		79.79 %
Jul	1,661,472.40	-9,203,562.41	22,561,545.59	10,712,604.02	47.48 %		42.92 %
Ago	2,126,692.24		24,688,237.83				
Sep	22,494.56		24,710,732.39				
Oct	63,051.20		24,773,783.59				
Nov	93,043.92		24,866,827.51				
Dic	93,043.92		24,959,871.43				
<b>Total</b>	<b>24,959,871.43</b>	<b>10,712,604.02</b>					

## OBJETIVOS ALINEADOS

### Objetivos Operativos

2	Incrementar el número de vinculaciones de expertos de alto nivel residentes en el exterior a instituciones de acogida MEDIANTE la búsqueda de perfiles a nivel mundial, su evaluación, aprobación e incorporación de dichos profesionales.
---	--

## IMPACTO A SERVICIOS

### Servicios

SENESCYT-002	Vinculación de profesionales en investigación «Prometeos» y docencia «Ateneos»
--------------	--

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1.ASOCIACIÓN HITO 1: Dictamen de prioridad.	A.1.pdf	05/12/2013
2	A.2.ASOCIACIÓN HITO 1: Proyecto Becas - Prometeo formato SENPLADES.	A.2.pdf	05/12/2013
3	A.3.ASOCIACIÓN HITO 2: Perfiles disponibles para ser asignados a una institución, agosto 2013	A.3.pdf	05/12/2013
4	A.4.ASOCIACIÓN HITO 3: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, agosto 2013	A.4.pdf	05/12/2013
5	A.5.ASOCIACIÓN HITO 4: Perfiles disponibles para ser asignados a una institución, septiembre 2013	A.5.pdf	05/12/2013
6	A.6.ASOCIACIÓN HITO 5: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, septiembre	A.6.pdf	05/12/2013
7	A.7.ASOCIACIÓN HITO 6: Perfiles disponibles para ser asignados a una institución, octubre 2013	A.7.pdf	05/12/2013
8	A.8.ASOCIACIÓN HITO 7: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, octubre 2013	A.8.pdf	05/12/2013
9	A9.ASOCIACIÓN HITO 8.- Perfiles disponibles para ser asignados a una institución, noviembre 2013	A9.pdf	09/12/2013
10	B1.ASOCIACIÓN HITO 9.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, noviembre 2013	B1.pdf	09/12/2013
11	B2.ASOCIACIÓN HITO 10.- Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución.	B2.pdf	25/03/2014
12	B3.ASOCIACIÓN HITO 11.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, diciembre 2013	B3.pdf	07/01/2014

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
13	B4.ASOOCIACIÓN HITO 12.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, enero 2014	B4.pdf	05/02/2014
14	B5.ASOOCIACIÓN HITO 1: Oficio validación MCCTH	B5.pdf	28/02/2014
15	B6.ASOOCIACIÓN HITO 13.-Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos	B6.pdf	25/03/2014
16	B7.ASOOCIACIÓN HITO 14.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en febrero	B7.pdf	25/03/2014
17	B8. Informe de variación presupuesto programado vs codificado marzo - diciembre 2014	B8.pdf	25/03/2014
18	B9. Reporte e-SIGEF febrero 2014	B9.pdf	25/03/2014
19	C1.ASOOCIACIÓN HITO 15.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de febrero.	C1.pdf	31/03/2014
20	C2.ASOOCIACIÓN HITO 16.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en marzo.	C2.pdf	31/03/2014
21	C3. Reporte e-SIGEF marzo 2014	C3.pdf	08/04/2014
22	C4.ASOOCIACIÓN HITO 17.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de marzo.	C4.pdf	05/05/2014
23	C5.ASOOCIACIÓN HITO 18.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en abril	C5.pdf	05/05/2014
24	C6. Reporte e-SIGEF abril 2014	C6.pdf	14/05/2014
25	C7.ASOOCIACIÓN HITO 19.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de abril.	C7.pdf	03/09/2014
26	C8. Reporte e-sigef mes de mayo 2014	C8.pdf	03/09/2014
27	C9.ASOOCIACIÓN HITO 20.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en mayo	C9.pdf	05/06/2014
28	D1. ASOCIACIÓN HITO 21: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de mayo.	D1.pdf	03/09/2014
29	D2.ASOOCIACIÓN HITO 22.- Diseñar, implementar y administrar una herramienta de información, nacional e internacional, desarrollado	D2.pdf	03/09/2014
30	D3.ASOOCIACIÓN HITO 23.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en junio	D3.pdf	03/09/2014
31	D4. Reporte e-sigef mes de junio 2014	D4.pdf	03/09/2014
32	D5.ASOOCIACIÓN HITO 24.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de junio.	D5.pdf	01/09/2014
33	D6.ASOOCIACIÓN HITO 25.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en julio.	D6.pdf	03/09/2014
34	D7. Reporte e-sigef mes de Julio 2014	D7.pdf	03/09/2014
35	D8. Reporte e-sigef mes de Agosto 2014	D8.pdf	03/09/2014
36	D9.ASOOCIACIÓN HITO 26.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos	D9.pdf	03/09/2014



**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio.		
37	E.9 Reporte e-sigef mes de Noviembre 2014	E.9.pdf	01/12/2014
38	E1.ASOCIACIÓN HITO 27.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en agosto.	E1.pdf	03/09/2014
39	E2. Reporte e-sigef mes de septiembre 2014	E2.pdf	02/10/2014
40	E3.ASOCIACIÓN HITO 28.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de agosto.	E3.pdf	02/10/2014
41	E4.ASOCIACIÓN HITO 29.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en septiembre.	E4.pdf	02/10/2014
42	E5. Reporte e-sigef mes de octubre 2014	E5..pdf	04/11/2014
43	E6.ASOCIACIÓN HITO 30.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de septiembre.	E6.xlsx	04/11/2014
44	E7.ASOCIACIÓN HITO 31.- Difusión del Proyecto Prometeo a nivel internacional, realizado	E7.pdf	04/11/2014
45	E8. ASOCIACIÓN HITO 32.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en octubre	E8.pdf	04/11/2014
46	E9.ASOCIACIÓN HITO 33.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de octubre.	E9.pdf	02/12/2014
47	F1. ASOCIACIÓN HITO 34 : Eventos para la transferencia de conocimientos de los expertos "Prometeos" en las instituciones de acogida, realizados.	F1.pdf	02/12/2014
48	F2. ASOCIACIÓN HITO 35.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en noviembre	F2.pdf	02/12/2014
49	F3. Reporte e-sigef mes de noviembre 2014	F3.pdf	02/12/2014
50	F4. Relación Proyecto Prometeo con Gobierno electrónico	F4.pdf	06/01/2015
51	F5. Reporte e-sigef mes de Diciembre 2014	F5..pdf	05/01/2015
52	F6.ASOCIACIÓN HITO 36.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre.	F6.pdf	06/01/2015
53	F7. ASOCIACIÓN HITO 37.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, diciembre 2014	F7.pdf	06/01/2015
54	F8. Reporte e-SIGEF enero 2015	F8.pdf	05/02/2015
55	F9. ASOCIACIÓN HITO 38.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de diciembre.	F9.pdf	06/02/2015
56	G1. ASOCIACIÓN HITO 39.- EJECUCIÓN: Análisis de número de Prometeos vinculados y finalizados por mes	G1.pdf	06/02/2015

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
57	G2. ASOCIACIÓN HITO 40: EJECUCIÓN: Análisis de restricciones a aplicarse en los beneficios de Prometeos en el 2015	G2..pdf	06/02/2015
58	G3. Reporte e-SIGEF febrero 2015	G3.pdf	27/02/2015
59	G4. ASOCIACIÓN HITO 41.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de enero.	G4.pdf	02/03/2015
60	G5. ASOCIACIÓN HITO 42.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, febrero 2015	G5.pdf	04/03/2015
61	G6. Reporte e-SIGEF Marzo 2015	G6.pdf	07/04/2015
62	G7. ASOCIACIÓN HITO 43.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de febrero.	G7..pdf.pdf	31/03/2015
63	G8. ASOCIACIÓN HITO 44.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en marzo.	G8.pdf	02/04/2015
64	G9. ASOCIACIÓN HITO 45: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de marzo	G9..pdf	30/04/2015
65	H1. ASOCIACIÓN HITO 46: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en abril	H1..PDF	30/04/2015
66	H2. Reporte e-SIGEF Abril 2015	H2.pdf	04/05/2015
67	H3 ASOCIACIÓN HITO 47.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de abril	H3.pdf	01/06/2015
68	H4 ASOCIACIÓN HITO 48.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en mayo	H4.pdf	01/06/2015
69	H5. Reporte e-SIGEF Mayo 2015	H5.pdf	04/06/2015
70	H6. ASOCIACIÓN HITO 49: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de mayo	H6.PDF	03/07/2015
71	H7. ASOCIACIÓN HITO 50: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en junio	H7.PDF	03/07/2015
72	H8. Reporte e-SIGEF Junio 2015	H8.pdf	01/07/2015

## LIGAS EXTERNAS

### Dirección (URL)

1	<a href="http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/Prometeo/inicio.do">http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/Prometeo/inicio.do</a>
	<a href="http://9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Casa Patrimonial">http://9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Casa Patrimonial</a>

## EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico
Coronel Zuñiga, Cristian Ricardo	Gerente del proyecto	Gerente Proyecto Prometeo	ccoronel@senescyt.gob.ec

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico
Páez Echeverría, Viviana Priscila	Analista a Cargo	Coordinadora de Planificación Estratégica y Punto de Atención al Prometeo	vpaez@senescyt.gob.ec
Solano, María José	Analista Apoyo		msolano@senescyt.gob.ec
