

SENESCYT - Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
PROMETEO

PROYECTO: K002 SENESCYT - BECAS PROMETEO

Líder del Proyecto:	Vivas Martínez, Rodrigo Enrique (rvivas@senescyt.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ponce León, Ximena Mercedes	Programas Relacionados:	BECAS PROMETEO, Provincia - Azuay, Provincia - Bolívar, Provincia - Carchi, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Napo, Provincia - Orellana, Provincia - Pastaza, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Sucumbíos, Provincia - Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe
Titular:	Vivas Martínez, Rodrigo Enrique	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Brainware - Talento Humano	Retorno Económico:	0.00
CUP:	091590000.0000.375757	TIR:	12.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	2,056,698.81
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	45,485,099.05
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	31/07/2013 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	04/10/2017	Fecha de Fin Base:	31/12/2017
Modificado por:	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	Fecha del siguiente Hito:	31/10/2017

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El Proyecto Prometeo está dirigido a universidades y escuelas politécnicas, tanto públicas como cofinanciadas; institutos públicos de investigación; institutos técnicos y tecnológicos, de artes, música y pedagogía; entidades y organismos del sector público en general y sectores productivos priorizados de todo el país. Bajo este lineamiento, los expertos de alto nivel aportarán con sus actividades de investigación, docencia y transferencia de conocimientos en temas especializados

PRODUCTO: Transferencia de conocimiento

LÍNEA BASE: De acuerdo al PNBV, la educación debe ser fortalecida desde una perspectiva estratégica, en este sentido el estado cumple con un rol fundamental ya que garantiza que éstas se cumplan a través de la generación de políticas. Con estos antecedentes, se implementó el Proyecto Prometeo el cual tiene como meta para el año 2017 la incorporación de 5000 investigadores/docentes de alto nivel en diferentes áreas estratégicas

OBJETIVO GENERAL: Incrementar las capacidades de conocimiento de las universidades y escuelas politécnicas, institutos públicos de investigación, institutos técnicos y tecnológicos, entidades y organismos del sector público en general en temas de investigación científica, docencia, innovación, desarrollo tecnológico y social en las áreas estratégicas del desarrollo nacional y regional, así como en los sectores productivos priorizados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Búsqueda e identificación de prometeos de acuerdo al levantamiento de necesidades con las instituciones beneficiarias.


DATOS GENERALES

Descripción
<p>2. Otorgar becas a expertos de alto nivel, nacionales y extranjeros, residentes en el exterior, universidades y escuelas politécnicas, tanto públicas como cofinanciadas, institutos públicos de investigación, institutos técnicos y tecnológicos, entidades y organismos del sector público en general y sectores productivos priorizados de todo el país que determine el Secretario Nacional de la Senescyt para el desarrollo de proyectos de investigación, transferencia de conocimientos en temas especializados, y docencia.</p> <p>3. Automatizar la evaluación y selección de los postulantes a "Prometeos" que respondan a las necesidades de las instituciones beneficiarias del Proyecto, que se conocerán como "instituciones de acogida y seguimiento a las actividades realizadas por los expertos de alto nivel.</p>
Beneficios Cualitativos
<p>El proyecto contribuye a transformar el patrón de especialización nacional actual, caracterizada por ser extractivista y exportador de commodities, por uno conducente hacia la producción de bienes y servicios ricos en innovación y conocimiento, con alto valor agregado en los cuales el país obtenga ventajas comparativas.</p> <p>Con este fin, el proyecto promueve el fortalecimiento de las capacidades de investigación de los IPIS, IES e Instituciones Públicas y de formación de investigadores, docentes investigadores y estudiantes a través de la incorporación de investigadores de alto nivel residentes en el exterior.</p>
Tipo de Beneficiario
<p>Universidades y escuelas politécnicas públicas, institutos de investigación, instituciones públicas en general vinculados a la investigación en general, a la innovación y al desarrollo tecnológico, y a la consecución de los objetivos constitucionales y del Plan Nacional de Buen Vivir.</p> <p>Estudiantes, Docentes, Investigadores técnicos.</p>
Restricciones
<p>TIEMPO: Ejecución del proyecto desde julio 2013 hasta el 2017</p> <p>COSTO: \$ 260.257.621,51</p> <p>ALCANCE: Nacional</p> <p>RECURSOS: Humanos, materiales y equipos que son limitados por el presupuesto.</p>

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 94.49 %
 Fecha de Inicio: 31/07/2013 Fecha de Fin: 31/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

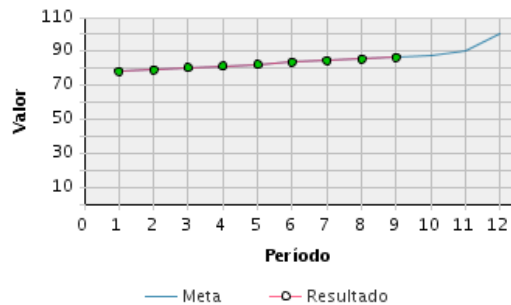

		Porcentaje de Avance												
Año		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2017	Avance programado acumulado	78 %	79 %	81 %	81 %	82 %	84 %	84 %	85 %	87 %	87 %	90 %	100 %	
	Avance real acumulado	78 %	79 %	81 %	81 %	82 %	84 %	84 %	85 %	87 %				
	Estado	●	●	●	●	●	●	●	●	●				

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2017</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones, no se procesaron aplicaciones.</p> <p>2. 337 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo 16 agosto - 15 septiembre 2017.</p> <p>3. En el mes de septiembre no se vincularon nuevos Prometeos.</p> <p>5. Informe de proyectos finalizados mes de septiembre: 9 (Relacionado Hito 106)</p> <p>6. Informe de proyectos mensuales revisados mes de septiembre: 17 (Relacionado Hito 107)</p> <p>7. En este mes no se realizaron transferencias.</p>	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	04/10/2017 - 10:35 AM
<p>AGOSTO 2017</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones, no se procesaron aplicaciones.</p> <p>2. 615 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo 16 julio - 15 agosto 2017.</p> <p>3. En el mes de Agosto no se vincularon nuevos Prometeos.</p> <p>5. Informe de proyectos finalizados mes de agosto: 6 (Relacionado Hito 104)</p> <p>6. Informe de proyectos mensuales revisados mes de agosto: 20 (Relacionado Hito 105)</p> <p>7. En este mes no se realizaron transferencias.</p>	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	30/08/2017 - 11:45 AM
<p>JULIO 2017</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones, no se procesaron aplicaciones.</p> <p>2. 1.591 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo 16 junio - 15 julio 2017.</p> <p>3. En el mes de Julio no se vincularon nuevos Prometeos.</p> <p>5. Informe de proyectos finalizados mes de julio: 12 (Relacionado Hito 102)</p> <p>6. Informe de proyectos mensuales revisados mes de julio: 39 (Relacionado Hito 103)</p> <p>7. En este mes no se realizaron transferencias.</p>	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	04/08/2017 - 12:48 PM
<p>JUNIO 2017</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones, no se procesaron aplicaciones.</p> <p>2. 2.505 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo 16 mayo - 15 junio 2017.</p> <p>3. En el mes de Junio no se vincularon nuevos Prometeos.</p> <p>5. Informe de proyectos finalizados mes de mayo: 8 (Relacionado Hito 99)</p> <p>6. Informe de proyectos mensuales revisados mes de mayo: 36 (Relacionado Hito 100)</p> <p>7. En este mes no se realizaron transferencias.</p>	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	07/07/2017 - 04:25 PM
<p>MAYO 2017</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones, no se procesaron aplicaciones.</p> <p>2. 2.167 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo 16 Abril - 15 Mayo 2017.</p> <p>3. En el mes de Mayo no se vincularon nuevos Prometeos.</p> <p>5. Informe de proyectos finalizados mes de mayo: 7 (Relacionado Hito 97)</p> <p>6. Informe de proyectos mensuales revisados mes de mayo: 37 (Relacionado Hito 98)</p> <p>7. En este mes no se realizaron transferencias.</p>	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	02/06/2017 - 11:11 AM
<p>ABRIL 2017</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 0 aplicaciones.</p> <p>2. 2.289 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo 16 Marzo - 15 Abril 2017.</p> <p>3. En el mes de Abril se vinculó 1 nuevo Prometeo.</p> <p>5. Informe de proyectos finalizados mes de abril: 6</p> <p>6. Informe de proyectos mensuales revisados mes de abril:41</p> <p>7. En este mes no se realizaron transferencias</p>	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	08/05/2017 - 03:50 PM
<p>MARZO 2017</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 0 aplicaciones</p> <p>2. 2.377 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo 16 Febrero - 15 Marzo 2017</p> <p>3. En el mes de marzo no se vincularon nuevos Prometeos</p> <p>5. Informe de proyectos finalizados mes de marzo: 6</p> <p>6. Informe de proyectos mensuales revisados mes de marzo:48</p> <p>7. En este mes no se realizaron transferencias</p>	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	07/04/2017 - 10:40 AM
<p>FEBRERO 2017</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesó 1 aplicación, la misma que fue pre-seleccionada</p> <p>2. 2.600 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo Enero - Febrero 2017</p> <p>3. En el mes de febrero se vinculó 1 nuevo Prometeo</p> <p>5. Informe de proyectos finalizados mes de febrero: 90</p> <p>6. Informe de proyectos mensuales revisados mes de febrero: 91</p>	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	08/03/2017 - 12:39 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante el sistema de postulaciones se procesó 1 aplicación. la misma que fue pre-seleccionada 1.631 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo Diciembre - Enero 2017 En el mes de ENERO se vincularon 5 nuevos Prometeos Informe de proyectos finalizados mes de Enero 1 Informe de proyectos mensuales revisados mes de Enero 41 	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	07/02/2017 - 01:40 PM
<p>DICIEMBRE 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante el sistema de postulaciones NO se procesó ninguna aplicación. a su vez ninguna fue pre-seleccionada 3.326 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo Noviembre- Diciembre (Hito relacionado 86). 6 perfiles fueron aprobados en comité en el mes de DICIEMBRE En el mes de DICIEMBRE no se vincularon nuevos Prometeos No se realizaron transferencias en este mes Se presenta Resumen eventos de difusión del Proyecto Prometeo (Hito relacionado 87) 	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	06/01/2017 - 12:55 PM
<p>NOVIEMBRE 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 1 aplicaciones, de las cuales 1 fue pre-seleccionada 4.340 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo Octubre - Noviembre (Hito relacionado 80). 0 perfiles fueron aprobados en comité en el mes de NOVIEMBRE (Hito relacionado 81). En el mes de NOVIEMBRE se vincularon 3 nuevos Prometeos No se realizaron transferencias en este mes Registro de Biblioteca creada con publicaciones de Prometeos /Ateneos 	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	08/12/2016 - 01:18 PM
<p>OCTUBRE 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 5 aplicaciones, de las cuales 5 fueron pre-seleccionadas 3.072 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo Septiembre- Octubre (Hito relacionado 80). 2 perfiles fueron aprobados en comité en el mes de OCTUBRE (Hito relacionado 81). En el mes de OCTUBRE se vincularon 7 nuevos Prometeos No se realizaron transferencias en este mes En el mes de Octubre se realiza el analisis de impacto del proyecto para Viejos sabios (Hito 82) 	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	11/11/2016 - 04:35 PM
<p>SEPTIEMBRE 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 9 aplicaciones, de las cuales 5 fueron pre-seleccionadas 3.266 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo Agosto - Septiembre (Hito relacionado 80). 3 perfiles fueron aprobados en comité en el mes de SEPTIEMBRE (Hito relacionado 81). En el mes de SEPTIEMBRE se vincularon 4 nuevos Prometeos No se realizaron transferencias en este mes 	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	07/10/2016 - 05:19 PM
<p>AGOSTO 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 14 aplicaciones, de las cuales 11 fueron pre-seleccionadas 4.936 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo JULIO (Hito relacionado 78). 7 perfiles fueron aprobados en comité en el mes de AGOSTO (Hito relacionado 79). En el mes de AGOSTO se vincularon 6 nuevos Prometeos No se realizaron transferencias en este mes 	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	06/09/2016 - 04:21 PM
<p>JULIO 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 14 aplicaciones, de las cuales 10 fueron pre-seleccionadas 6.023 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo JUNIO (Hito relacionado 74). 7 perfiles fueron aprobados en comité en el mes de JULIO (Hito relacionado 77). En el mes de JULIO se vincularon 3 nuevos Prometeos No se realizaron transferencias en este mes 	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	08/08/2016 - 04:36 PM
<p>JUNIO 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 24 aplicaciones, de las cuales 8 fueron pre-seleccionadas 	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	04/07/2016 - 09:30 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2. 3.501 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo JUNIO (Hito relacionado 74).</p> <p>3. 6 perfiles fueron aprobados en comité en el mes de JUNIO (Hito relacionado 75).</p> <p>4. En el mes de JUNIO se vincularon 6 nuevos Prometeos</p> <p>5. No se realizaron transferencias en este mes</p>		
<p>Mayo 2016</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 36 aplicaciones, de las cuales 20 fueron pre-seleccionadas</p> <p>2. 2.506 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo abril mayo (Hito relacionado 72).</p> <p>3. No se realizaron comités para aprobación de nuevas propuestas de investigación/docencia en el mes de mayo</p> <p>4. En el mes de mayo se vincularon 3 nuevos Prometeos</p> <p>5. No se realizaron transferencias en este mes</p>	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	03/06/2016 - 04:52 PM
<p>ABRIL 2016</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 32 aplicaciones, de las cuales 15 fueron pre-seleccionadas</p> <p>2. 3.379 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de marzo (Hito relacionado 70).</p> <p>3. 9 postulantes fueron aprobados en comité de abril (Hito relacionado 71)</p> <p>4. En el mes de abril se vincularon 3 nuevos Prometeos</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes abril</p>	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	05/05/2016 - 12:48 PM
<p>MARZO 2016</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 26 aplicaciones, de las cuales 8 fueron pre-seleccionadas</p> <p>2. 13.845 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de febrero (Hito relacionado 68).</p> <p>3. 5 postulantes fueron aprobados en comité de Marzo (Hito relacionado 69)</p> <p>4. En el mes de marzo se vincularon 4 nuevos Prometeos</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes marzo</p>	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	05/04/2016 - 09:16 AM
<p>FEBRERO 2016</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 8 aplicaciones, de las cuales 5 fueron pre-seleccionadas</p> <p>2. 6331 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de Enero (Hito relacionado 66).</p> <p>3. No se desarrollarán comites de aprobación para nuevos postulantes (Hito relacionado 67)</p> <p>4. Hubieron 8 vinculaciones en el mes de Febrero</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes Febrero</p>	Páez Echeverría, Viviana Priscila	01/03/2016 - 10:36 AM
<p>ENERO 2016</p> <p>1. El sistema de postulación se encuentra cerrado temporalmente</p> <p>2. 8328 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de diciembre (Hito relacionado 64).</p> <p>3. No se desarrollarán comites de aprobación para nuevos postulantes</p> <p>4. No hubieron vinculaciones en el mes de enero</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes enero</p>	Páez Echeverría, Viviana Priscila	02/02/2016 - 01:06 PM
<p>DICIEMBRE 2015</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 3 aplicaciones, de las cuales 2 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 9371 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de noviembre (Hito relacionado 61).</p> <p>3. 12 postulantes fueron aprobados en comité de diciembre (Hito relacionado 63)</p> <p>4. No hubieron vinculaciones en el mes de diciembre</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes diciembre</p>	Páez Echeverría, Viviana Priscila	04/01/2016 - 09:15 AM
<p>NOVIEMBRE 2015</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 14 aplicaciones, de las cuales 3 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 10610 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de octubre (Hito relacionado 59).</p> <p>3. 2 postulantes fueron aprobados en comité de noviembre (Hito relacionado 60)</p> <p>4. Se vincularon 10 Prometeos en el mes de noviembre</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de noviembre</p>	Páez Echeverría, Viviana Priscila	01/12/2015 - 08:28 AM
<p>OCTUBRE 2015</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 74 aplicaciones, de las cuales 19 fueron pre-seleccionadas.</p>	Páez Echeverría, Viviana Priscila	04/11/2015 - 09:14 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2. 8.999 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de septiembre (Hito relacionado 57).</p> <p>3. 8 postulantes fueron aprobados en comité de octubre (Hito relacionado 58)</p> <p>4. Se vincularon 7 Prometeos en el mes de octubre</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de septiembre</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2015</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 165 aplicaciones, de las cuales 38 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 12.237 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de agosto (Hito relacionado 55).</p> <p>3. Ningún Prometeo fue aprobado en comité de septiembre (Hito relacionado 56)</p> <p>4. Se vincularon 17 Prometeos en el mes de septiembre</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de septiembre</p>	Páez Echeverría, Viviana Priscila	05/10/2015 - 12:34 PM
<p>AGOSTO 2015</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 182 aplicaciones, de las cuales 37 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 15.712 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de julio (Hito relacionado 53).</p> <p>3. 1 Prometeo fue aprobado en comité de agosto (Hito relacionado 54)</p> <p>4. Se vincularon 10 Prometeos en el mes de agosto</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de agosto</p>	Páez Echeverría, Viviana Priscila	01/09/2015 - 12:47 PM
<p>JULIO 2015</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 262 aplicaciones, de las cuales 46 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 18485 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de junio (Hito relacionado 51).</p> <p>3. 14 Prometeos fueron aprobados en comité de julio (Hito relacionado 52)</p> <p>4. Se vincularon 19 Prometeos en el mes de julio</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de julio</p>	Páez Echeverría, Viviana Priscila	04/08/2015 - 08:53 AM
<p>JUNIO 2015</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 277 aplicaciones, de las cuales 61 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 15187 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de mayo (Hito relacionado 49).</p> <p>3. 24 Prometeos fueron aprobados en comité de junio (Hito relacionado 50)</p> <p>4. Se vincularon 25 Prometeos en el mes de junio</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de junio</p>	Páez Echeverría, Viviana Priscila	01/07/2015 - 04:12 PM
<p>MAYO 2015</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 204 aplicaciones, de las cuales 60 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 9577 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de abril (Hito relacionado 47).</p> <p>3. 16 Prometeos fueron aprobados en comité de abril (Hito relacionado 48)</p> <p>4. Se vincularon 25 Prometeos en el mes de mayo</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de mayo</p>	Páez Echeverría, Viviana Priscila	02/06/2015 - 09:32 AM
<p>ABRIL 2015</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 205 aplicaciones, de las cuales 81 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 9088 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de marzo (Hito relacionado 45).</p> <p>3. 10 Prometeos fueron aprobados en comité de abril (Hito relacionado 46)</p> <p>4. Se vincularon 14 Prometeos en el mes de abril</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de abril</p>	Páez Echeverría, Viviana Priscila	02/05/2015 - 10:04 AM
<p>MARZO 2015</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 233 aplicaciones, de las cuales 84 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 8556 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de febrero (Hito relacionado 43).</p> <p>3. 30 Prometeos fueron aprobados en comité de marzo (Hito relacionado 44)</p> <p>4. Se vincularon 28 Prometeos en el mes de marzo</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de marzo</p>	Páez Echeverría, Viviana Priscila	02/04/2015 - 12:49 PM
<p>FEBRERO 2015</p>	Castillo Campos, Linda Lesly	04/03/2015 - 07:24 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ol style="list-style-type: none"> Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 242 aplicaciones, de las cuales 96 fueron pre-seleccionadas. 6484 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de enero (Hito relacionado 41). N° de prometeos aprobados en comité de febrero (Hito relacionado 42). Se vincularon 52 Prometeos en el mes de febrero No se realizaron transferencias en el mes de febrero 		
<p>FEBRERO 2015</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 242 aplicaciones, de las cuales 96 fueron pre-seleccionadas. 6484 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de enero (Hito relacionado 41). Se vincularon 52 Prometeos en el mes de febrero No se realizaron transferencias en el mes de febrero 	Castillo Campos, Linda Lesly	04/03/2015 - 05:25 PM
<p>ENERO 2015</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 248 aplicaciones, de las cuales 95 fueron pre-seleccionadas. 14000 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de diciembre (Hito relacionado 38). Se coloca el análisis de número de Prometeos vinculados y finalizados por mes (Hito relacionado 39) Se coloca el análisis de restricciones a aplicarse en los beneficios de Prometeos en el 2015 Se vincularon 2 Prometeos en el mes de enero No se realizaron transferencias en el mes de enero. 	Castillo Campos, Linda Lesly	06/02/2015 - 02:10 PM
<p>DICIEMBRE 2014</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 216 aplicaciones, de las cuales 93 fueron pre-seleccionadas. 8672 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de noviembre (Hito relacionado 36). Se aprobaron 2 Prometeos en el Comité ejecutado el 4 de diciembre de 2014 Y 16 Prometeos en el Comité ejecutado el 31 de diciembre de 2014 (Hito relacionado 37). Se cierran los riesgos registrados. No se realizaron transferencias en el mes de diciembre. 	Castillo Campos, Linda Lesly	06/01/2015 - 12:18 PM
<p>NOVIEMBRE 2014</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 298 aplicaciones, de las cuales 123 fueron pre-seleccionadas. 14928 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de octubre (Hito relacionado 33). Se realizaron 6706 Eventos para la transferencia de conocimientos de los expertos "Prometeos" en las instituciones de acogida, realizados. (Hito relacionado 34). Se aprobaron 12 Prometeos en el Comité ejecutado el 28 de noviembre de 2014 (Hito relacionado 35). En el mes de noviembre se vincularon a las instituciones de acogida 23 Prometeos. El Proyecto Prometeo es parte de Gobierno electrónico debido a que desde el 2013 posee una plataforma web de postulación para captar los perfiles de postulantes al Proyecto a nivel nacional. No se realizaron transferencias en el mes de noviembre 	Castillo Campos, Linda Lesly	02/12/2014 - 05:17 PM
<p>OCTUBRE 2014</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 180 aplicaciones, de las cuales 69 fueron pre-seleccionadas. 7423 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de SEPTIEMBRE (Hito relacionado 30). Se realizaron 15 eventos para difundir el Proyecto a Nivel internacional (Hito relacionado 31). Se aprobaron 35 Prometeos en el Comité ejecutado el 30 de octubre de 2014 (Hito relacionado 32). En el mes de octubre se vincularon a las instituciones de acogida 55 Prometeos. No se realizaron transferencias en el mes de octubre. 	Castillo Campos, Linda Lesly	04/11/2014 - 05:19 PM
<p>OCTUBRE 2014</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 180 aplicaciones, de las cuales 69 fueron pre-seleccionadas. 	Castillo Campos, Linda Lesly	04/11/2014 - 05:07 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2. 7423 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de SEPTIEMBRE (Hito relacionado 32). 3. Se aprobaron 35 Prometeos en el Comité ejecutado el 30 de octubre de 2014 (Hito relacionado 30). 4. En el mes de octubre se vincularon a las instituciones de acogida 55 Prometeos. 5. No se realizaron transferencias en el mes de octubre.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 306 aplicaciones, de las cuales 141 fueron pre-seleccionadas. 2. 8465 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de AGOSTO (Hito relacionado 28). 3. Se aprobaron 28 Prometeos en el Comité ejecutado el 26 de septiembre de 2014 (Hito relacionado 29). 4. En el mes de septiembre se vincularon a las instituciones de acogida 61 Prometeos. 5. No se realizaron transferencias en el mes de septiembre.</p>	Castillo Campos, Linda Lesly	02/10/2014 - 11:29 AM
<p>Resúmenes Ejecutivos (Más recientes) Modificado por Fecha de Última Actualización septiembre 2014:</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 306 aplicaciones, de las cuales 141 fueron pre-seleccionadas. 2. 8465 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de AGOSTO (Hito relacionado 28). 3. Se aprobaron 28 Prometeos en el Comité ejecutado el 26 de septiembre de 2014 (Hito relacionado 29). 4. En el mes de septiembre se vincularon a las instituciones de acogida 61 Prometeos. 5. No se realizaron transferencias en el mes de septiembre.</p>	Castillo Campos, Linda Lesly	02/10/2014 - 10:32 AM
<p>AGOSTO 2014:</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 297 aplicaciones, de las cuales 129 fueron pre-seleccionadas. 2. 10525 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de julio (Hito relacionado 26). 3. Se aprobaron 28 Prometeos en el Comité ejecutado el 26 de agosto de 2014 (Hito relacionado 27). 4. En el mes de agosto se vincularon a las instituciones de acogida 58 Prometeos. 5. No se realizaron transferencias en el mes de agosto.</p>	Castillo Campos, Linda Lesly	04/09/2014 - 04:00 PM
<p>JULIO 2014:</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 546 aplicaciones, de las cuales 264 fueron pre-seleccionadas. 2. 10918 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes, en el mes de junio (Hito relacionado 24). 3. Se aprobaron 37 Prometeos en el Comité ejecutado el 25 de julio de 2014 (Hito relacionado 25). 4. En el mes de julio se vincularon a las instituciones de acogida 48 Prometeos. 5. No se realizaron transferencias en el mes de julio.</p>	Solano, María José	01/08/2014 - 12:32 PM
<p>JUNIO 2014:</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 546 aplicaciones, de las cuales 264 fueron pre-seleccionadas. 2. 10918 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes, en el mes de junio (Hito relacionado 24). 3. Se aprobaron 37 Prometeos en el Comité ejecutado el 25 de julio de 2014 (Hito relacionado 25). 4. En el mes de julio se vincularon a las instituciones de acogida 48 Prometeos. 5. No se realizaron transferencias en el mes de julio.</p>	Solano, María José	01/08/2014 - 11:33 AM
<p>JUNIO 2014:</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 342 aplicaciones, de las cuales 173 fueron pre-seleccionadas. 2. 8422 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes, en el mes de mayo (Hito relacionado 21).</p>	Solano, María José	04/07/2014 - 03:40 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3. Se ha solicitado la Automatización de todos los procesos del Proyecto Prometeo a en el Sistema de Postulación; actualmente se ha desarrollado la propuesta que ya fue presentada a las autoridades de SENESCYT, quedando a la espera de su validación. (Hito relacionado 22).</p> <p>4. Se aprobaron 49 Prometeos en el Comité ejecutado el 25 de junio de 2014 (Hito relacionado 23).</p> <p>5. En el mes de junio se vincularon a las instituciones de acogida 44 Prometeos.</p> <p>6. No se realizaron transferencias en el mes de junio.</p>		
<p>MAYO 2014:</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 268 aplicaciones, de las cuales 131 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 8189 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de abril (Hito relacionado 19).</p> <p>3. Se aprobaron 66 Prometeos en el Comité ejecutado el 23 de mayo de 2014 (Hito relacionado 20).</p> <p>4. En el mes de mayo se vincularon a las instituciones de acogida 33 Prometeos.</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de mayo.</p>	Solano, María José	05/06/2014 - 03:56 PM
<p>ABRIL 2014:</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 360 aplicaciones, de las cuales 158 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 5242 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de febrero (Hito relacionado 17).</p> <p>3. Se aprobaron 77 Prometeos en el Comité ejecutado el 25 y 30 de abril de 2014 (Hito relacionado 18).</p> <p>4. En el mes de abril se vincularon a las instituciones de acogida 30 Prometeos.</p> <p>5. Se implementó la descarga automática de formularios a través de nuestro portal oficial: prometeo.educacionsuperior.gob.ec/biblioteca</p> <p>6. No se realizaron transferencias en el mes de abril.</p>	Solano, María José	05/05/2014 - 04:17 PM
<p>MARZO 2014:</p> <p>1. 6563 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de febrero (Hito relacionado 15).</p> <p>2. Se aprobaron 48 Prometeos en el Comité ejecutado el 21 de marzo de 2014 (Hito relacionado 16).</p> <p>3. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 167 aplicaciones, de las cuales 82 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>4. En el mes de marzo se vincularon a las instituciones de acogida 30 Prometeos.</p> <p>5. Se implementó la descarga automática de formularios a través de nuestro portal oficial: prometeo.educacionsuperior.gob.ec/biblioteca</p> <p>6. Participación del Proyecto Prometeo en la "IV Edición de la Feria Internacional de Opciones de Becas de Posgrado en Ciencia Tecnología e Innovación 2014" organizado por el MICITT de Costa Rica; con el objetivo de difundir el Proyecto y reclutar posibles Prometeos.</p> <p>7. No se realizaron transferencias en el mes de marzo.</p>	Solano, María José	04/04/2014 - 05:21 PM
<p>FEBRERO 2014:</p> <p>-En el mes de enero se realizaron 2 Comités Ejecutivos del Proyecto Becas Prometeo en el que se aprobaron 39 postulantes, se procesaron 126 aplicaciones y se vincularon 46 Prometeos; adicionalmente el Proyecto ha concretado acuerdos de difusión con distintas instituciones nacionales e internacionales.</p>	Solano, María José	05/03/2014 - 09:32 PM
<p>ENERO 2014:</p> <p>-En el mes de enero se realizaron 2 Comités Ejecutivos del Proyecto Becas Prometeo en el que se aprobaron 12 Prometeos y se procesaron 130 postulaciones.</p> <p>-Se procesaron 170 informes correspondientes a diciembre 2013.</p>	Solano, María José	05/02/2014 - 05:36 PM
<p>DICIEMBRE 2013:</p> <p>-En el mes de diciembre se realizaron 3 Comités Ejecutivos del Proyecto Becas Prometeo y se procesaron 125 postulaciones.(HITO 11)</p> <p>-El sistema se encuentra en una etapa de estabilización y se están realizando pruebas y solventando los inconvenientes de los postulantes.</p>	Paredes del Castillo, Grace Paulina	03/01/2014 - 08:31 PM
<p>NOVIEMBRE 2013:</p>	CADENA FUERTES,	05/12/2013 - 12:01 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-En el mes de noviembre se realizaron 3 Comités Ejecutivos del Proyecto Becas Prometeo y se procesaron 211 postulaciones.(HITO 11)</p> <p>-Con respecto la puesta en producción del sistema de Prometeo (R.I y PIC), los documentos ya se encuentran entregados. El sistema se encuentra en una etapa de estabilización, es decir se están realizando pruebas y solventando todos los inconvenientes de los postulantes.</p> <p>-El miércoles 20 de noviembre la Gerente del Proyecto Prometeo Gabriela Jaramillo fue entrevistada en Radio Centro por el comunicador Andrés López y el jueves 21 de noviembre fue entrevistada en Radio Quito por el comunicador Andrés Carrión; a través de dichas entrevistas se pudo difundir el proyecto.</p>	JOSÉ RUPERTO	

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>2- NACIONAL. * General. El incumplimiento del convenio marco de cooperación interinstitucional por parte de las instituciones de acogida CAUSARÍA que los proyectos de investigación realizados por los becarios Prometeos se retrasen e incluso no se cumplan</p>	31/05/2017	Noreya Marisol Montalvo Sarmiento	10 %	60	6	0/1

Riesgos cerrados: 6, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Carchi > Toda la Provincia del Carchi
2	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas
3	Zona 1 - Norte > Imbabura > Toda la Provincia de Imbabura
4	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios
5	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Toda la Provincia de Napo
6	Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Toda la Provincia de Orellana
7	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha
8	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo
9	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Toda la Provincia de Cotopaxi
10	Zona 3 - Centro > Pastaza > Toda la Provincia de Pastaza
11	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Toda la Provincia de Tungurahua
12	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí
13	Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Toda la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas
14	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Toda la Provincia de Bolívar
15	Zona 5 - Litoral > Galápagos > Toda la Provincia de Galapagos
16	Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas
17	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Toda la Provincia de Los Ríos
18	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Toda la Provincia de Santa Elena
19	Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay
20	Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar
21	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago
22	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
23	Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja
24	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipec > Toda la Provincia de Zamora Chinchipec

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN y PLANIFICACIÓN: Dictamen de prioridad recibido / Equipo de planificación definido	4-Inicio de Trabajo	31/07/2013		31/07/2013		Sí	20.0
2	EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución.	5-Entregables Intermedios	30/08/2013		30/08/2013		Sí	0.9
3	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas.	5-Entregables Intermedios	30/08/2013		30/08/2013		Sí	0.9
4	EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución.	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		30/09/2013		Sí	0.9
5	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas.	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		30/09/2013		Sí	0.9
6	EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución.	5-Entregables Intermedios	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.9
7	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas.	5-Entregables Intermedios	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.9
8	EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución.	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		30/11/2013		Sí	0.9
9	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas.	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		30/11/2013		Sí	0.9
10	EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución.	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		31/12/2013		Sí	0.9
11	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas.	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		31/12/2013		Sí	0.9
12	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en enero	5-Entregables Intermedios	31/01/2014		31/01/2014		Sí	0.84
13	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de enero.	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		28/02/2014		Sí	1.68
14	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		28/02/2014		Sí	0.84

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en febrero							
15	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de febrero.	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.84
16	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en marzo	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.84
17	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de marzo.	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	0.84
18	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en abril	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	0.84
19	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de abril.	5-Entregables Intermedios	31/05/2014		31/05/2014		Sí	0.84
20	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en mayo	5-Entregables Intermedios	31/05/2014		31/05/2014		Sí	0.84
21	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de mayo.	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.84
22	EJECUCIÓN: Diseñar, implementar y administrar una herramienta de información, nacional e internacional, desarrollado	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.84
23	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en junio	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.84
24	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de junio.	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	0.84

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
25	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en julio	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	0.84
26	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio.	5-Entregables Intermedios	31/08/2014		29/08/2014		Sí	0.84
27	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en agosto	5-Entregables Intermedios	31/08/2014		29/08/2014		Sí	0.84
28	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de agosto.	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	0.84
29	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en septiembre	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	0.84
30	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de septiembre.	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	0.83
31	EJECUCIÓN: Difusión del Proyecto Prometeo a nivel internacional, realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	0.84
32	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo realizado en octubre	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	0.84
33	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de octubre.	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		30/11/2014		Sí	0.84
34	EJECUCIÓN: Eventos para la transferencia de conocimientos de los expertos "Prometeos" en las instituciones de acogida, realizados.	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		30/11/2014		Sí	0.84
35	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en noviembre	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		30/11/2014		Sí	0.83
36	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	0.84

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de diciembre.							
37	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre.	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	0.84
38	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos a ecuatorianos conjuntamente con las diferentes instituciones de acogida, realizado diciembre	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.2
39	EJECUCIÓN: Análisis de número de Prometeos vinculados y finalizados por mes realizada	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.84
40	EJECUCIÓN: Análisis de restricciones a aplicarse en los beneficios de Prometeos en el 2015	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.2
41	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de enero.	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.3
42	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en febrero	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.3
43	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de febrero.	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.5
44	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en marzo.	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.5
45	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de marzo.	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.5
46	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en abril.	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
47	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de abril.	5-Entregables Intermedios	30/05/2015		30/05/2015		Sí	0.5
48	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en mayo.	5-Entregables Intermedios	30/05/2015		30/05/2015		Sí	0.5
49	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de mayo.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.5
50	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en junio.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.5
51	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de junio.	5-Entregables Intermedios	30/07/2015		30/07/2015		Sí	0.5
52	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en julio.	5-Entregables Intermedios	30/07/2015		30/07/2015		Sí	0.5
53	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio.	5-Entregables Intermedios	30/08/2015		30/08/2015		Sí	0.5
54	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en agosto.	5-Entregables Intermedios	30/08/2015		30/08/2015		Sí	0.5
55	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de agosto.	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	0.5
56	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en septiembre.	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		31/12/2015		Sí	0.5
57	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a	5-Entregables Intermedios	30/10/2015		30/10/2015		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de septiembre.							
58	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en octubre.	5-Entregables Intermedios	30/10/2015		30/10/2015		Sí	0.5
59	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de octubre.	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.5
60	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en noviembre.	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.5
61	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre.	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.5
62	EJECUCIÓN: Eventos de difusión del Proyecto realizados en el 2015	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.5
63	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en diciembre.	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.5
64	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos a ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de diciembre 2015	5-Entregables Intermedios	31/01/2016		31/01/2016		Sí	0.56
65	EJECUCIÓN: Establecer un plan anual de ejecución de visitas in - situ para instituciones de acogida de Prometeos y Ateneos	5-Entregables Intermedios	31/01/2016		31/01/2016		Sí	0.59
66	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de enero.	5-Entregables Intermedios	28/02/2016		28/02/2016		Sí	0.56
67	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en febrero	5-Entregables Intermedios	28/02/2016		31/03/2016		Sí	0.56
68	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a	5-Entregables Intermedios	31/03/2016		31/03/2016		Sí	0.56

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de febrero							
69	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en marzo	5-Entregables Intermedios	31/03/2016		31/03/2016		Sí	0.56
70	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de marzo	5-Entregables Intermedios	30/04/2016		30/04/2016		Sí	0.56
71	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en abril	5-Entregables Intermedios	30/04/2016		30/04/2016		Sí	0.56
72	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de abril.	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		31/05/2016		Sí	0.56
73	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en mayo	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		03/06/2016		Sí	0.56
74	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de mayo	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	0.56
75	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en junio	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	0.56
76	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en julio	5-Entregables Intermedios	31/07/2016		31/07/2016		Sí	0.56
77	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de junio	5-Entregables Intermedios	31/07/2016		31/07/2016		Sí	0.56
78	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	0.56

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	acogida, ejecutadas en el mes de julio							
79	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en agosto	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	0.56
80	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de agosto	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.56
81	EJECUCIÓN: Visitas in situ ejecutivas en el primer semestre del año	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.56
82	EJECUCIÓN: Análisis de impacto del Proyecto Prometeo	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	0.56
83	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de septiembre	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	0.59
84	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de octubre	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	0.56
85	EJECUCIÓN: Registro de Biblioteca creada con publicaciones de Prometeos/ Ateneos	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	0.56
86	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizados conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de noviembre.	5-Entregables Intermedios	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.56
87	EJECUCIÓN: Resumen eventos de difusión del Proyecto Prometeo	5-Entregables Intermedios	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.56
88	EJECUCIÓN: Informe sobre proyectos finalizados	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.43
89	EJECUCIÓN: Informes mensuales revisados	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.43
90	EJECUCIÓN: Informe sobre proyectos finalizados	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.43
91	EJECUCIÓN: Informes mensuales revisados	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.43
92	EJECUCIÓN: Informes mensuales revisados	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.43

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
93	EJECUCIÓN: Informe sobre proyectos finalizados	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.43
94	EJECUCIÓN: Reporte sobre cumplimiento de actividades en instituciones de acogida realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.45
95	EJECUCIÓN: Informe sobre proyectos finalizados	5-Entregables Intermedios	30/04/2017		30/04/2017		Sí	0.43
96	EJECUCIÓN: Informes mensuales revisados	5-Entregables Intermedios	30/04/2017		30/04/2017		Sí	0.43
97	EJECUCIÓN: Informe sobre proyectos finalizados	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	0.43
98	EJECUCIÓN: Informes mensuales revisados	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	0.43
99	EJECUCIÓN: Informe sobre proyectos finalizados	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.43
100	EJECUCIÓN: Informes mensuales revisados	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.43
101	EJECUCIÓN: Reporte sobre cumplimiento de actividades en instituciones de acogida realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.45
102	EJECUCIÓN: Informe sobre proyectos finalizados	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		31/07/2017		Sí	0.43
103	EJECUCIÓN: Informes mensuales revisados	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		31/07/2017		Sí	0.43
104	EJECUCIÓN: Informe sobre proyectos finalizados	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		29/08/2017		Sí	0.43
105	EJECUCIÓN: Informes mensuales revisados	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		29/08/2017		Sí	0.43
106	EJECUCIÓN: Informe sobre proyectos finalizados	5-Entregables Intermedios	30/09/2017		28/09/2017		Sí	0.43
107	EJECUCIÓN: Informes mensuales revisados	5-Entregables Intermedios	30/09/2017		28/09/2017		Sí	0.43
108	EJECUCIÓN: Reporte sobre cumplimiento de actividades en instituciones de acogida realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2017		28/09/2017		Sí	0.45
109	EJECUCIÓN: Informe sobre proyectos finalizados	5-Entregables Intermedios	31/10/2017	31/10/2017			No	0.43
110	EJECUCIÓN: Informes mensuales revisados	5-Entregables Intermedios	31/10/2017	31/10/2017			No	0.43
111	EJECUCIÓN: Informe de cierre del proyecto Prometeo elaborado	5-Entregables Intermedios	30/11/2017	30/11/2017			No	2.55
112	CIERRE: Informe de cierre elaborado	9-Entregables Formales	31/12/2017	31/12/2017			No	10.0


SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	03/07/2017
2	Verificación en territorio	Tapia Núñez, Gladys Lorena	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	30/06/2017
3	Supervisión Positiva - Proyecto en ejecución a nivel nacional	Padrón Saeteros, Gladys Paulina	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/02/2017

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
4	Verificación Becas Prometeo Galápagos	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	31/10/2016
5	Supervisión positiva	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	31/08/2016
6	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	25/04/2016
7	Supervisión positiva se pudo verificar el funcionamiento de acuerdo al hito 62 sobre el Eventos de difusión del Proyecto	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	11/01/2016
8	supervicion exitosa	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	30/11/2015
9	Constatación del Proyecto K002. SENESCYT - BECAS PROMETEO.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	13/11/2015
10	PROYECTO NO SE EJECUTA EN EL CANTON ECHEANDIA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	29/10/2015
11	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	29/09/2015
12	Supervisión positiva al trabajo en el programa y cumplimiento de los HITOS GPR	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	28/09/2015
13	PROYECTO NO SE ESTA EJECUTANDO EN EL CANTON CHIMBO	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	15/09/2015
14	Proyecto se lo ejecuta desde Coordinación Zonal del Austro sur del país	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	24/06/2015
15	GOBERNADOR	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	28/05/2015
16	Supervisión positiva a los objetivos del proyecto y Prometeos existentes actualmente en el Azuay	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	24/04/2015
17	CONSTATACIÓN BECAS	Torres Pallo, Jorge	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	28/02/2015
18	Becas están destinados para la Matriz de la Universidad de Bolívar mas no a ninguna extensión de los cantones	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	15/12/2014
19	Supervisión	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	24/10/2014
20	Vigencia del Proyecto	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	30/09/2014
21	Avance de proyecto	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	23/04/2014
22	Supervisión del Proyecto	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	18/03/2014
23	Supervisión	Taboada Salazar, Wilmer Roberto	{PR} - Provincia - IMBABURA	15/03/2014
24	Visita del 09 de Diciembre del 2013	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	10/12/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de capacitaciones, talleres, seminarios, conferencias y asesoramiento de tesis impartidas		144.14 %	691	996	01/01/2017	Septiembre


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	45,485,099.05 **
Costo Total:	260,257,621.51
Total Devengado:	45,055,871.37
% Costo Total Devengado:	17.31 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 17.31 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	34,521,836.05	1,726,276.46	0.00	36,248,112.51
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	24,474,362.08	12,374,362.08	0.00	36,848,724.16
Ppto. Codificado	43,970,371.01	1,831,802.79	0.00	45,802,173.80
Ppto. Comprometido	42,123,971.75	1,402,575.11	0.00	43,526,546.86
Planeado - Codificado (2017)		-105,526.33		
Programado a Devengar	37,710,216.26	1,831,802.79	0.00	39,542,019.05
Ppto. Devengado	43,653,296.26	1,402,575.11	0.00	45,055,871.37
Estimado a fin de año	* 43,653,296.26	0.00	0.00	43,653,296.26
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-5,943,080.00	1,831,802.79	0.00	-4,111,277.21
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 115.76 %	76.57 %	0.00 %	113.94 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017

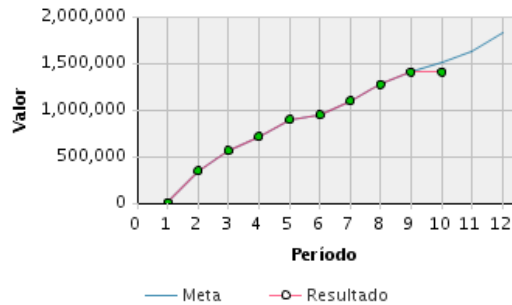

Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	6,898.09	6,898.09	6,898.09	6,898.09	100.00 %	●	0.38 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	338,477.96	338,477.96	345,376.05	345,376.05	100.00 %		18.85 %
Mar	215,601.63	215,601.63	560,977.68	560,977.68	100.00 %		30.62 %
Abr	153,763.49	153,763.49	714,741.17	714,741.17	100.00 %		39.02 %
May	178,088.68	178,088.68	892,829.85	892,829.85	100.00 %		48.74 %
Jun	52,770.10	52,770.10	945,599.95	945,599.95	100.00 %		51.62 %
Jul	152,717.29	152,717.29	1,098,317.24	1,098,317.24	100.00 %		59.96 %
Ago	169,672.34	169,672.34	1,267,989.58	1,267,989.58	100.00 %		69.22 %
Sep	134,585.53	134,585.53	1,402,575.11	1,402,575.11	100.00 %		76.57 %
Oct	98,286.28	0.00	1,500,861.39	1,402,575.11	93.45 %		76.57 %
Nov	128,075.09		1,628,936.48				
Dic	202,866.31		1,831,802.79				
Total	1,831,802.79	1,402,575.11					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
2	Incrementar el número de vinculaciones de expertos de alto nivel residentes en el exterior a instituciones de acogida MEDIANTE la búsqueda de perfiles a nivel mundial, su evaluación, aprobación e incorporación de dichos profesionales.

IMPACTO A SERVICIOS

Servicios	
SENECYT-002	Vinculación de profesionales en investigación «Prometeos» y docencia «Ateneos»

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1.ASOCIACIÓN HITO 1: Dictamen de prioridad.	A.1.pdf	05/12/2013
2	A.2.ASOCIACIÓN HITO 1: Proyecto Becas - Prometeo formato SENPLADES.	A.2.pdf	05/12/2013
3	A.3.ASOCIACIÓN HITO 2: Perfiles disponibles para ser asignados a una institución, agosto 2013	A.3.pdf	05/12/2013
4	A.4.ASOCIACIÓN HITO 3: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, agosto 2013	A.4.pdf	05/12/2013
5	A.5.ASOCIACIÓN HITO 4: Perfiles disponibles para ser asignados a una institución, septiembre 2013	A.5.pdf	05/12/2013
6	A.6.ASOCIACIÓN HITO 5: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, septiembre	A.6.pdf	05/12/2013
7	A.7.ASOCIACIÓN HITO 6: Perfiles disponibles para ser asignados a una institución, octubre 2013	A.7.pdf	05/12/2013
8	A.8.ASOCIACIÓN HITO 7: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, octubre 2013	A.8.pdf	05/12/2013
9	A9.ASOCIACIÓN HITO 8.- Perfiles disponibles para ser asignados a una institución, noviembre 2013	A9.pdf	09/12/2013
10	ASOCIACIÓN HITO 54: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en agosto.	I4.PDF	01/09/2015
11	B1.ASOCIACIÓN HITO 9.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, noviembre 2013	B1.pdf	09/12/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
12	B2.ASOOCIACIÓN HITO 10.- Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución.	B2.pdf	25/03/2014
13	B3.ASOOCIACIÓN HITO 11.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, diciembre 2013	B3.pdf	07/01/2014
14	B4.ASOOCIACIÓN HITO 12.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, enero 2014	B4.pdf	05/02/2014
15	B5.ASOOCIACIÓN HITO 1: Oficio validación MCCTH	B5.pdf	28/02/2014
16	B6.ASOOCIACIÓN HITO 13.-Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos	B6.pdf	25/03/2014
17	B7.ASOOCIACIÓN HITO 14.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en febrero	B7.pdf	25/03/2014
18	B8. Informe de variación presupuesto programado vs codificado marzo - diciembre 2014	B8.pdf	25/03/2014
19	B9. Reporte e-SIGEF febrero 2014	B9.pdf	25/03/2014
20	C1.ASOOCIACIÓN HITO 15.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de febrero.	C1.pdf	31/03/2014
21	C2.ASOOCIACIÓN HITO 16.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en marzo.	C2.pdf	31/03/2014
22	C3. Reporte e-SIGEF marzo 2014	C3.pdf	08/04/2014
23	C4.ASOOCIACIÓN HITO 17.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de marzo.	C4.pdf	05/05/2014
24	C5.ASOOCIACIÓN HITO 18.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en abril	C5.pdf	05/05/2014
25	C6. Reporte e-SIGEF abril 2014	C6.pdf	14/05/2014
26	C7.ASOOCIACIÓN HITO 19.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de abril.	C7.pdf	03/09/2014
27	C8. Reporte e-sigef mes de mayo 2014	C8.pdf	03/09/2014
28	C9.ASOOCIACIÓN HITO 20.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en mayo	C9.pdf	05/06/2014
29	D1. ASOCIACIÓN HITO 21: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de mayo.	D1.pdf	03/09/2014
30	D2.ASOOCIACIÓN HITO 22.- Diseñar, implementar y administrar una herramienta de información, nacional e internacional, desarrollado	D2.pdf	03/09/2014
31	D3.ASOOCIACIÓN HITO 23.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en junio	D3.pdf	03/09/2014
32	D4. Reporte e-sigef mes de junio 2014	D4.pdf	03/09/2014
33	D5.ASOOCIACIÓN HITO 24.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de junio.	D5.pdf	01/09/2014
34	D6.ASOOCIACIÓN HITO 25.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en julio.	D6.pdf	03/09/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
35	D7. Reporte e-sigef mes de Julio 2014	D7.pdf	03/09/2014
36	D8. Reporte e-sigef mes de Agosto 2014	D8.pdf	03/09/2014
37	D9.ASOCIACIÓN HITO 26.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio.	D9.pdf	03/09/2014
38	E.9 Reporte e-sigef mes de Noviembre 2014	E.9.pdf	01/12/2014
39	E1.ASOCIACIÓN HITO 27.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en agosto.	E1.pdf	03/09/2014
40	E2. Reporte e-sigef mes de septiembre 2014	E2.pdf	02/10/2014
41	E3.ASOCIACIÓN HITO 28.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de agosto.	E3.pdf	02/10/2014
42	E4.ASOCIACIÓN HITO 29.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en septiembre.	E4.pdf	02/10/2014
43	E5. Reporte e-sigef mes de octubre 2014	E5..pdf	04/11/2014
44	E6.ASOCIACIÓN HITO 30.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de septiembre.	E6.xlsx	04/11/2014
45	E7.ASOCIACIÓN HITO 31.- Difusión del Proyecto Prometeo a nivel internacional, realizado	E7.pdf	04/11/2014
46	E8. ASOCIACIÓN HITO 32.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en octubre	E8.pdf	04/11/2014
47	E9.ASOCIACIÓN HITO 33.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de octubre.	E9.pdf	02/12/2014
48	F1. ASOCIACIÓN HITO 34 : Eventos para la transferencia de conocimientos de los expertos "Prometeos" en las instituciones de acogida, realizados.	F1.pdf	02/12/2014
49	F2. ASOCIACIÓN HITO 35.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en noviembre	F2.pdf	02/12/2014
50	F3. Reporte e-sigef mes de noviembre 2014	F3.pdf	02/12/2014
51	F4. Relación Proyecto Prometeo con Gobierno electrónico	F4.pdf	06/01/2015
52	F5. Reporte e-sigef mes de Diciembre 2014	F5..pdf	05/01/2015
53	F6.ASOCIACIÓN HITO 36.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre.	F6.pdf	06/01/2015
54	F7. ASOCIACIÓN HITO 37.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, diciembre 2014	F7.pdf	06/01/2015
55	F8. Reporte e-SIGEF enero 2015	F8.pdf	05/02/2015
56	F9. ASOCIACIÓN HITO 38.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de diciembre.	F9.pdf	06/02/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
57	G1. ASOCIACIÓN HITO 39.- EJECUCIÓN: Análisis de número de Prometeos vinculados y finalizados por mes	G1.pdf	06/02/2015
58	G2. ASOCIACIÓN HITO 40: EJECUCIÓN: Análisis de restricciones a aplicarse en los beneficios de Prometeos en el 2015	G2..pdf	06/02/2015
59	G3. Reporte e-SIGEF febrero 2015	G3.pdf	27/02/2015
60	G4. ASOCIACIÓN HITO 41.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de enero.	G4.pdf	02/03/2015
61	G5. ASOCIACIÓN HITO 42.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, febrero 2015	G5.pdf	04/03/2015
62	G6. Reporte e-SIGEF Marzo 2015	G6.pdf	07/04/2015
63	G7. ASOCIACIÓN HITO 43.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de febrero.	G7_.pdf.pdf	31/03/2015
64	G8. ASOCIACIÓN HITO 44.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en marzo.	G8.pdf	02/04/2015
65	G9. ASOCIACIÓN HITO 45: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de marzo	G9..pdf	30/04/2015
66	H1. ASOCIACIÓN HITO 46: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en abril	H1..PDF	30/04/2015
67	H2. Reporte e-SIGEF Abril 2015	H2.pdf	04/05/2015
68	H3 ASOCIACIÓN HITO 47.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de abril	H3.pdf	01/06/2015
69	H4 ASOCIACIÓN HITO 48.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en mayo	H4.pdf	01/06/2015
70	H5. Reporte e-SIGEF Mayo 2015	H5.pdf	04/06/2015
71	H6. ASOCIACIÓN HITO 49: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de mayo	H6.PDF	03/07/2015
72	H7. ASOCIACIÓN HITO 50: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en junio	H7.PDF	03/07/2015
73	H8. Reporte e-SIGEF Junio 2015	H8.pdf	01/07/2015
74	H9. ASOCIACIÓN HITO 51: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de junio	H9.PDF	03/08/2015
75	I1. ASOCIACIÓN HITO 52: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en julio	I1.PDF	03/08/2015
76	I2. Reporte e-SIGEF Julio 2015	I2.pdf	05/08/2015
77	I3. ASOCIACIÓN HITO 53: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio	I3.PDF	01/09/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
78	I3. ASOCIACIÓN HITO 53: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio	I3.PDF	01/09/2015
79	I3. ASOCIACIÓN HITO 53: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio	I3.PDF	01/09/2015
80	I3. ASOCIACIÓN HITO 53: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio	I3.PDF	01/09/2015
81	I3. ASOCIACIÓN HITO 53: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio	I3.PDF	01/09/2015
82	I3. ASOCIACIÓN HITO 53: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio	I3.PDF	01/09/2015
83	I3. ASOCIACIÓN HITO 53: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio.	I3.PDF	01/09/2015
84	I3. ASOCIACIÓN HITO 53: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio.	I3.pdf	01/09/2015
85	I3.ASOCIACIÓN HITO 53: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio	I3.PDF	01/09/2015
86	I4. ASOCIACIÓN HITO 54: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en agosto.	I4.pdf	01/09/2015
87	I5. ASOCIACIÓN HITO 55. apacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de agosto.	I5.pdf	02/10/2015
88	I6. ASOCIACIÓN HITO 57: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de septiembre	I6.PDF	04/11/2015
89	I7. ASOCIACIÓN HITO 58: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en octubre	I7.PDF	04/11/2015
90	I8. ASOCIACIÓN HITO 59: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de octubre.	I8.PDF	30/11/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
91	I9 ASOCIACIÓN HITO 60: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en noviembre	I9.PDF	30/11/2015
92	J1. ASOCIACION HITO 61: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre	J1.pdf	04/01/2016
93	J1. ASOCIACIÓN HITO 61: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre	J1.PDF	04/01/2016
94	J1. ASOCIACIÓN HITO 61: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre	J1.PDF	04/01/2016
95	J1. ASOCIACIÓN HITO 61: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre	J1.PDF	04/01/2016
96	J1. ASOCIACIÓN HITO 61: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre	J1.PDF	04/01/2016
97	J1. ASOCIACIÓN HITO 61: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre	J1.PDF	04/01/2016
98	J1. ASOCIACIÓN HITO 61: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre	J1.PDF	04/01/2016
99	J2. ASOCIACION HITO 62: Eventos de difusión del Proyecto realizados en el 2015	J2.pdf	04/01/2016
100	J2. ASOCIACIÓN HITO 62: Eventos de difusión del Proyecto realizados en el 2015	J2.pdf	06/05/2016
101	J3. ASOCIACION HITO 63: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en diciembre	J3.pdf	04/01/2016
102	J4. ASOCIACIÓN HITO 64: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos a ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de diciembre 2015	J4_.pdf	02/02/2016
103	J5. ASOCIACIÓN HITO 65: Establecer un plan anual de ejecución de visitas in - situ para instituciones de acogida de Prometeos y Ateneos	J5.pdf	02/02/2016
104	J6.ASOCIACIÓN HITO 66:Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de enero	J6.pdf	03/03/2016
105	J7. Reporte e-sigef mes de Febrero 2016	J7.pdf	02/03/2016
106	J8. Reporte e-sigef mes de Marzo 2016	J8.pdf	11/04/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
107	J9. ASOCIACION HITO 67 y 69: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en febrero - marzo 2016	J9.pdf	11/04/2016
108	K1. ASOCIACIÓN HITO 68: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos a ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de febrero 2016	K1.pdf	04/04/2016
109	K2. Reporte e-SIGEF de Abril 2016	K2.pdf	03/05/2016
110	K3. ASOCIACIÓN HITO 71.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos a ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de marzo 2016	K3.pdf	16/05/2016
111	K4. ASOCIACIÓN HITO 70: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en el mes de Abril 2016	K4.pdf	16/05/2016
112	K5. Reporte e-SIGEF Mayo 2016	K5.pdf	03/06/2016
113	K6. ASOCIACION HITO 72.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida	K6.pdf	03/06/2016
114	K7. ASOCIACIÓN HITO 73 y 75.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo mes de Mayo y Junio	K7.pdf	06/06/2016
115	K8. Reporte e-SIGEF de Junio 2016	K8.pdf	04/07/2016
116	K9. ASOCIACION HITO 74.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida realizadas en el mes de mayo	K9.pdf	04/07/2016
117	L1. ASOCIACION HITO 76.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida realizadas en el mes de junio	L1.pdf	09/08/2016
118	L2 ASOCIACIÓN HITO 77.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo mes de Julio	L2.pdf	09/08/2016
119	L3. Reporte e-SIGEF de Julio 2016	L3.pdf	09/08/2016
120	L4 ASOCIACION HITO 78.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida realizadas en el mes de Julio	L4.pdf	02/09/2016
121	L5 ASOCIACIÓN HITO 79.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo mes de Agosto	L5.pdf	02/09/2016
122	L6. Reporte e-SIGEF Agosto 2016	L6.pdf	06/09/2016
123	L7 ASOCIACION HITO 80.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida realizadas en el mes de Agosto	L7.pdf	07/10/2016
124	L8 ASOCIACIÓN HITO 81.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo mes de Septiembre	L8.pdf	07/10/2016
125	L9. Reporte e-SIGEF Septiembre 2016	L9.pdf	07/10/2016
126	M1 ASOCIACION HITO 82.- analisis de impacto del proyecto Prometeo para Viejos Sabios	M1_análisis_de_impacto_del_proyecto_Prometeo.pdf	11/11/2016
127	M2 ASOCIACION HITO 83.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las	M2.pdf	11/11/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	diferentes Instituciones de acogida realizadas en el mes de Octubre		
128	M3. Reporte e-SIGEF Octubre 2016	M3.pdf	11/11/2016
129	M4 ASOCIACION HITO 84.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida realizadas en el mes de Noviembre - Docoembre	M8.pdf	06/01/2017
130	M4 ASOCIACION HITO 84.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida realizadas en el mes de Octubre-Noviembre	M4.pdf	08/12/2016
131	M5. ASOCIACIÓN HITO 85: Registro de Biblioteca creada con publicaciones de Prometeos/Ateneos	M5.pdf	08/12/2016
132	M6. Reporte e-SIGEF Noviembre 2016	M6.pdf	12/12/2016
133	M7. Reporte e-SIGEF Diciembre 2016	M7.pdf	04/01/2017
134	M8 ASOCIACION HITO 86.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida realizadas en el mes de Noviembre - Diciembre	M8.pdf	21/03/2017
135	M9 ASOCIACIÓN HITO 87 Resumen eventos de difusión del Proyecto Prometeo 2016	M9.pdf	06/01/2017
136	N1 ASOCIACIÓN HITO 88 Informe sobre proyectos finalizados	N1.pdf	07/02/2017
137	N2 ASOCIACIÓN HITO 89 Informes mensuales revisados	N2.pdf	07/02/2017
138	N3 ASOCIADO HITO 90 Informe sobre proyectos finalizados febrero	N4.pdf	07/03/2017
139	N4 ASOCIADO HITO 91 Informes mensuales revisados febrero	N4.pdf	07/03/2017
140	N5 Reporte eSIGEF Enero 2017	N5.pdf	09/03/2017
141	N6 Reporte eSIGEF Febrero 2017	N6.pdf	09/03/2017
142	N7 ASOCIADO HITO 93 Informe sobre proyectos finalizados marzo	N7.pdf	03/04/2017
143	N8 ASOCIADO HITO 92 Informes mensuales revisados marzo	N8.pdf	03/04/2017
144	N9 ASOCIADO HITO 94 reporte de cumplimiento de actividades en instituciones de acogida enero - marzo	N9.pdf	05/04/2017
145	O1 Reporte eSIGEF Marzo 2017	O1.pdf	11/04/2017
146	O2 Reporte eSIGEF Abril 2017	O2.pdf	02/05/2017
147	O3 ASOCIADO HITO 95 Informe sobre proyectos finalizados mes de Abril 2017	O3.pdf	08/05/2017
148	O4 ASOCIADO HITO 96 Informes mensuales revisados mes de Abril 2017	O4.pdf	08/05/2017
149	O5 ASOCIADO HITO 97 Informe sobre proyectos finalizados mes de Mayo 2017	O5.pdf	01/06/2017
150	O6 ASOCIADO HITO 98 Informes mensuales revisados mes de Mayo 2017	O6.pdf	01/06/2017
151	O7 Reporte eSIGEF Mayo 2017	O7.pdf	05/06/2017
152	O8 Reporte e-SIGEF Junio 2017	O8.pdf	05/07/2017
153	O9 ASOCIADO HITO 99 Informe sobre proyectos finalizados mes de Junio 2017	O9.pdf	07/07/2017
154	P1 ASOCIADO HITO 100 Informes mensuales revisados mes de Junio 2017	P1.pdf	07/07/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
155	P2 ASOCIADO HITO 101 reporte de cumplimiento de actividades en instituciones de acogida abril - junio 2017	P2.pdf	07/07/2017
156	P3 ASOCIADO HITO 102 Informes sobre proyectos finalizados mes de Julio 2017	P3.pdf	03/08/2017
157	P4 ASOCIADO HITO 103 Informes mensuales revisados mes de Julio 2017	P4.pdf	03/08/2017
158	P5 Reporte e-SIGEF Julio 2017	P5.pdf	04/08/2017
159	P6 ASOCIADO HITO 104 Informes sobre proyectos finalizados mes de Agosto 2017	P6.pdf	29/08/2017
160	P7 ASOCIADO HITO 105 Informes mensuales revisados mes de Agosto 2017	P7.pdf	29/08/2017
161	P8. Reporte e-SIGEF Agosto 2017	P8.pdf	11/09/2017
162	P9 Reporte e-SIGEF Septiembre 2017	P9.pdf	03/10/2017
163	Q1 ASOCIADO HITO 106 Informes sobre proyectos finalizados mes de Septiembre 2017	Q1.pdf	04/10/2017
164	Q2 ASOCIADO HITO 107 Informes mensuales revisados mes de Septiembre 2017	Q2.pdf	04/10/2017
165	Q3 ASOCIADO HITO 108 reporte de cumplimiento de actividades en instituciones de acogida julio - septiembre 2017	Q3.pdf	04/10/2017

LIGAS EXTERNAS

Dirección (URL)

1	http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/Prometeo/inicio.do
	http://9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Casa Patrimonial

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Montalvo Sarmiento, Noreya Marisol	Analista Apoyo	Analista de Becas Prometeo	nmontalvo@senescyt.gob.ec	2569898
Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	Analista a Cargo	Coordinador Administrativo Financiero del Proyecto Prometeo	apazmino@senescyt.gob.ec	2569898
Vivas Martínez, Rodrigo Enrique	Gerente del Proyecto Prometeo	Gerente Proyecto Becas Prometeo	rvivas@senescyt.gob.ec	02569898
